

RELATÓRIO TRIMESTRAL

MARÇO 2024



PRR
Plano de Recuperação
e Resiliência



Financiado pela
União Europeia
NextGenerationEU

RECUPERAR
PORTUGAL

Ficha Técnica

Título: Relatório Trimestral março 2024

Edição: 1ª edição, 2024

Propriedade: Estrutura de Missão Recuperar Portugal

RECUPERAR
PORTUGAL

CONTEÚDOS

- 1 O PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA
- 2 PROGRESSO GERAL A 31 DE MARÇO DE 2024
- 3 SÍNTESE DA IMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA
- 4 SÍNTESE DA IMPLEMENTAÇÃO POR DIMENSÃO ESTRUTURANTE
- 5 SÍNTESE DA IMPLEMENTAÇÃO POR COMPONENTE

ANEXOS

ANEXO I. LISTAGEM DE PROJETOS APROVADOS A BENEFICIÁRIOS DIRETOS

ANEXO II. LISTAGEM DE PROJETOS APROVADOS A BENEFICIÁRIOS FINAIS


1

0 Plano de Recuperação e Resiliência

1. O Plano de Recuperação e Resiliência



Visão Global

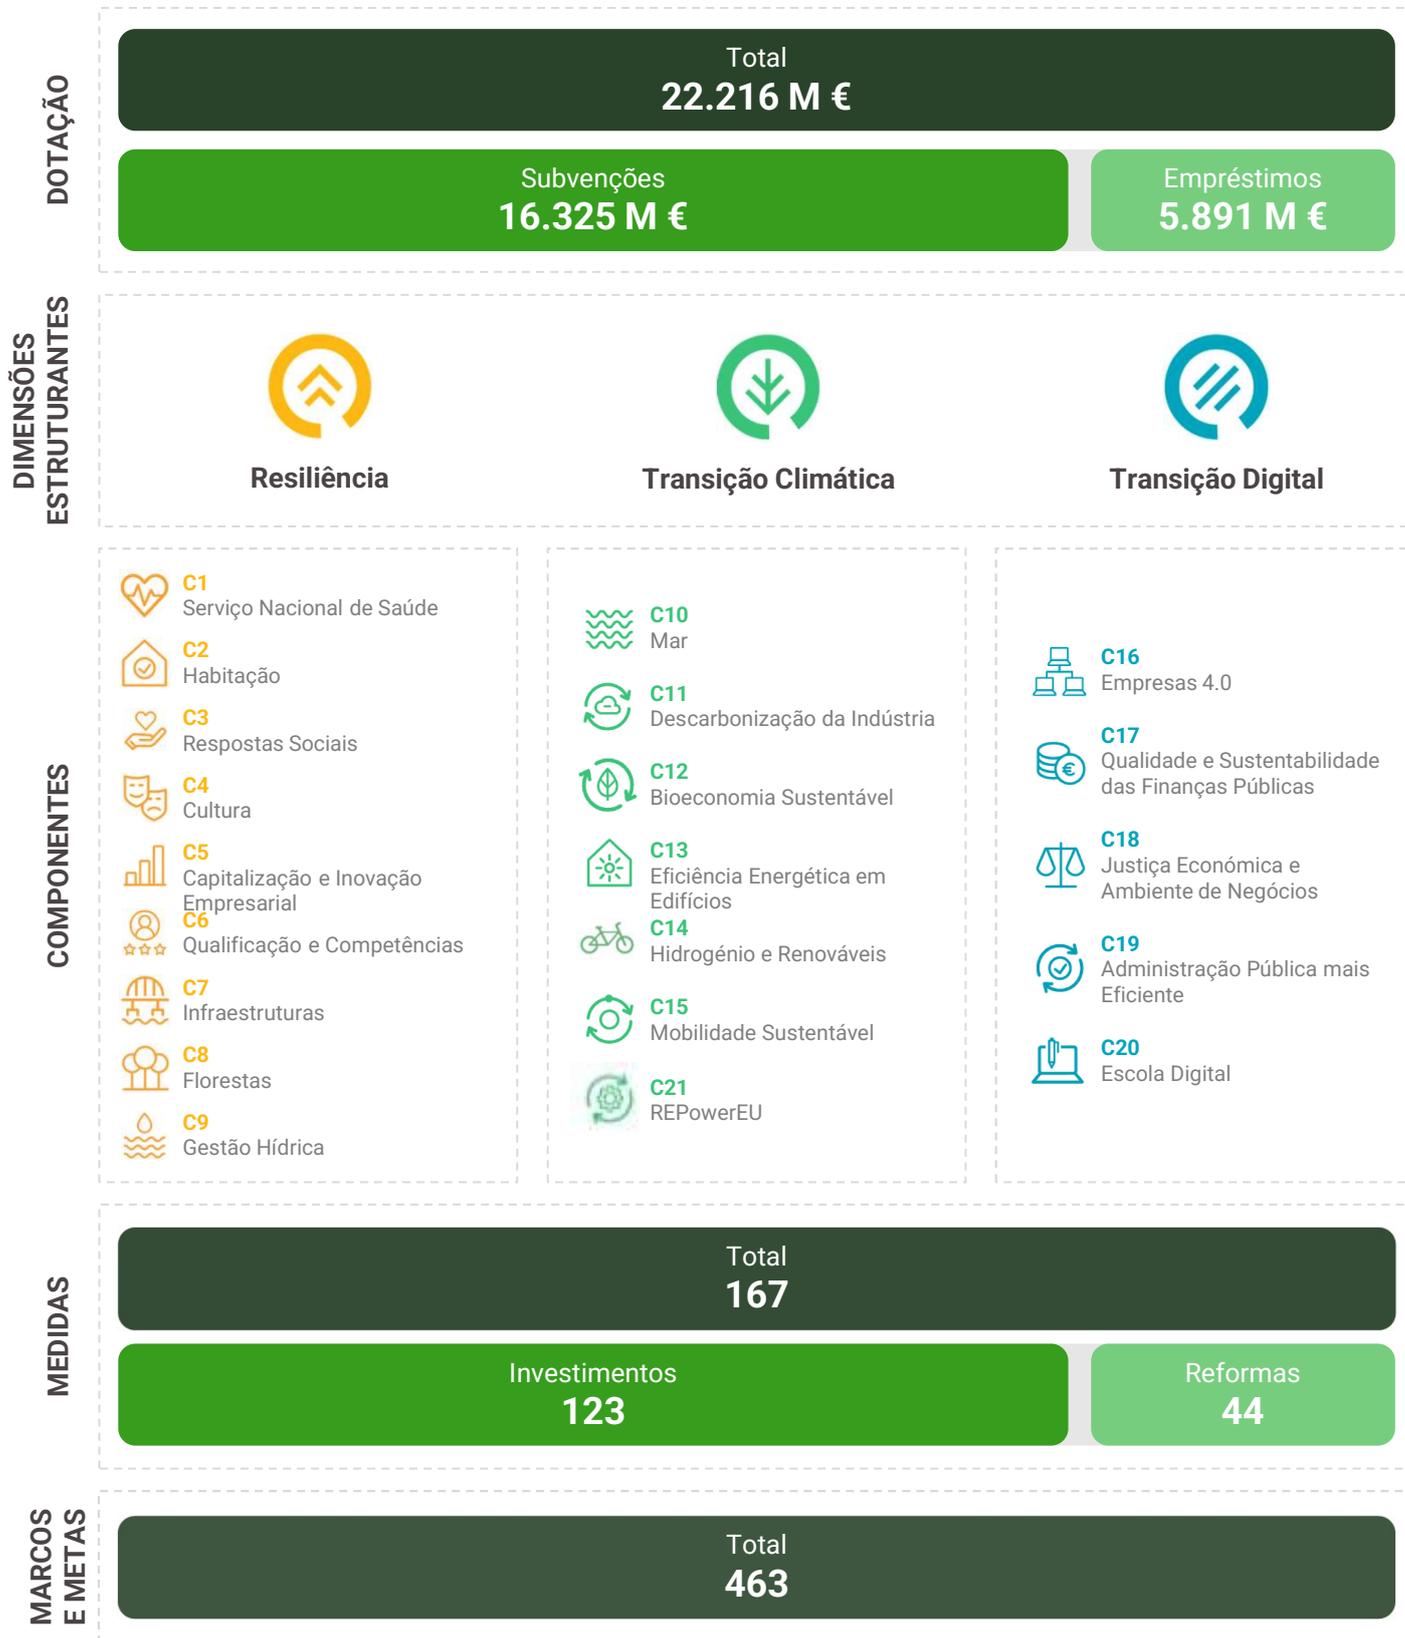

1. O Plano de Recuperação e Resiliência



Reprogramação



INICIAL		ATUALIZAÇÃO	
RESILIÊNCIA			
1.383 M €	C1. Serviço Nacional de Saúde	1.739 M €	
2.733 M €	C2. Habitação	3.229 M €	
833 M €	C3. Respostas Sociais	1.043 M €	
243 M €	C4. Cultura	319 M €	
2.914 M €	C5. Capitalização e Inovação Empresarial	4.915 M €	
1.324 M €	C6. Qualificações e Competências	1.979 M €	
690 M €	C7. Infraestruturas	813 M €	
615 M €	C8. Florestas	615 M €	
390 M €	C9. Gestão Hídrica	461 M €	
11.125 M €		15.113 M €	
TRANSIÇÃO CLIMÁTICA			
252 M €	C10. Mar	393 M €	
715 M €	C11. Descarbonização da Indústria	737 M €	
145 M €	C12. Bioeconomia Sustentável	145 M €	
610 M €	C13. Eficiência Energética em Edifícios	610 M €	
370 M €	C14. Hidrogénio e Renováveis	385 M €	
967 M €	C15. Mobilidade Sustentável	1.262 M €	
n.a.	C21. REPowerEU	855 M €	
3.059 M €		4.388 M €	
TRANSIÇÃO DIGITAL			
650 M €	C16. Empresas 4.0	763 M €	
406 M €	C17. Qualidade e Sustent. Finanças Públicas	406 M €	
267 M €	C18. Justiça Económica e Ambiente de Negócios	267 M €	
578 M €	C19. Administração Pública Mais Eficiente	675 M €	
559 M €	C20. Escola Digital	605 M €	
2.460 M €		2.716 M €	
16.644 M €		22.216 M €	

Estes valores poderão ser sujeitos a pequenos ajustes no âmbito da contratação entre a Estrutura de Missão "Recuperar Portugal" e os Beneficiários Diretos e Intermediários.

2

Progresso geral a 31 de março de 2024

2. Progresso geral a 31 de março de 2024



Dados a 31 de março de 2024

3

Síntese da implementação financeira

3. Síntese da implementação financeira

Em 2023, foi submetida e aprovada a reprogramação do PRR, passando este a ter uma dotação de 22.216 milhões de euros.


Durante o 1º trimestre de 2024, foram lançados 1.090 milhões de euros em Avisos e Anúncios. Durante o trimestre foram também aprovados 1.563 milhões de euros e pagos 478 milhões de euros a Beneficiários Diretos e Finais.

Desta forma, até 31 de março de 2024, tinham sido lançados Avisos de Abertura de Candidaturas no total de 15.119 milhões de euros (68% da dotação do PRR) e Procedimentos de Contratação Pública no total de 2.586 milhões de euros (12% da dotação do PRR). O montante lançado em Avisos e Anúncios ascendia no final do trimestre a 17.704 milhões de euros, correspondendo a 80% da dotação do PRR e representando um aumento de 5 pontos percentuais face ao final do 4º trimestre (esta variação é calculada tendo por base a dotação do PRR).

Já o montante de projetos aprovados de Beneficiários Diretos e Finais totalizava, no final do 1º trimestre de 2024, 17.495 milhões de euros (79% da dotação do PRR), representado um aumento de 7 pontos percentuais face ao 4º trimestre de 2023 (novamente, trata-se da variação calculada com base na dotação).

Os montantes pagos a Beneficiários Diretos e Finais ascendiam a 4.116 milhões de euros, o correspondente a 19% da dotação do PRR, e representando um aumento de 2 pontos percentuais face ao 4º trimestre do ano anterior.

Figura 1: Evolução da Implementação Financeira até ao 1º trimestre de 2024

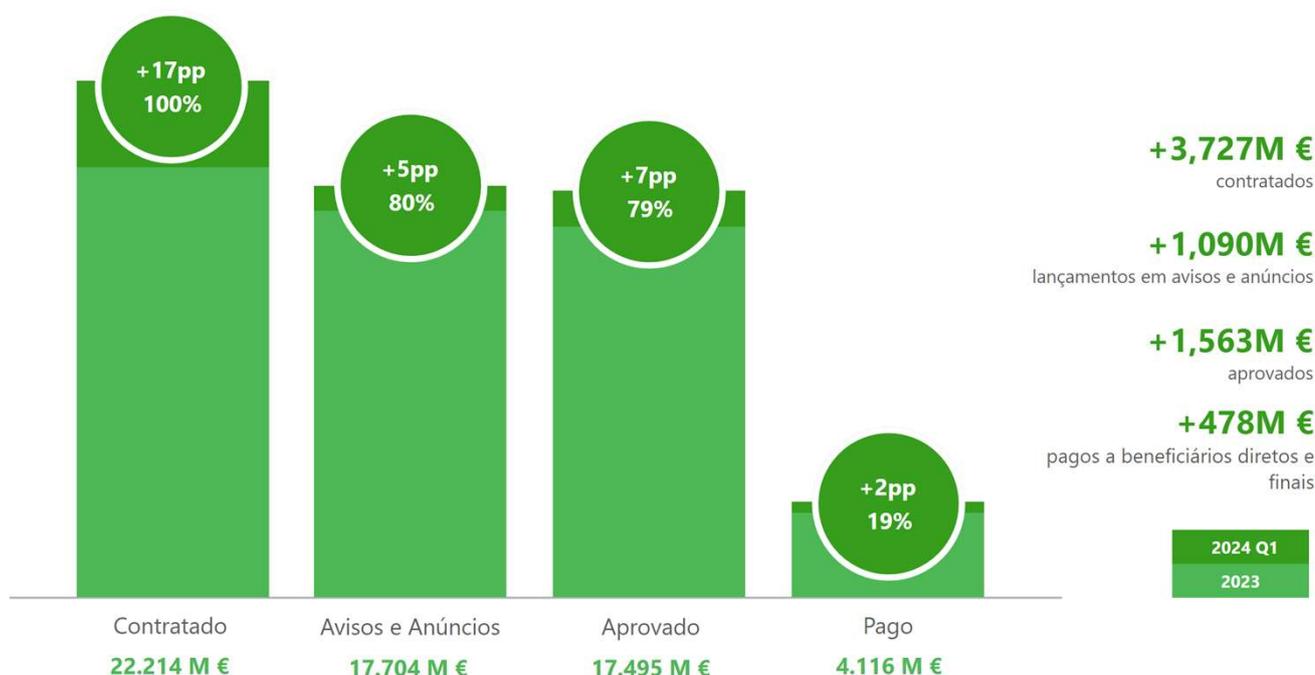

Os valores percentuais bem como as respetivas variações em pontos percentuais foram calculados tendo por base a dotação do PRR de 22.216 M € e estão arredondados à unidade.

3. Síntese da implementação financeira


A 31 de março de 2024, as três dimensões estruturantes do PRR - Resiliência, Transição Climática e Transição Digital - encontravam-se com os níveis de implementação financeira representados na figura 2.

Na dimensão Resiliência tinham sido lançados 11.711 milhões de euros em Avisos e Anúncios (77% da dotação da dimensão estruturante). O montante aprovado ascendia a 11.847 milhões de euros (78% da dotação da dimensão estruturante) e o montante pago a Beneficiários Diretos e Finais ascendia a 2.734 milhões de euros (18% da dotação da dimensão estruturante).

Na dimensão Transição Climática, o montante lançado em Avisos e Anúncios atingiu os 3.825 milhões de euros no final do trimestre (87% da dotação da dimensão estruturante). O montante aprovado a Beneficiários Diretos e Finais ascendia a 3.390 milhões de euros (77% da dotação da dimensão estruturante), e o montante pago aos mesmos atingiu os 677 milhões de euros (15% da dotação da dimensão estruturante).

Na dimensão Transição Digital, foram lançados até ao final do semestre 2.168 milhões de euros (80% da dotação da dimensão estruturante), tendo sido aprovados 2.258 milhões de euros (83% da dotação da dimensão estruturante) e pagos a Beneficiários Diretos e Finais 704 milhões de euros (26% da dotação da dimensão estruturante).


Figura 2: Implementação Financeira por Dimensão Estruturante a 31.03.2024 (milhões de euros)

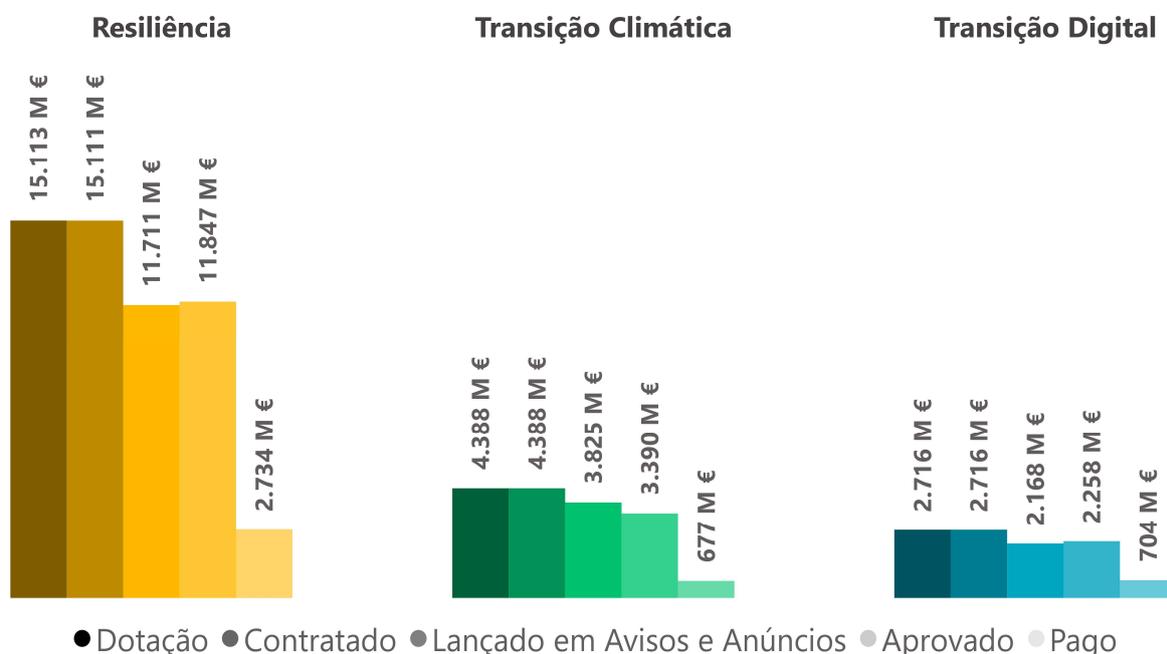

3. Síntese da implementação financeira

A figura 3 mostra os montantes aprovados e pagos a Beneficiários Diretos e Finais em cada uma das 21 componentes do PRR, a 31 de março de 2024.

Figura 3: Implementação Financeira por Componente a 31.03.2024 (milhões de euros)

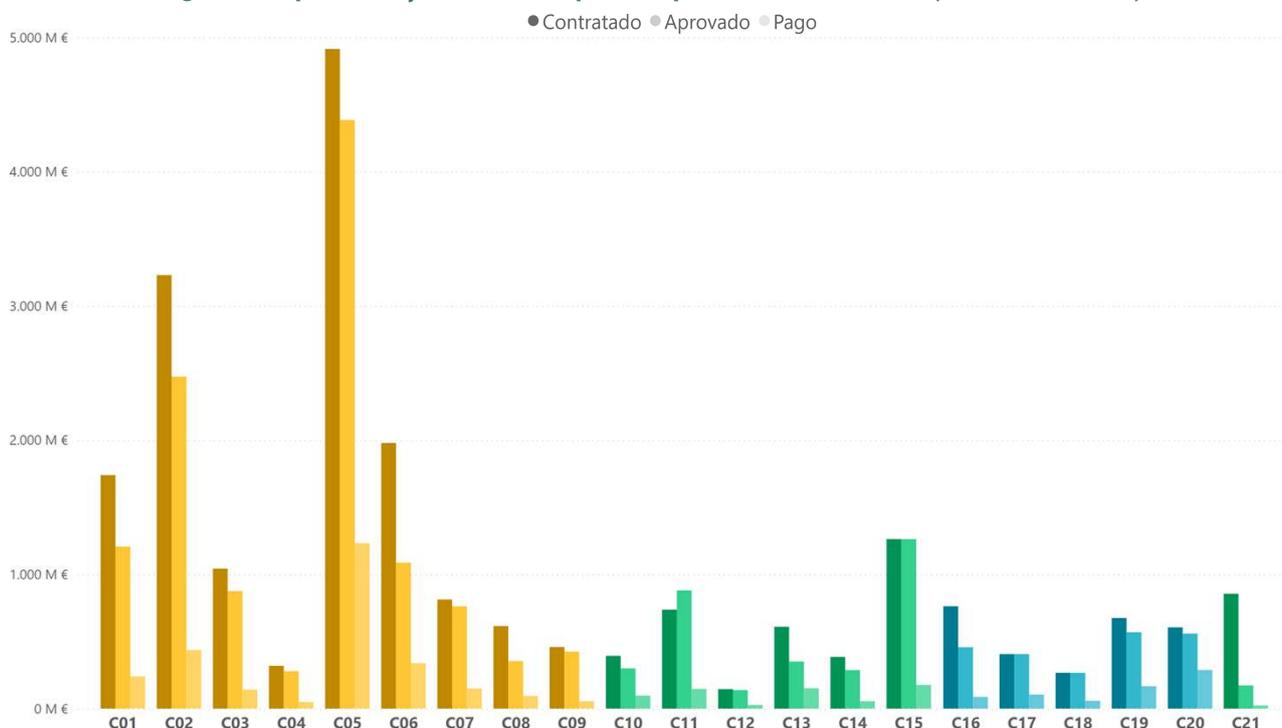

A tabela 1 apresenta a divisão previsional por tipo de Beneficiário Direto e Final da dotação lançada em avisos e procedimentos de contratação pública. Apresenta também os respetivos montantes aprovados e pagos por tipo de Beneficiário Direto ou Final.

Tabela 1: Implementação Financeira por tipologia de Beneficiário a 31.03.2024

TIPO DE BENEFICIÁRIO	Concursos Públicos		Avisos		Beneficiários Diretos e Finais	
	LANÇADOS (M€) ¹	DOTAÇÃO (M€) ²	CANDIDATURAS SUBMETIDAS	CANDIDATURAS APROVADAS	APROVADO (M€)	PAGO (M€)
Famílias		1.709 M €	243.112	118.184	204 M €	162 M €
Instituições da Economia Solidária e Social		1.135 M €	7.449	4.308	426 M €	91 M €
Empresas		5.180 M €	60.789	39.557	5.768 M €	1.514 M €
Instituições do Sistema Científico e Tecnológico		467 M €	750	485	340 M €	81 M €
Instituições de Ensino Superior		608 M €	651	338	663 M €	173 M €
Escolas	258 M €	850 M €	1.736	912	428 M €	275 M €
Autarquias e Áreas Metropolitanas	1 M €	1.597 M €	4.336	2.574	2.118 M €	362 M €
Entidades Públicas	1.033 M €	2.357 M €	1.790	1.351	4.805 M €	1.000 M €
Empresas Públicas	1.294 M €	1.184 M €	260	194	2.744 M €	457 M €
Total	2.586 M €	15.087 M €	320.873	167.903	17.495 M €	4.116 M €

¹ Procedimentos de Contratação Pública lançados por Beneficiários Diretos.

² Dotação sujeita a alterações no âmbito da contratação em curso entre a Recuperar Portugal e os Beneficiários Intermediários e Diretos.

3. Síntese da implementação financeira

A distribuição dos valores aprovados e pagos a Beneficiários Diretos e a Beneficiários Finais, em cada uma das regiões NUTS III de Portugal, e nos projetos de cobertura nacional, é apresentada na tabela 2, bem como a sua distribuição relativa por habitante. A 31 de março de 2024, tinha sido aprovado um montante equivalente a 1.692 euros por habitante no território nacional, e pago um montante equivalente a 398 euros por habitante.

Tabela 2: Implementação Financeira por região NUTS III e per capita, a 31.03.2024

NUT III	Beneficiários Diretos e Finais		Por habitante	
	APROVADO (M€)	PAGO (€)	APROVADO (€/HABITANTE)	PAGO (€/HABITANTE)
Projetos Nacionais	4.270 M €	1.090 M €	413 €	105 €
Alto Minho	182 M €	47 M €	786 €	202 €
Cávado	472 M €	114 M €	1.134 €	275 €
Ave	411 M €	117 M €	981 €	280 €
Área Metropolitana do Porto	2.577 M €	588 M €	1.484 €	338 €
Alto Tâmega	57 M €	13 M €	680 €	158 €
Tâmega e Sousa	348 M €	91 M €	852 €	223 €
Douro	200 M €	46 M €	1.086 €	250 €
Terras de Trás-os-Montes	138 M €	33 M €	1.289 €	305 €
Região de Aveiro	721 M €	162 M €	1.963 €	441 €
Região de Coimbra	546 M €	135 M €	1.251 €	309 €
Região de Leiria	340 M €	92 M €	1.186 €	320 €
Viseu Dão Lafões	256 M €	70 M €	1.012 €	276 €
Beira Baixa	97 M €	18 M €	1.207 €	228 €
Beiras e Serra da Estrela	191 M €	45 M €	909 €	213 €
Oeste	212 M €	47 M €	582 €	130 €
Médio Tejo	186 M €	49 M €	814 €	214 €
Lezíria do Tejo	161 M €	37 M €	683 €	156 €
Área Metropolitana de Lisboa	3.699 M €	823 M €	1.289 €	287 €
Alentejo Litoral	169 M €	40 M €	1.754 €	411 €
Baixo Alentejo	248 M €	36 M €	2.163 €	313 €
Alto Alentejo	257 M €	38 M €	2.447 €	360 €
Alentejo Central	148 M €	37 M €	973 €	245 €
Algarve	390 M €	79 M €	835 €	169 €
Região Autónoma dos Açores	599 M €	153 M €	2.536 €	649 €
Região Autónoma da Madeira	617 M €	115 M €	2.462 €	460 €
Total	17.495 M €	4.116 M €	1.692 €	398 €

3. Síntese da implementação financeira

FLUXOS DE TESOURARIA

A 3 de agosto de 2021, Portugal recebeu o adiantamento de 13% dos fundos do PRR, nos termos do disposto no artigo 13º do Regulamento (EU) 2021/241 do Parlamento Europeu e do Conselho e no seguimento da assinatura dos acordos de financiamento e de empréstimos. O pré-financiamento correspondeu a um valor total de 2.159 milhões de euros, sendo 1.808 milhões de euros relativos a subvenções e 351 milhões de euros relativos a empréstimos.

O desembolso dos fundos do PRR contratados com a Comissão Europeia depende do processo de avaliação do cumprimento de marcos e metas, estando prevista a submissão de 10 pedidos de pagamento até 2026, dos quais 4 foram já submetidos.


O 1º Pedido de Pagamento foi submetido a 25 de janeiro de 2022, no total de 1.336 milhões de euros, dos quais 636 milhões de euros respeitantes a subvenções e 700 milhões de euros de empréstimos, que, deduzidos do correspondente valor do pré-financiamento de 13%, se traduziu no pagamento líquido, a 9 de maio de 2022, de 1.162 milhões de euros (553 milhões de euros de subvenções, e 609 milhões de euros de empréstimos).

O 2.º Pedido de Pagamento foi formalizado a 30 de setembro de 2022, no total de 2.092 milhões de euros, tendo recebido avaliação positiva da Comissão Europeia a 16 de dezembro. Após a dedução respetiva do adiantamento, este Pedido de Pagamento traduziu-se no recebimento líquido de 1.820 milhões de euros, dos quais 1.711 milhões de euros relativos a subvenções e 109 milhões de euros relativos a empréstimos. Com o desembolso do 2.º Pedido de Pagamento, que viria a ser realizado a 8 de fevereiro de 2023, Portugal já recebeu 5.151 milhões de euros, correspondente a cerca de 31% da dotação orçamental global do PRR contratada com a Comissão Europeia.

Os 3.º e 4.º Pedidos de Pagamento foram formalizados a 4 de outubro de 2023, no total de 2.752 milhões de euros, dos quais 2.137 milhões de euros respeitantes a subvenções e 615 milhões de euros de empréstimos, que, deduzidos do correspondente valor do pré-financiamento de 13%, se traduziu no recebimento líquido, a 28 de dezembro de 2023, de 2.460 milhões de euros, dos quais 1.875 milhões de euros respeitantes a subvenções e 585 milhões de euros de empréstimos).

3. Síntese da implementação financeira

Figura 4: Cronograma de Pedidos de Pagamento e Desembolsos

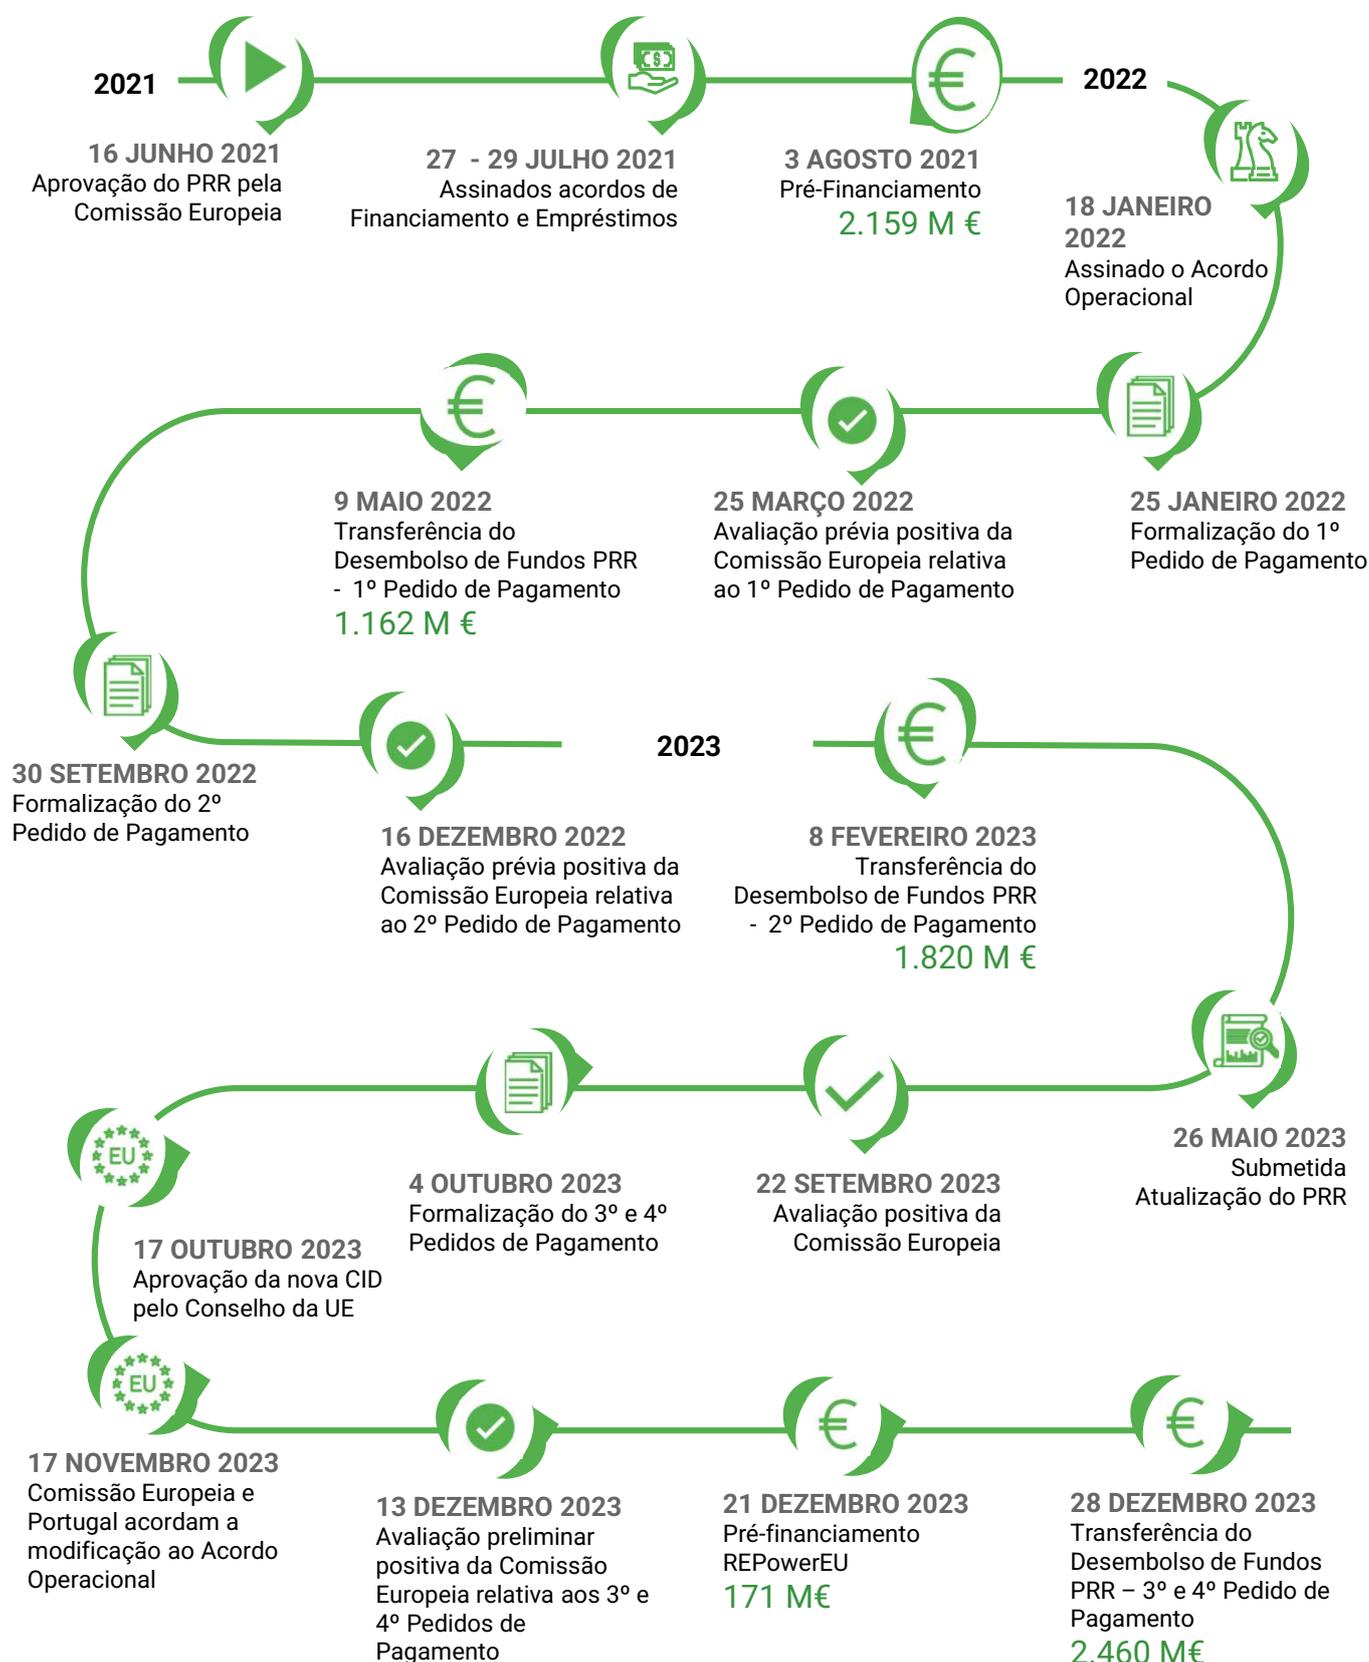

3. Síntese da implementação financeira

A figura 5 representa a distribuição dos valores recebidos da Comissão Europeia pelos Beneficiários Diretos, Intermediários e Finais ao longo da execução do PRR até ao final do 1º trimestre de 2024. De acordo com o Decreto-Lei n.º 29-B/2021, de 4 de maio, a Recuperar Portugal emite ordens de pagamento e a AD&C processa os pagamentos a Beneficiários Diretos e Intermediários. Os Beneficiários Intermediários, por sua vez, fazem pagamentos aos Beneficiários Finais, após seleção e contratação com os mesmos.

A 31 de março de 2024, tinham sido pagos 1.138 milhões de euros a Beneficiários Diretos. O montante total transferido a Beneficiários Intermediários ascendia a 3.597 milhões de euros, dos quais 2.977 milhões de euros foram já pagos a Beneficiários Finais e 723 milhões de euros encontram-se em trânsito.

Figura 5: Fluxos de Tesouraria do PRR a 31.03.2024



4


Síntese da Implementação por Dimensão Estruturante

4. Síntese da Implementação por Dimensão Estruturante




A dimensão da Resiliência visa reforçar a resiliência social, económica e territorial do país através de 9 componentes estratégicas, incluindo intervenções na saúde, habitação, respostas sociais, cultura, investimento empresarial, competências e qualificações, infraestruturas, florestas e gestão da água. Esta dimensão representa a maior parte do investimento total do PRR para a promoção de uma recuperação transformadora, duradoura, justa, sustentável e inclusiva.

Síntese da Implementação da Dimensão I – Resiliência a 31.03.2024

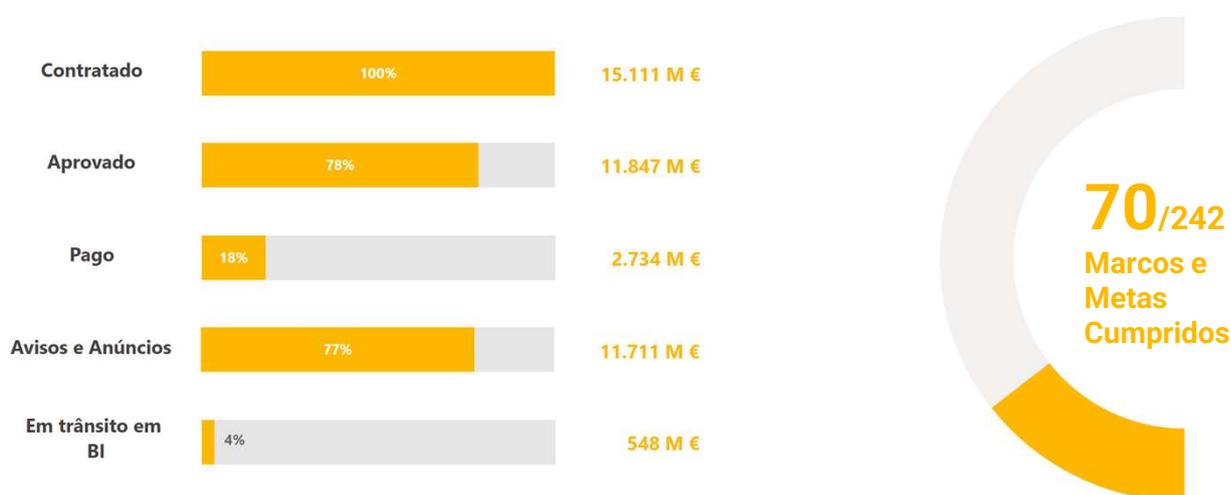

Evolução da Implementação Financeira até ao 1º trimestre de 2024

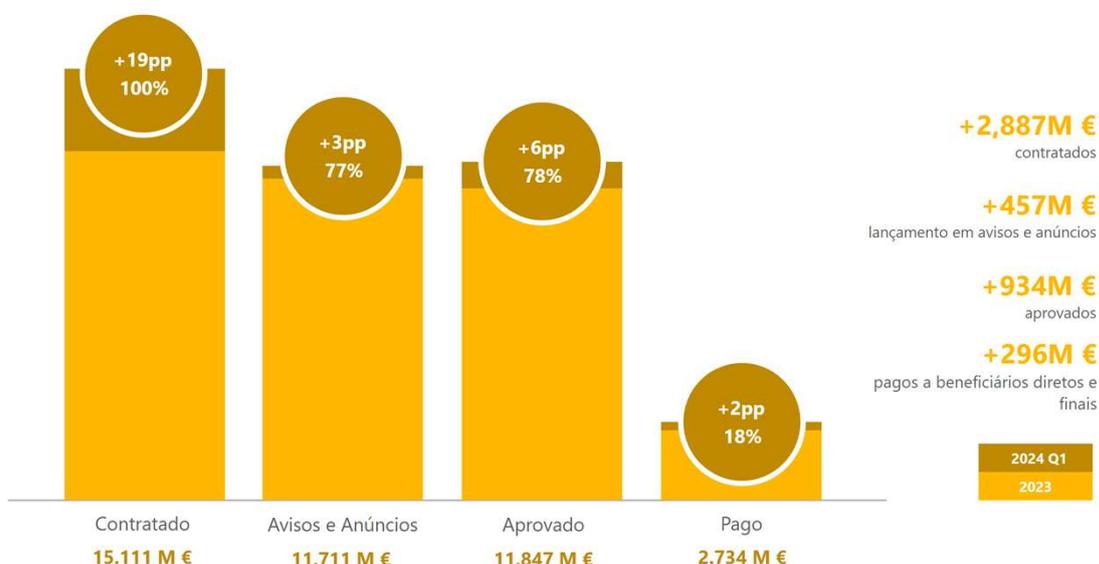

Os valores percentuais bem como as respetivas variações em pontos percentuais foram calculados tendo por base a dotação do PRR de 22.216 M €.

4. Síntese da Implementação por Dimensão Estruturante



II - Transição Climática




4.388 M €

Dotação orçamental

A Transição Climática compreende 7 componentes estratégicos, incluindo intervenções em áreas como o mar, mobilidade sustentável, descarbonização da indústria, bioeconomia, eficiência energética em edifícios, e energias renováveis. Constitui um compromisso para o cumprimento das metas climáticas que permitirá a Portugal atingir a neutralidade carbónica até 2050, apresentando ao país oportunidades significativas para os fatores competitivos do futuro.

Síntese da Implementação da Dimensão II – Transição Climática a 31.03.2024

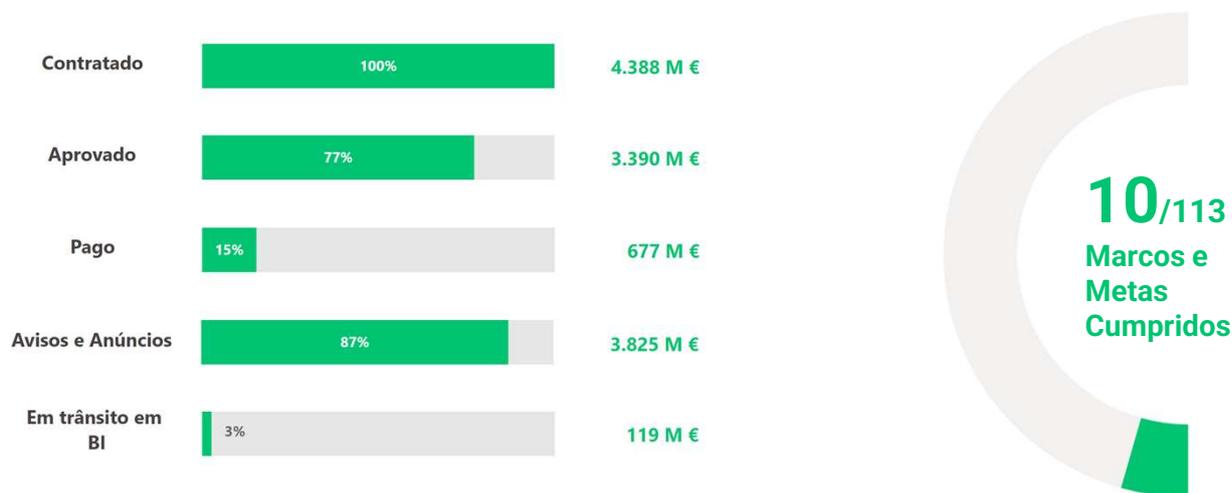

Evolução da Implementação Financeira até ao 1º trimestre de 2024



Os valores percentuais bem como as respetivas variações em pontos percentuais foram calculados tendo por base a dotação do PRR de 22.216 M €.

4. Síntese da Implementação por Dimensão Estruturante



III - Transição Digital




2.716 M €


Dotação orçamental

A Transição Digital descreve 5 componentes para acelerar a transição de Portugal para uma sociedade mais digital, incluindo a capacitação e inclusão digital das pessoas através da educação, formação em competências digitais e promoção da literacia digital, transformação digital do setor empresarial e digitalização do Estado.

Síntese da Implementação da Dimensão III – Transição Digital a 31.03.2024

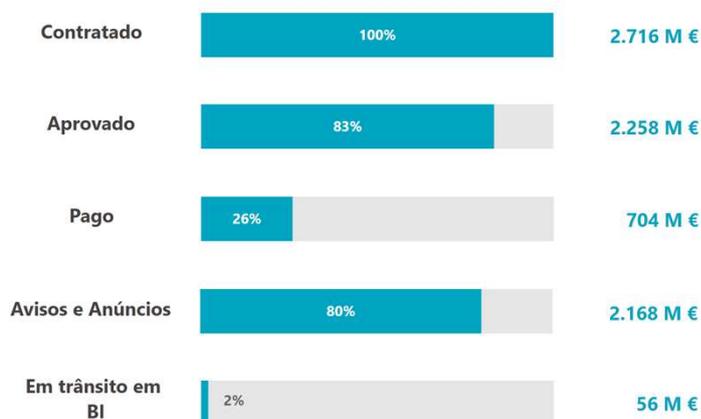

Evolução da Implementação Financeira até ao 1º trimestre de 2024

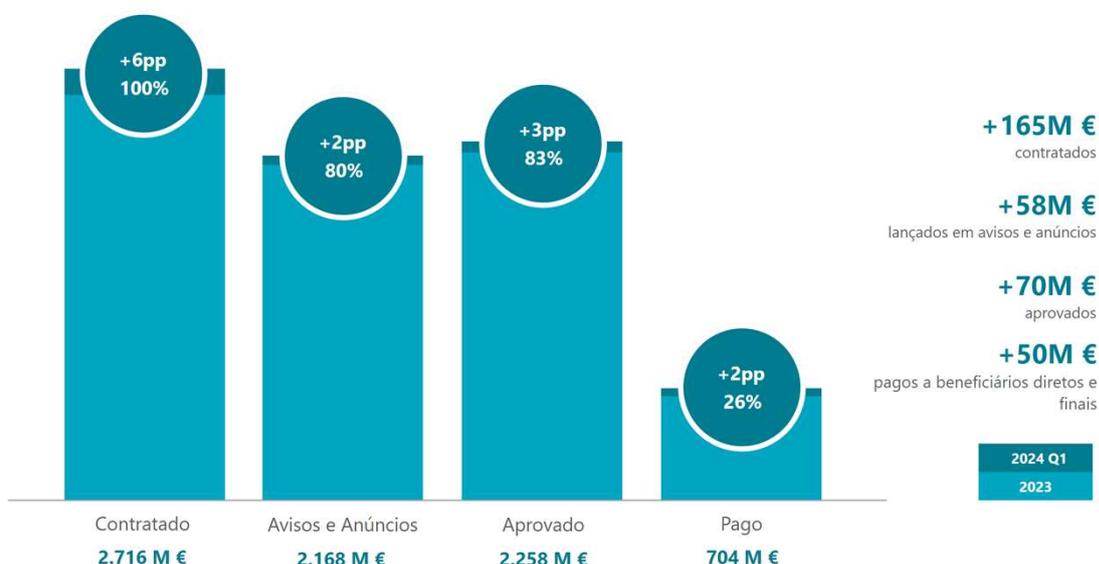

Os valores percentuais bem como as respetivas variações em pontos percentuais foram calculados tendo por base a dotação do PRR de 22.216 M €.

5

Síntese da Implementação por Componente

5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C01
Serviço Nacional de Saúde

1.739 M €
Dotação orçamental

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 31.03.2024



Reformas

CÓDIGO	REFORMA	ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO A 31.03.2024
C01-r01	Reforma dos cuidados de saúde primários	Em fase de implementação
C01-r02	Reforma no domínio da saúde mental	Concretizada
C01-r03	Conclusão da reforma do modelo de governação dos hospitais públicos	Em fase de implementação

5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C01 Serviço Nacional de Saúde

1.739 M €
Dotação orçamental

Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 31.03.2023	PAGO A 31.03.2023
C01-i01	Cuidados de Saúde Primários com mais respostas Responsável: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE I.P.	683 M €	43%	8%
C01-i02	Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e Rede Nacional de Cuidados Paliativos Responsável: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE I.P.	235 M €	124%	24%
C01-i03	Conclusão da Reforma da Saúde Mental e implementação da Estratégia para as Demências Responsável: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE I.P.	88 M €	70%	19%
C01-i04	Construção do Hospital de Lisboa Oriental e Equipamento para Hospitais em Lisboa e Vale do Tejo Responsável: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE I.P.	180 M €	66%	15%
C01-i05.01-RAM	Fortalecimento do Serviço Regional de Saúde da Região Autónoma da Madeira - Expansão, Desenvolvimento e Melhoria da Rede de Cuidados Continuados Integrados Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM	60 M €	89%	12%
C01-i05.02-RAM	Fortalecimento do Serviço Regional de Saúde da Região Autónoma da Madeira - Reforço das respostas na área da saúde mental e das demências associadas ao envelhecimento Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM	39 M €	89%	17%
C01-i06	Transição Digital na Saúde Responsável: SPMS - SERVIÇOS PARTILHADOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, E.P.E.	300 M €	100%	17%
C01-i07.01-RAM	Digitalização da Saúde na RAM-IASAUDE Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM	4 M €	100%	19%
C01-i07.02-RAM	Digitalização da Saúde na RAM-SESARAM Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM	11 M €	100%	18%
C01-i07.03-RAM	Digitalização da Saúde na RAM-DRS Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM	1 M €	100%	13%
C01-i08-RAA	Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores Responsável: DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FUNDOS ESTRUTURAIS	30 M €	100%	36%
C01-i09	Sistema Universal de Apoio à Vida Ativa Responsável: INSTITUTO PORTUGUÊS DO DESPORTO E JUVENTUDE, I.P.	10 M €	100%	28%
C01-i10	Programa de Modernização Tecnológica do SNS Responsável: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE I.P.	100 M €		

5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C02
Habitação

3.229 M €
Dotação orçamental

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 31.03.2024



Reformas

CÓDIGO	REFORMA	ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO A 31.03.2024
C02-r04	Plano Nacional de Alojamento Urgente e Temporário	● Concretizada

Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 31.03.2023	PAGO A 31.03.2023
C02-i01	Programa de apoio ao acesso à habitação Responsável: INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, I.P.	1.210 M €	76%	19%
C02-i02	Bolsa nacional de alojamento urgente e temporário Responsável: INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, I.P.	203 M €	39%	5%
C02-i03-RAM	Reforço da oferta de habitação apoiada na Região Autónoma da Madeira Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM	136 M €	100%	14%
C02-i04-RAA	Aumentar as condições habitacionais do parque habitacional da Região Autónoma dos Açores Responsável: DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FUNDOS ESTRUTURAIIS	44 M €	137%	29%
C02-i05	Parque público de habitação a custos acessíveis Responsável: INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, I.P.	900 M €	87%	4%
C02-i06	Alojamento Estudantil a custos acessíveis Responsável: AGÊNCIA NACIONAL PARA A GESTÃO DO PROGRAMA ERASMUS + EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	516 M €	95%	24%
C02-i07-RAA	Infraestruturas para parcelas de terreno destinadas à habitação Responsável: DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FUNDOS ESTRUTURAIIS	4 M €		
C02-i08-RAA	Reforço do parque habitacional social Responsável: DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FUNDOS ESTRUTURAIIS	19 M €		
C02-i09	Programa de apoio ao acesso à habitação (empréstimo) Responsável: INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, I.P.	197 M €		

5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C03
Respostas Sociais

1.043 M €
Dotação orçamental

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 31.03.2024



Reformas

CÓDIGO	REFORMA	ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO A 31.03.2024
C03-r05	Reforma da provisão de equipamentos e respostas sociais	Concretizada
C03-r06	Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência 2021-2025	Concretizada
C03-r07	Contratualização de programas integrados de apoio às comunidades desfavorecidas nas áreas metropolitanas	Concretizada
C03-r08	Estratégia Nacional de Combate à Pobreza	Concretizada
C03-r38	Simplificação e eficácia do sistema de segurança social	Em fase de implementação

5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C03 Respostas Sociais

1.043 M €
Dotação orçamental

Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 31.03.2023	PAGO A 31.03.2023
C03-i01	Nova Geração de Equipamentos e Respostas Sociais Responsável: INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	591 M €	68%	13%
C03-i02	Acessibilidades 360º Responsável: INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇÃO, I.P.	53 M €	26%	6%
C03-i03-RAM	Fortalecimento das respostas sociais na Região Autónoma da Madeira (RAM) Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM	95 M €	87%	12%
C03-i04-RAA	Implementar a Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social - Redes de Apoio Social (RAA) Responsável: DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FUNDOS ESTRUTURAIIS	40 M €	100%	22%
C03-i05	Plataforma +Acesso Responsável: INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇÃO, I.P.	3 M €	100%	21%
C03-i06.01	Programa Bairros Saudáveis Responsável: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE I.P.	7 M €	98%	69%
C03-i06.02	Operações Integradas em Comunidades Desfavorecidas na Área Metropolitana de Lisboa Responsável: ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA	122 M €	100%	20%
C03-i06.03	Operações Integradas em Comunidades Desfavorecidas na Área Metropolitana do Porto Responsável: ÁREA METROPOLITANA DO PORTO	122 M €	169%	6%
C03-i07-RAA	Modernização e expansão da rede de estruturas residenciais para pessoas idosas (ERPI) Responsável: DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FUNDOS ESTRUTURAIIS	11 M €		


5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C04
Cultura

319 M €
Dotação orçamental

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 31.03.2024

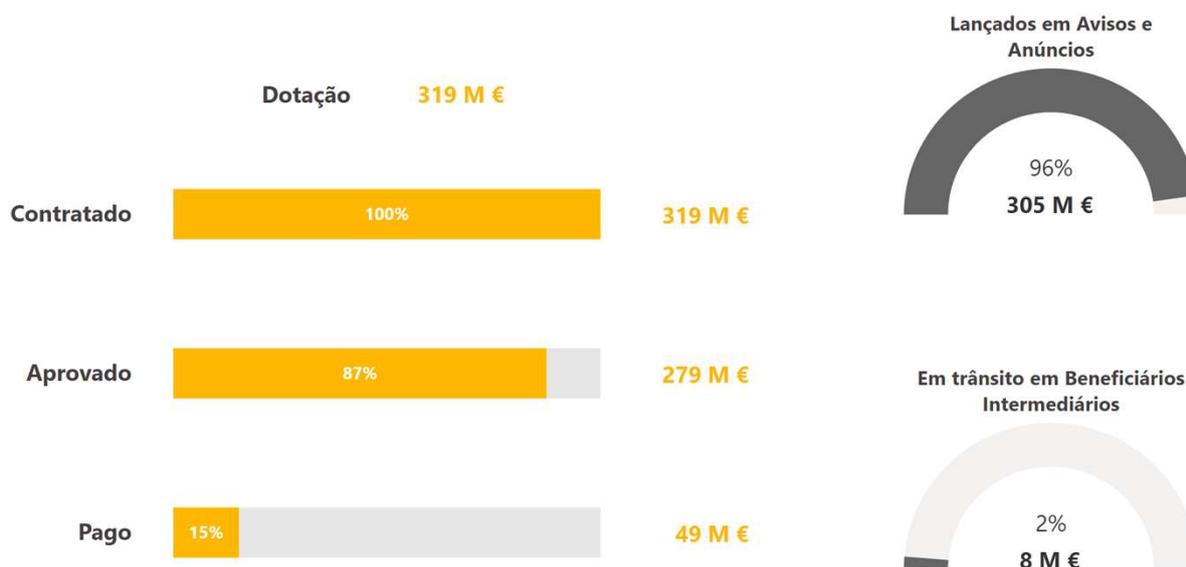

Reformas

Não existe reformas associadas a esta componente.

Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 31.03.2023	PAGO A 31.03.2023
C04-i01	Redes Culturais e Transição Digital Responsável: GABINETE DE ESTRATÉGIA, PLANEAMENTO E AVALIAÇÃO CULTURAIS	103 M €	76%	16%
C04-i02	Património Cultural Responsável: FUNDO DE SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO CULTURAL	216 M €	93%	15%


5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C05
Capitalização e Inovação Empresarial

4.915 M €
Dotação orçamental

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 31.03.2024

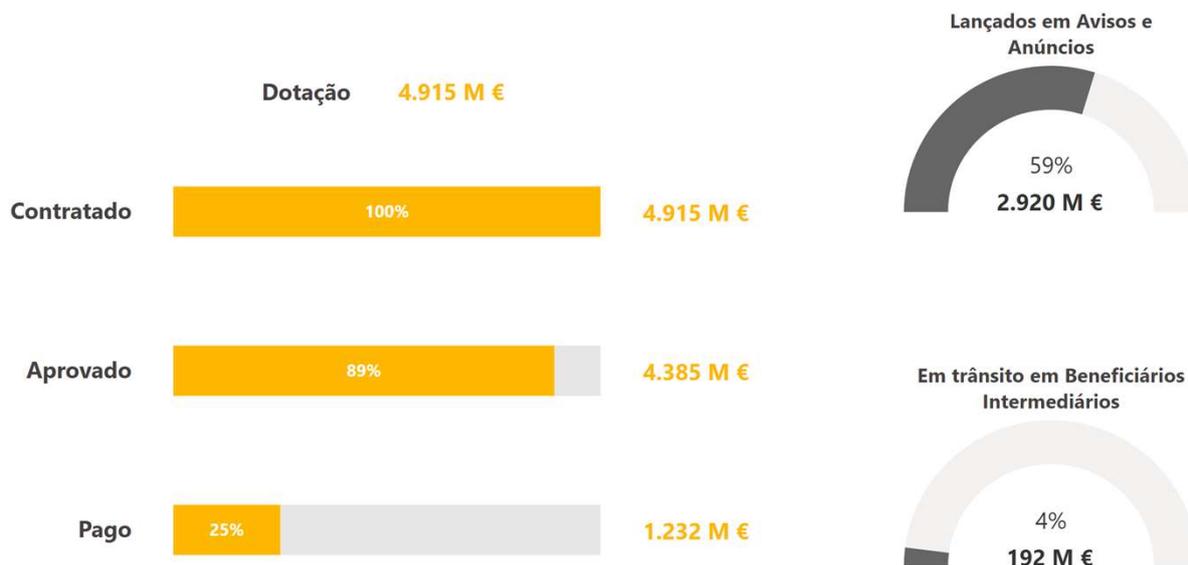

Reformas

CÓDIGO	REFORMA	ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO A 31.03.2024
C05-r09	Promoção da Investigação, Desenvolvimento e Inovação (I&D&I) e do investimento inovador nas empresas	● Concretizada
C05-r10	Criação e desenvolvimento do Banco Português de Fomento	● Concretizada
C05-r11	Alargamento e consolidação da Rede de Instituições de Interface	● Concretizada
C05-r12	Agenda de investigação e inovação para a sustentabilidade da agricultura, alimentação e agroindústria	● Concretizada
C05-r13	Desenvolvimento do mercado de capitais e promoção da capitalização das empresas não-financeiras	● Em fase avançada de implementação

5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C05 Capitalização e Inovação Empresarial

4.915 M €
Dotação orçamental

Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 31.03.2023	PAGO A 31.03.2023
C05-i01.01	Agendas/Alianças mobilizadoras para a Inovação Empresarial Responsável: IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P.	558 M €	269%	70%
C05-i01.02	Agendas/Alianças Verdes para a Inovação Empresarial Responsável: IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P.	372 M €	337%	85%
C05-i02	Missão Interface - renovação da rede de suporte C&T e orientação para o tecido produtivo Responsável: ANI - AGÊNCIA NACIONAL DE INOVAÇÃO, S.A.	186 M €	102%	29%
C05-i03	Agenda de investigação e inovação para a sustentabilidade da agricultura, alimentação e agroindústria Responsável: INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS (IFAP, I.P.)	93 M €	100%	20%
C05-i04-RAA	Recapitalizar o Sistema Empresarial dos Açores Responsável: DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FUNDOS ESTRUTURAIIS	125 M €	60%	24%
C05-i05-RAA	Recuperação Económica da Agricultura dos Açores Responsável: DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FUNDOS ESTRUTURAIIS	34 M €	114%	13%
C05-i06.01	Capitalização de empresas e resiliência financeira/Banco Português de Fomento/IAPMEI Responsável: BANCO PORTUGUÊS DE FOMENTO, S.A.	1.300 M €	73%	12%
C05-i06.02	Capitalização de empresas e resiliência financeira/Banco Português de Fomento Responsável: BANCO PORTUGUÊS DE FOMENTO, S.A.	250 M €	100%	100%
C05-i07-RAM	Instrumentos de capitalização para empresas da Madeira Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM	4 M €		
C05-i08	Ciência Mais Digital Responsável: FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA, I.P.	48 M €	75%	34%
C05-i09	Reforço: Agendas/Alianças Mobilizadoras para a Inovação Empresarial Responsável: IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P.	319 M €		
C05-i10	Reforço: Agendas/Alianças Verdes para a Inovação Empresarial Responsável: IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P.	320 M €		
C05-i11	Reforço: Agendas/Alianças Mobilizadoras para a Inovação Empresarial (Empréstimos) Responsável: IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P.	772 M €		
C05-i12	Reforço: Agendas/Alianças Verdes para a Inovação Empresarial (Empréstimos) Responsável: IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P.	533 M €		

5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C06
Qualificação e Competências

1.979 M €
Dotação orçamental

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 31.03.2024



Reformas

CÓDIGO	REFORMA	ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO A 31.03.2024
C06-r14	Reforma do ensino e formação profissionais	Em fase de implementação
C06-r15	Reforma da cooperação entre ensino superior e administração pública e empresas	Concretizada
C06-r16	Redução das restrições nas profissões altamente regulamentadas	Em fase de implementação
C06-r17	Agenda de promoção do trabalho digno	Concretizada
C06-r18	Combate às desigualdades entre mulheres e homens	Em fase de implementação

5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C06 Qualificação e Competências

1.979 M €
Dotação orçamental

Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 31.03.2023	PAGO A 31.03.2023
C06-i01.01	Modernização das instituições de ensino e formação profissionais - Instalação e/ou modernização dos Centros Tecnológicos Especializados Responsável: INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO, I.P.	480 M €	34%	7%
C06-i01.02	Modernização da oferta e dos estabelecimentos de ensino e da formação profissional - Modernização da Formação Profissional Responsável: INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P.	230 M €	100%	17%
C06-i01.03	Modernização das instituições de ensino e formação profissionais - Instalação e/ou modernização dos Centros Tecnológicos Especializados - Turismo Responsável: TURISMO DE PORTUGAL, IP	20 M €	100%	13%
C06-i02	Compromisso Emprego Sustentável Responsável: INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P.	230 M €	141%	75%
C06-i03.01	Incentivo Adultos - Projetos Locais Promotores de Qualificações de Nível B1/B2/B3 Responsável: AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO E O ENSINO PROFISSIONAL, I.P.	40 M €	97%	11%
C06-i03.02	Incentivo Adultos - Acelerador Qualifica Responsável: AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO E O ENSINO PROFISSIONAL, I.P.	55 M €	36%	31%
C06-i03.03	Impulso Adultos Responsável: DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR	138 M €	95%	21%
C06-i04.01	Impulso Jovens STEAM Responsável: DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR	131 M €	93%	24%
C06-i04.02	Impulso Jovens STEAM - Rede Ciência Viva Responsável: CIÊNCIA VIVA - AGÊNCIA NACIONAL PARA A CULTURA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	9 M €	84%	49%
C06-i05-RAA	Qualificação de adultos e aprendizagem ao longo da vida na RAA Responsável: DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FUNDOS ESTRUTURAIIS	29 M €	100%	13%
C06-i06	Ciência Mais Capacitação Responsável: FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA, I.P.	45 M €	6%	1%
C06-i07	Impulso Mais Digital Responsável: DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR	105 M €		
C06-i08-RAM	Ampliação do Edifício do CITMA Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM	18 M €		
C06-i09.01	Escolas novas ou renovadas - Norte Responsável: CCDR - Norte	125 M €		
C06-i09.02	Escolas novas ou renovadas - Centro Responsável: CCDR - Centro	150 M €		
C06-i09.03	Escolas novas ou renovadas - LVT Responsável: CCDR - LVT	125 M €		
C06-i09.04	Escolas novas ou renovadas - Alentejo Responsável: CCDR - Alentejo	20 M €		
C06-i09.05	Escolas novas ou renovadas - Algarve Responsável: CCDR - Algarve	30 M €		

5. Síntese da Implementação por Componente

	COMPONENTE C07 Infraestruturas	813 M € Dotação orçamental
--	--	--------------------------------------

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 31.03.2024



Reformas

Não existe reformas associadas a esta componente.

5. Síntese da Implementação por Componente

	COMPONENTE C07 Infraestruturas	813 M € Dotação orçamental
---	---	--------------------------------------

Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 31.03.2023	PAGO A 31.03.2023
C07-i01.01	Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) Responsável: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE (CCDR NORTE)	31 M €	100%	7%
C07-i01.02	Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) Responsável: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO (CCDR CENTRO)	32 M €	100%	10%
C07-i01.03	Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) Responsável: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO (CCDR LVT)	13 M €	100%	1%
C07-i01.04	Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) Responsável: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO	30 M €	99%	13%
C07-i01.05	Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) Responsável: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE	4 M €	100%	4%
C07-i02.01	Missing links e Aumento capacidade da Rede - EN14, EN4, IC35, IP2, EN125, EN211, EN344, IC2, IP8 (A26), Baião/Pone Ermida, IP8 (EN121), IP8 (EN259) Responsável: INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.	320 M €	100%	27%
C07-i02.02	Missing links e Aumento capacidade da Rede - Eixo Rodoviário Aveiro – Águeda Responsável: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO (CCDR CENTRO)	47 M €	85%	7%
C07-i03.01	Ligações transfronteiriças - Ponte internacional sobre o Rio Sever Responsável: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO	11 M €	85%	6%
C07-i03.02	Ligações transfronteiriças - Ponte Alcoutim – Saluncar del Guadiana (ES) Responsável: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE	11 M €	85%	8%
C07-i03.03	Ligações transfronteiriças - EN103. Vinhais / Bragança (variantes) Responsável: INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.	37 M €	100%	12%
C07-i03.04	Ligações transfronteiriças - Ligação de Bragança a Puebla de Sanabria (ES) Responsável: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE (CCDR NORTE)	19 M €	100%	10%
C07-i04.01	Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) – Acessibilidades Rodoviárias Responsável: INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.	106 M €	100%	21%
C07-i04.02	Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) – Acessibilidades Rodoviárias - EN10-4. Setúbal/ Mitrena e Ligação da A8 à Área Empresarial das Palhagueiras em Torres Vedras Responsável: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO (CCDR LVT)	11 M €	89%	7%
C07-i04.03	Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) – Acessibilidades Rodoviárias : Ligação do Parque Empresarial do Casarão ao IC2 Responsável: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO (CCDR CENTRO)	7 M €	85%	11%
C07-i04.04	Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) – Acessibilidades Rodoviárias Responsável: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE (CCDR NORTE)	42 M €	85%	11%
C07-i04.05	Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) – Acessibilidades Rodoviárias - Rotunda na EN246 para acesso à zona industrial de Portalegre Responsável: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO	0 M €	100%	84%
C07-i05-RAA	Circuitos Logísticos - Rede Viária Regional dos Açores Responsável: DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FUNDOS ESTRUTURAIIS	92 M €	65%	15%

5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C08
Florestas

615 M €
Dotação orçamental

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 31.03.2024



Reformas

CÓDIGO	REFORMA	ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO A 31.03.2024
C08-r19	Transformação da paisagem dos territórios de floresta vulneráveis	Concretizada
C08-r20	Reorganização do sistema de cadastro da propriedade rústica e do Sistema de Monitorização de Ocupação do Solo	Concretizada
C08-r21	Prevenção e combate de fogos rurais	Concretizada

5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C08 Florestas

615 M €
Dotação orçamental

Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 31.03.2023	PAGO A 31.03.2023
C08-i01.01	Transformação da Paisagem dos Territórios de Floresta Vulneráveis - "Áreas integradas de gestão da paisagem (AIGP) e Condomínios de Aldeia" Responsável: FUNDO AMBIENTAL	257 M €	7%	1%
C08-i01.02	Transformação da Paisagem dos Territórios de Floresta Vulneráveis: Programas de Reordenamento e Gestão da Paisagem Responsável: DIREÇÃO-GERAL DO TERRITÓRIO	3 M €	100%	21%
C08-i01.03	Transformação da Paisagem dos Territórios de Floresta Vulneráveis - Emparcelar para Ordenar Responsável: INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS (IFAP, I.P.)	10 M €	0%	0%
C08-i02.01	Cadastro da Propriedade Rústica e Sistema de Monitorização da Ocupação do Solo: SMOS Responsável: DIREÇÃO-GERAL DO TERRITÓRIO	29 M €	94%	14%
C08-i02.02	Cadastro da Propriedade Rústica e Sistema de Monitorização da Ocupação do Solo: Inventário Florestal Nacional Responsável: INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.	2 M €	201%	0%
C08-i02.03	Cadastro da Propriedade Rústica e Sistema de Monitorização da Ocupação do Solo: Sistema Nacional de Cadastro Predial Responsável: SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA JUSTIÇA	45 M €	100%	24%
C08-i02.04	Cadastro da Propriedade Rústica e Sistema de Monitorização da Ocupação do Solo: Sistema Nacional de Cadastro Predial – Dimensão Local Região Norte Responsável: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE (CCDR NORTE)	5 M €		
C08-i02.05	Cadastro da Propriedade Rústica e Sistema de Monitorização da Ocupação do Solo: Sistema Nacional de Cadastro Predial – Dimensão Local Região Centro Responsável: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO (CCDR CENTRO)	5 M €		
C08-i03	Faixas de gestão de combustível - Rede Primária Responsável: INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.	120 M €	100%	14%
C08-i04.01	Meios de prevenção e combate a incêndios rurais – Subinvestimento Meios aéreos Responsável: ESTADO MAIOR DA FORÇA AEREA	70 M €	100%	47%
C08-i04.02	Meios de prevenção e combate a incêndios rurais – Subinvestimento Meios terrestres Responsável: INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.	16 M €	100%	85%
C08-i04.03	Meios de prevenção e combate a incêndios rurais: Rede de radares Responsável: INSTITUTO PORTUGUÊS DO MAR E DA ATMOSFERA, I.P.	3 M €	100%	74%
C08-i05.01	Programa MAIS Floresta: Reforma do sistema de prevenção e combate de incêndios Responsável: SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	40 M €	100%	28%
C08-i05.02	Programa MAIS Floresta: Reforço de atuação das organizações de produtores florestais (OPF) e dos Centros de Competências no setor florestal Responsável: FUNDO AMBIENTAL	10 M €	64%	3%

5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C09 Gestão Hídrica

461 M €
Dotação orçamental

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 31.03.2024



Reformas

Não existe reformas associadas a esta componente.

Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 31.03.2023	PAGO A 31.03.2023
C09-i01.01	Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve: SM1 – Reduzir perdas de água no setor urbano Responsável: CI - AMAL - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE	44 M €	59%	10%
C09-i01.02	Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve: SM2 – Reduzir perdas de água e aumentar a eficiência no setor agrícola Responsável: FUNDO AMBIENTAL	19 M €	71%	6%
C09-i01.03	Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve: SM3 - Reforçar a governança dos recursos hídricos Responsável: AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.	6 M €	91%	13%
C09-i01.04	Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve: SM4 – Promover a utilização de Água Residual Tratada, SM5 – Aumentar a capacidade disponível e resiliência das albufeiras/sistemas de adução em alta existentes e reforçar com novas origens de água e SM Responsável: ÁGUAS DO ALGARVE S.A.	169 M €	100%	10%
C09-i02	Aproveitamento hidráulico de fins múltiplos do Crato - fase de planeamento Responsável: COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO ALENTEJO	0 M €	0%	0%
C09-i03-RAM	Plano de eficiência e reforço hídrico dos sistemas de abastecimento e regadio da RAM Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM	82 M €	85%	18%
C09-i04	Aproveitamento hidráulico de fins múltiplos do Crato - fase de construção Responsável: COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO ALENTEJO	141 M €	100%	12%

5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C10
Mar

393 M €
Dotação orçamental

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 31.03.2024



Reformas

CÓDIGO	REFORMA	ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO A 31.03.2024
C10-r23	Reforma do Ecossistema de Infraestruturas de Suporte à Economia Azul	Concretizada

Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 31.03.2023	PAGO A 31.03.2023
C10-i01	Hub Azul, Rede de Infraestruturas para a Economia Azul Responsável: Fundo Azul	99 M €	97%	21%
C10-i02	Transição Verde e Digital e Segurança nas Pescas Responsável: INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS (IFAP, I.P.)	21 M €	103%	27%
C10-i03.01	Centro de Operações de Defesa do Atlântico e Plataforma Naval - Pilar I - Plataforma Naval Multifuncional e Pilar II - Centro de Operações Responsável: MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL-MARINHA	148 M €	100%	41%
C10-i03.02	Centro de Operações de Defesa do Atlântico e Plataforma Naval - Pilar III - Academia do Arsenal do Alfeite (Academia 4.0) Responsável: ARSENAL DO ALFEITE, S.A.	2 M €	100%	71%
C10-i04-RAA	Desenvolvimento do "Cluster do Mar dos Açores" Responsável: DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FUNDOS ESTRUTURAIS	48 M €	67%	18%
C10-i05-RAA	Transição energética, digitalização e redução do impacto ambiental no setor da Pesca e da Aquicultura Responsável: DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FUNDOS ESTRUTURAIS	5 M €	-	-
C10-i06-RAM	Tecnologias Oceânicas Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM	20 M €	-	-
C10-i07	Green Shipping Responsável: IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P.	50 M €	-	-

5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C11
Descarbonização da Indústria

737 M €
Dotação orçamental

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 31.03.2024



Reformas

Não existe reformas associadas a esta componente.

Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 31.03.2023	PAGO A 31.03.2023
C11-i01	Descarbonização da Indústria Responsável: IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P.	737 M €	119%	20%

5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C12
Bioeconomia Sustentável

145 M €
Dotação orçamental

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 31.03.2024



Reformas

CÓDIGO	REFORMA	ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO A 31.03.2024
C12-r25	Bioeconomia sustentável	Concretizada
C12-r39	Promover a economia circular e uma gestão mais eficiente dos resíduos	Em fase de implementação

Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 31.03.2023	PAGO A 31.03.2023
C12-i01.01	Bioeconomia: Projetos Integrados (Têxtil e Vestuário, Calçado e Resina Natural) e Beneficiação de Povoamentos de Pinheiro Bravo com Potencial para a Resinagem Responsável: FUNDO AMBIENTAL	140 M €	95%	17%
C12-i01.02	Bioeconomia - Gestão Florestal e Apoio à Resinagem Responsável: INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.	5 M €	88%	84%

5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C13
Eficiência Energética em Edifícios

610 M €
Dotação orçamental

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 31.03.2024



Reformas

Não existe reformas associadas a esta componente.

Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 31.03.2023	PAGO A 31.03.2023
C13-i01	Eficiência energética em edifícios residenciais Responsável: FUNDO AMBIENTAL	300 M €	46%	46%
C13-i02	Eficiência energética em edifícios da administração pública central Responsável: FUNDO AMBIENTAL	240 M €	80%	6%
C13-i03	Eficiência energética em edifícios de serviços Responsável: FUNDO AMBIENTAL	70 M €	31%	0%


5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C14
Hidrogénio e Renováveis

385 M €
Dotação orçamental

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 31.03.2024

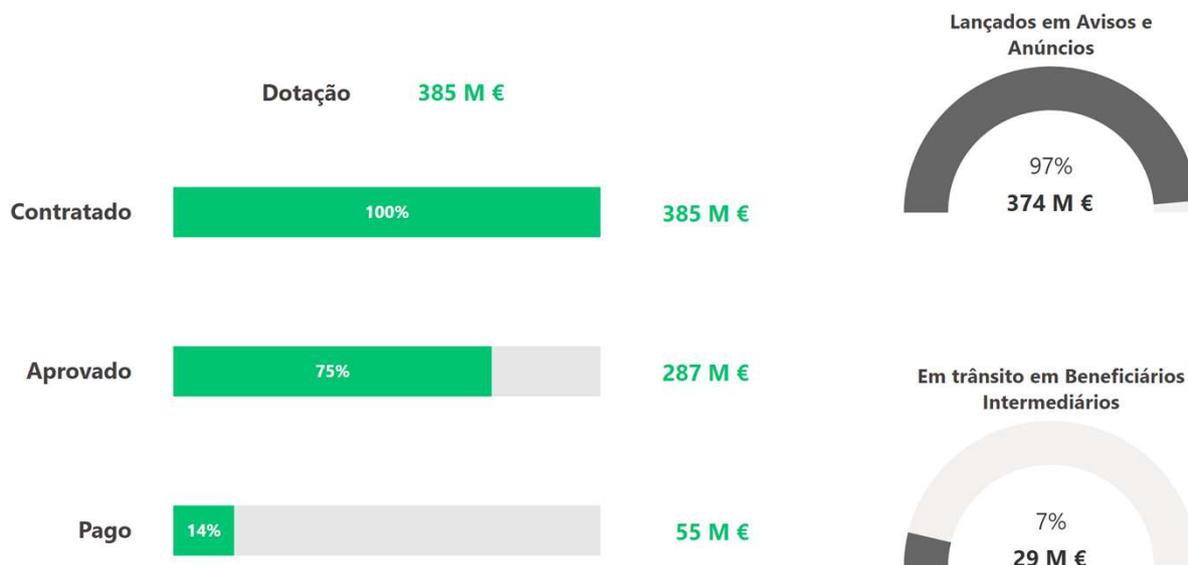

Reformas

CÓDIGO	REFORMA	ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO A 31.03.2024
C14-r29	Estratégia Nacional para o Hidrogénio (EN-H2)	● Concretizada

Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 31.03.2023	PAGO A 31.03.2023
C14-i01	Hidrogénio e gases renováveis Responsável: FUNDO AMBIENTAL	185 M €	55%	3%
C14-i02-RAM	Potenciação da eletricidade renovável no Arquipélago da Madeira Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM	84 M €	82%	25%
C14-i03-RAA	Transição Energética nos Açores Responsável: DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FUNDOS ESTRUTURAIS	116 M €	100%	25%

5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C15
Mobilidade Sustentável

1.262 M €
Dotação orçamental

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 31.03.2024



Reformas

CÓDIGO	REFORMA	ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO A 31.03.2024
C15-r30	Reforma do ecossistema de transportes	Em fase de implementação

Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 31.03.2023	PAGO A 31.03.2023
C15-i01	Expansão da Rede de Metro de Lisboa - Linha Vermelha até Alcântara Responsável: METROPOLITANO DE LISBOA, E.P.E.	358 M €	100%	12%
C15-i02	Expansão da Rede de Metro do Porto - Casa da Música-Santo Ovídio Responsável: METRO DO PORTO S.A.	352 M €	100%	16%
C15-i03	Metro Ligeiro de Superfície Odivelas-Loures Responsável: METROPOLITANO DE LISBOA, E.P.E.	390 M €	100%	8%
C15-i04	Linha BRT Boavista - Império Responsável: METRO DO PORTO S.A.	66 M €	100%	25%
C15-i05	Descarbonização dos Transportes Públicos Responsável: FUNDO AMBIENTAL	48 M €	100%	17%
C15-i06	Digitalização do Transporte Ferroviário Responsável: INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.	49 M €	100%	13%

5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C21
REPower EU

855 M €
Dotação orçamental

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 31.03.2024



Reformas

CÓDIGO	REFORMA	ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO A 31.03.2024
C21-r43	Observatório Nacional da Pobreza Energética	🕒 Em fase de implementação
C21-r44	Criação de balcões únicos para os cidadãos em matéria de eficiência energética (Espaços Cidadão Energia)	🕒 Em fase de implementação
C21-r45	Competências verdes	🕒 Em fase de implementação
C21-r46	Quadro regulamentar para o hidrogénio renovável	🕒 Em fase de implementação
C21-r47	Primeiro leilão para a compra de biometano sustentável e plano de ação para o biometano	🕒 Em fase de implementação
C21-r48	Simplificação do quadro jurídico e regulamentar aplicável aos projetos de energias renováveis	🕒 Em fase de implementação

5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C21 REPower EU

855 M €
Dotação orçamental

Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 31.03.2023	PAGO A 31.03.2023
C21-i01	Medida reforçada: Descarbonização da Indústria Responsável: IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P.	100 M €	0%	0%
C21-i02	Medida reforçada: Eficiência energética em edifícios residenciais Responsável: FUNDO AMBIENTAL	120 M €	1%	0%
C21-i03	Medida reforçada: Eficiência energética em edifícios de serviços Responsável: FUNDO AMBIENTAL	80 M €	1%	0%
C21-i04-RAM	Eficiência energética em edifícios públicos da Madeira Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM	14 M €		
C21-i05	Apoio ao Desenvolvimento da Indústria Verde Responsável: IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P.	50 M €		
C21-i06	Medida reforçada: Hidrogénio e Gases Renováveis Responsável: FUNDO AMBIENTAL	70 M €		
C21-i07.01	Estudos técnicos para potencial energético offshore Responsável: INSTITUTO PORTUGUÊS DO MAR E DA ATMOSFERA, I.P	42 M €	100%	25%
C21-i07.02	Estudos técnicos para potencial energético offshore Responsável: LNEG	8 M €	100%	0%
C21-i08	Flexibilidade da Rede e Armazenamento Responsável: FUNDO AMBIENTAL	100 M €		
C21-i09	One-Stop-Shop para o Licenciamento e Acompanhamento de Projetos de Energias Renováveis Responsável: DGEG	10 M €	100%	0%
C21-i10-RAA	Sistema de Incentivos à aquisição e instalação de sistemas de armazenamento de energias renováveis nos Açores Responsável: DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FUNDOS ESTRUTURAIS	6 M €		
C21-i11-RAM	Sistema de Incentivos à produção e Armazenamento de Energia Proveniente de Fontes Renováveis na Madeira e no Porto Santo Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM	19 M €		
C21-i12	Medida reforçada: Descarbonização dos Transportes Públicos Responsável: FUNDO AMBIENTAL	90 M €		
C21-i13-RAM	Descarbonização dos Transportes Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM	12 M €		
C21-i14	Sistema de BRT Braga Responsável: TUB - Transportes Urbanos de Braga, E. M.	100 M €	100%	13%
C21-i15-RAA	Aquisição de 2 ferries elétricos Responsável: DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FUNDOS ESTRUTURAIS	25 M €		
C21-i16	Funicular da Nazaré Responsável: Município da Nazaré	10 M €	100%	0%

5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C16
Empresas 4.0

763 M €
Dotação orçamental

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 31.03.2024



Reformas

CÓDIGO	REFORMA	ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO A 31.03.2024
C16-r31	Transição digital do ambiente empresarial	Concretizada

Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 31.03.2023	PAGO A 31.03.2023
C16-i01	Capacitação Digital das Empresas Responsável: IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P.	100 M €	100%	31%
C16-i02	Transição Digital das Empresas Responsável: IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P.	475 M €	48%	9%
C16-i03	Catalisação da Transição Digital das Empresas Responsável: IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P.	100 M €	71%	15%
C16-i04	Indústria 4.0 Responsável: IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P.	60 M €	101%	0%
C16-i05-RAA	Capacitação e Transformação Digital das Empresas dos Açores Responsável: DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FUNDOS ESTRUTURAIS	22 M €	-	-
C16-i06-RAM	Empresas 4.0 Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM	6 M €	-	-

5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C17
Qualidade e Sustentab. das Finanças Públicas

406 M €
Dotação orçamental

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 31.03.2024



Reformas

CÓDIGO	REFORMA	ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO A 31.03.2024
C17-r32	Modernização e simplificação da gestão financeira pública	Em fase avançada de implementação
C17-r40	Simplificação do sistema fiscal	Em fase de implementação

Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 31.03.2023	PAGO A 31.03.2023
C17-i01.01	Sistemas de informação de Gestão Financeira Pública Responsável: ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, I.P.	161 M €	100%	17%
C17-i01.02	Sistemas de informação de Gestão Financeira Pública/ SIGPIP Responsável: ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, I.P.	2 M €	100%	0%
C17-i02	Modernização da infraestrutura do sistema de informação patrimonial da Autoridade Tributária Responsável: AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	43 M €	100%	23%
C17-i03.01	Transição digital da Segurança Social Responsável: INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	19 M €	100%	33%
C17-i03.02	Transição digital da Segurança Social Responsável: INSTITUTO DE INFORMÁTICA, I.P.	182 M €	100%	34%

5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C18
Justiça Económica e Ambiente de Negócios

267 M €
Dotação orçamental

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 31.03.2024



Reformas

CÓDIGO	REFORMA	ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO A 31.03.2024
C18-r33	Justiça económica e ambiente empresarial	Em fase avançada de implementação

5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C18 Justiça Económica e Ambiente de Negócios

267 M €
Dotação orçamental

Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 31.03.2023	PAGO A 31.03.2023
C18-i01.01	TD C18-i01.01: Justiça económica e ambiente de negócios/IGFEJ Responsável: INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA E EQUIPAMENTOS DA JUSTIÇA, I.P.	139 M €	100%	23%
C18-i01.02	Justiça Económica e Ambiente de Negócios/IRN Responsável: INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO, I.P.	43 M €	100%	21%
C18-i01.03	TD C18-i01.03: Justiça económica e ambiente de negócios/DGPJ Responsável: DIRECÇÃO-GERAL DA POLÍTICA DE JUSTIÇA	24 M €	100%	19%
C18-i01.04	Justiça Económica e Ambiente de Negócios/DGAJ Responsável: DIRECÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA	16 M €	100%	17%
C18-i01.05	Justiça Económica e Ambiente de Negócios/PJ Responsável: POLICIA JUDICIARIA	19 M €	100%	23%
C18-i01.06	TD C18-i01.06: Justiça económica e ambiente de negócios/SGMJ Responsável: SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA JUSTIÇA	10 M €	100%	18%
C18-i01.07	TD C18-i01.07: Justiça económica e ambiente de negócios/INMLCF Responsável: INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL E CIÊNCIAS FORENSES, I.P.	7 M €	100%	24%
C18-i01.08	TD C18-i01.08: Justiça económica e ambiente de negócios/INPI Responsável: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	2 M €	100%	30%
C18-i01.09	TD C18-i01.09: Justiça económica e ambiente de negócios/CAAJ Responsável: COMISSÃO PARA O ACOMPANHAMENTO DOS AUXILIARES DA JUSTIÇA	1 M €	100%	90%
C18-i01.10	TD C18-i01.10: Justiça económica e ambiente de negócios/PGR Responsável: PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA	3 M €	100%	23%
C18-i01.11	Justiça Económica e Ambiente de Negócios/CSM Responsável: CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA	1 M €	100%	59%
C18-i01.12	Justiça Económica e Ambiente de Negócios/STA Responsável: SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO	0 M €	100%	13%
C18-i01.13	Justiça Económica e Ambiente de Negócios / MENAC Responsável: MECANISMO NACIONAL ANTICORRUPÇÃO (MENAC)	1 M €	100%	0%

5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C19

Administração Pública mais Eficiente

675 M €
Dotação orçamental

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 31.03.2024



Reformas

CÓDIGO	REFORMA	ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO A 31.03.2024
C19-r34	Serviços públicos digitais, simples, inclusivos e seguros para os cidadãos e para as empresas	● Concretizada
C19-r35	Reforma funcional e orgânica da administração pública	● Em fase de implementação
C19-r36	Administração pública capacitada para a criação de valor público	● Concretizada
C19-r41	Acesso aos serviços públicos: harmonizar e consolidar o acesso presencial e em linha	● Em fase de implementação
C19-r42	Novo sistema de avaliação para capacitar e rejuvenescer o pessoal da administração pública	● Em fase de implementação

5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C19

Administração Pública mais Eficiente

675 M €

Dotação orçamental


Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 31.03.2023	PAGO A 31.03.2023
C19-i01.01	Reformulação do atendimento dos serviços público e consulares Responsável: AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.	159 M €	85%	29%
C19-i01.02	Reformulação do atendimento dos serviços público e consulares - SGMNE Responsável: SECRETARIA GERAL DO MINISTERIO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS	56 M €	91%	37%
C19-i02.01	Serviços Eletrónicos sustentáveis, baseados na interoperabilidade e utilização dos dados para um aumento de transparência e eficiência Responsável: AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.	65 M €	95%	32%
C19-i02.02	Serviços Eletrónicos sustentáveis/INE Responsável: INSTITUTO NACIONAL DE ESTATISTICA	5 M €	100%	23%
C19-i03	Reforço do quadro geral de cibersegurança Responsável: GABINETE NACIONAL DE SEGURANÇA (GNS)	52 M €	92%	13%
C19-i04.01	Transição Digital na Rede Informática do Governo (RING)/CEGER Responsável: CENTRO DE GESTÃO DA REDE INFORMÁTICA DO GOVERNO - CEGER	13 M €	100%	52%
C19-i04.02	Infraestruturas críticas digitais eficientes, seguras e partilhadas/SGMAI Responsável: SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	62 M €	100%	5%
C19-i04.03	Infraestruturas críticas digitais eficientes, seguras e partilhadas Responsável: SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	8 M €	100%	13%
C19-i05.01-RAM	Transição Digital da Administração Pública da RAM - DRI Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM	71 M €	105%	13%
C19-i05.02-RAM	Transição Digital da Administração Pública da RAM-DRAPMA Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM	9 M €	37%	13%
C19-i06-RAA	Transição Digital da Administração Pública dos Açores Responsável: DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FUNDOS ESTRUTURAIIS	31 M €	82%	21%
C19-i07.01	Capacitação da Administração Pública - INA Responsável: INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, I.P. (INA, I.P.)	30 M €	108%	19%
C19-i07.02	C19 – i07.02 – Capacitação da Administração Pública – Entidade responsável pela implementação da reforma TD-r35 Responsável: SECRETARIA GERAL DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS	2 M €	100%	13%
C19-i07.03	Capacitação da Administração Pública - Formação Lojas do Cidadão/ Espaços Cidadão Responsável: AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.	1 M €	100%	35%
C19-i07.04	Capacitação da Administração Pública - PlanAPP Responsável: CENTRO DE COMPETÊNCIAS DE PLANEAMENTO, DE POLÍTICAS E DE PROSPETIVA DA ADMINISTRAÇÃO (PLANAPP)	12 M €	100%	18%
C19-i07.05	TD C19-i07.05 - Capacitação da Administração Pública - Programa de Estágios e Promoção do Teletrabalho Responsável: DIRECÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E DO EMPREGO PÚBLICO	38 M €	92%	26%
C19-i08	Territórios Inteligentes - AMA Responsável: AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.	60 M €		

5. Síntese da Implementação por Componente

	COMPONENTE C20 Escola Digital	605 M € Dotação orçamental
--	---	--------------------------------------

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 31.03.2024

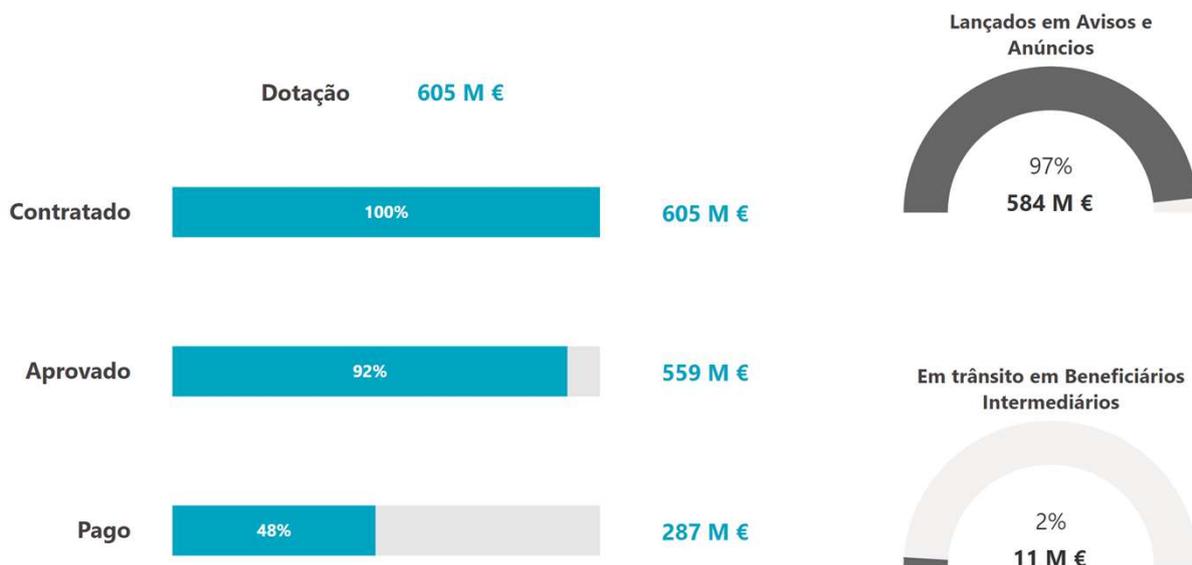

Reformas

CÓDIGO	REFORMA	ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO A 31.03.2024
C20-r37	Reforma para a educação digital	Em fase de implementação

Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 31.03.2023	PAGO A 31.03.2023
C20-i01.01	Transição digital na Educação Responsável: SECRETARIA-GERAL DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA	294 M €	93%	13%
C20-i01.02	Transição digital na Educação Responsável: SECRETARIA-GERAL DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA	246 M €	93%	93%
C20-i02-RAA	Educação digital (Açores) Responsável: DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FUNDOS ESTRUTURAIS	43 M €	88%	34%
C20-i03-RAM	Acelerar a digitalização da Educação na RAM Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM	22 M €	95%	29%



PRR
Plano de Recuperação
e Resiliência

Anexos

ANEXOS

ANEXO I

Listagem de Projetos Aprovados a Beneficiários Diretos

ANEXO I - Listagem de Projetos Aprovados a Beneficiários Diretos

A listagem dos projetos aprovados a 31 de março de 2024 consta de documento autónomo.

ANEXOS

ANEXO II

Listagem de Projetos Aprovados a Beneficiários Finais

ANEXO II - Listagem de Projetos Aprovados a Beneficiários Finais

A listagem dos projetos aprovados a 31 de março de 2024 consta de documento autónomo.

