

RELATÓRIO TRIMESTRAL

SETEMBRO 2024



Financiado pela
União Europeia
NextGenerationEU

RECUPERAR
PORTUGAL



Ficha Técnica

Título: Relatório Trimestral setembro 2024

Edição: 1ª edição, 2024

Propriedade: Estrutura de Missão Recuperar Portugal

RECUPERAR
PORTUGAL



CONTEÚDOS

- 1 O PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA
- 2 PROGRESSO GERAL A 30 DE SETEMBRO DE 2024
- 3 SÍNTESE DA IMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA
- 4 SÍNTESE DA IMPLEMENTAÇÃO POR DIMENSÃO ESTRUTURANTE
- 5 SÍNTESE DA IMPLEMENTAÇÃO POR COMPONENTE

ANEXOS

ANEXO I. LISTAGEM DE PROJETOS APROVADOS A BENEFICIÁRIOS DIRETOS

ANEXO II. LISTAGEM DE PROJETOS APROVADOS A BENEFICIÁRIOS FINAIS




PRR

Plano de Recuperação
e Resiliência

1

O Plano de Recuperação e Resiliência

1. O Plano de Recuperação e Resiliência

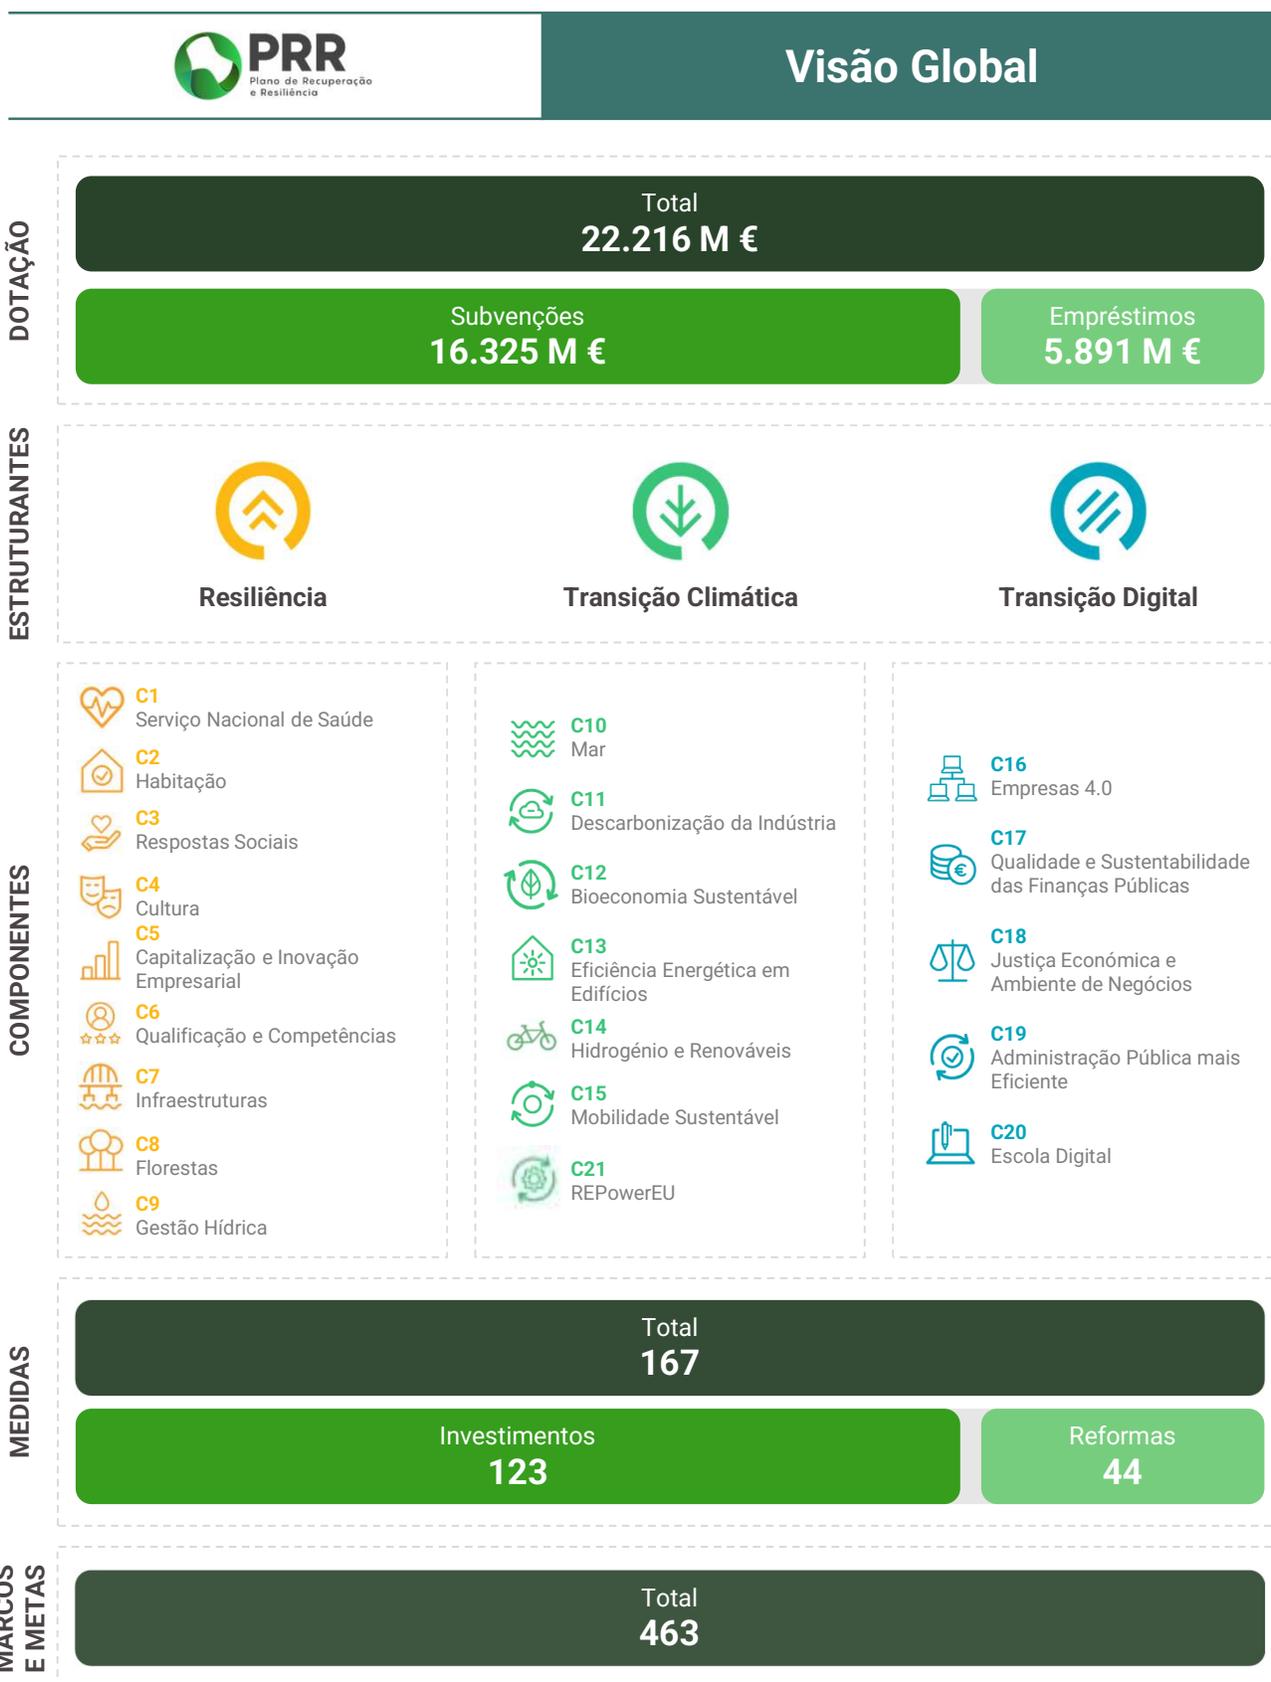

1. O Plano de Recuperação e Resiliência



PRR
Plano de Recuperação e Resiliência

Reprogramação



	INICIAL		ATUALIZAÇÃO
RESILIÊNCIA			
1.383 M €	C1. Serviço Nacional de Saúde		1.739 M €
2.733 M €	C2. Habitação		3.229 M €
833 M €	C3. Respostas Sociais		1.043 M €
243 M €	C4. Cultura		319 M €
2.914 M €	C5. Capitalização e Inovação Empresarial		4.915 M €
1.324 M €	C6. Qualificações e Competências		1.979 M €
690 M €	C7. Infraestruturas		813 M €
615 M €	C8. Florestas		615 M €
390 M €	C9. Gestão Hídrica		461 M €
11.125 M €			15.113 M €
TRANSIÇÃO CLIMÁTICA			
252 M €	C10. Mar		393 M €
715 M €	C11. Descarbonização da Indústria		737 M €
145 M €	C12. Bioeconomia Sustentável		145 M €
610 M €	C13. Eficiência Energética em Edifícios		610 M €
370 M €	C14. Hidrogénio e Renováveis		385 M €
967 M €	C15. Mobilidade Sustentável		1.262 M €
n.a. ¹	C21. REPowerEU		855 M €
3.059 M €			4.388 M €
TRANSIÇÃO DIGITAL			
650 M €	C16. Empresas 4.0		763 M €
406 M €	C17. Qualidade e Sustent. Finanças Públicas		406 M €
267 M €	C18. Justiça Económica e Ambiente de Negócios		267 M €
578 M €	C19. Administração Pública Mais Eficiente		675 M €
559 M €	C20. Escola Digital		605 M €
2.460 M €			2.716 M €
16.644 M €			22.216 M €

¹ Esta componente não estava prevista no PRR inicial.

Estes valores poderão ser sujeitos a pequenos ajustes no âmbito da contratação entre a Estrutura de Missão "Recuperar Portugal" e os Beneficiários Diretos e Intermediários.



PRR

Plano de Recuperação
e Resiliência

2

**Progresso geral a 30 de
setembro de 2024**

2. Progresso geral a 30 de setembro de 2024



Dados a 30 de setembro de 2024



PRR

Plano de Recuperação
e Resiliência

3

Síntese da implementação financeira

3. Síntese da implementação financeira

Em 2023, foi submetida e aprovada a reprogramação do PRR, passando este a ter uma dotação de 22.216 milhões de euros.

Durante o 3º trimestre de 2024, foram lançados 651 milhões de euros em Avisos e Anúncios. Durante o trimestre foram também aprovados 1.377 milhões de euros e pagos 733 milhões de euros a Beneficiários Diretos e Finais.

Desta forma, até 30 de setembro de 2024, tinham sido lançados Avisos de Abertura de Candidaturas no total de 16.032 milhões de euros (72% da dotação do PRR) e Procedimentos de Contratação Pública no total de 3.743 milhões de euros (17% da dotação do PRR). O montante lançado em Avisos e Anúncios ascendia no final do trimestre a 19.775 milhões de euros, correspondendo a 89% da dotação do PRR e representando um aumento de 3 pontos percentuais face ao final do 2º trimestre (esta variação é calculada tendo por base a dotação do PRR).

Já o montante de projetos aprovados a Beneficiários Diretos e Finais que totalizava, no final do 3º trimestre de 2024, 19.758 milhões de euros (89% da dotação do PRR), representa um aumento de 6 pontos percentuais face ao 2º trimestre de 2024 (novamente, trata-se da variação calculada com base na dotação).

Os montantes pagos a Beneficiários Diretos e Finais ascendiam a 5.364 milhões de euros, o correspondente a 24% da dotação do PRR, e representando um aumento de 3 pontos percentuais face ao 2º trimestre de 2024.

Figura 1: Evolução da Implementação Financeira até ao 3º trimestre de 2024



Os valores percentuais bem como as respetivas variações em pontos percentuais foram calculados tendo por base a dotação do PRR de 22.216 M € e estão arredondados à unidade.

3. Síntese da implementação financeira


A 30 de setembro de 2024, as três dimensões estruturantes do PRR - Resiliência, Transição Climática e Transição Digital - encontravam-se com os níveis de implementação financeira representados na figura 2.

Na dimensão Resiliência tinham sido lançados 12.584 milhões de euros em Avisos e Anúncios (83% da dotação da dimensão estruturante). O montante aprovado ascendia a 13.796 milhões de euros (91% da dotação da dimensão estruturante) e o montante pago a Beneficiários Diretos e Finais ascendia a 3.681 milhões de euros (24% da dotação da dimensão estruturante).

Na dimensão Transição Climática, o montante lançado em Avisos e Anúncios atingiu os 4.773 milhões de euros no final do trimestre (109% da dotação da dimensão estruturante). O montante aprovado a Beneficiários Diretos e Finais ascendia a 3.523 milhões de euros (80% da dotação da dimensão estruturante), e o montante pago aos mesmos atingiu os 866 milhões de euros (20% da dotação da dimensão estruturante).

Na dimensão Transição Digital, foram lançados até ao final do semestre 2.418 milhões de euros (89% da dotação da dimensão estruturante), tendo sido aprovados 2.439 milhões de euros (90% da dotação da dimensão estruturante) e pagos a Beneficiários Diretos e Finais 817 milhões de euros (30% da dotação da dimensão estruturante).


Figura 2: Implementação Financeira por Dimensão Estruturante a 30.09.2024 (milhões de euros)

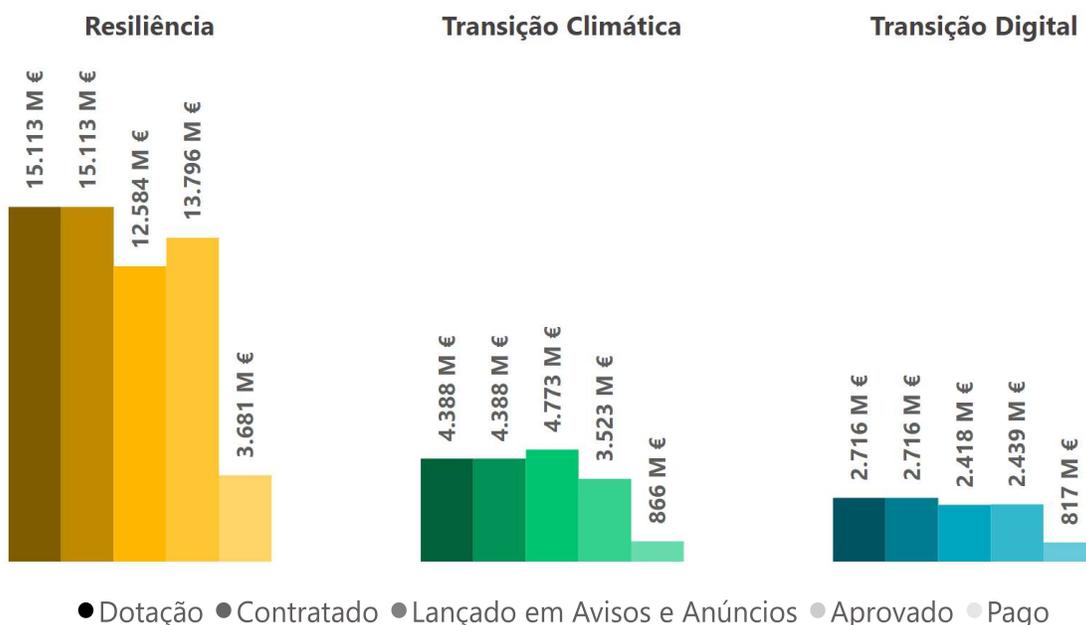

3. Síntese da implementação financeira

A figura 3 mostra os montantes contratados entre a EMRP e os Beneficiários Diretos e Intermédios, e os montantes aprovados e pagos a Beneficiários Diretos e Finais, em cada uma das 21 componentes do PRR, a 30 de setembro de 2024.

Figura 3: Implementação Financeira por Componente a 30.09.2024 (milhões de euros)

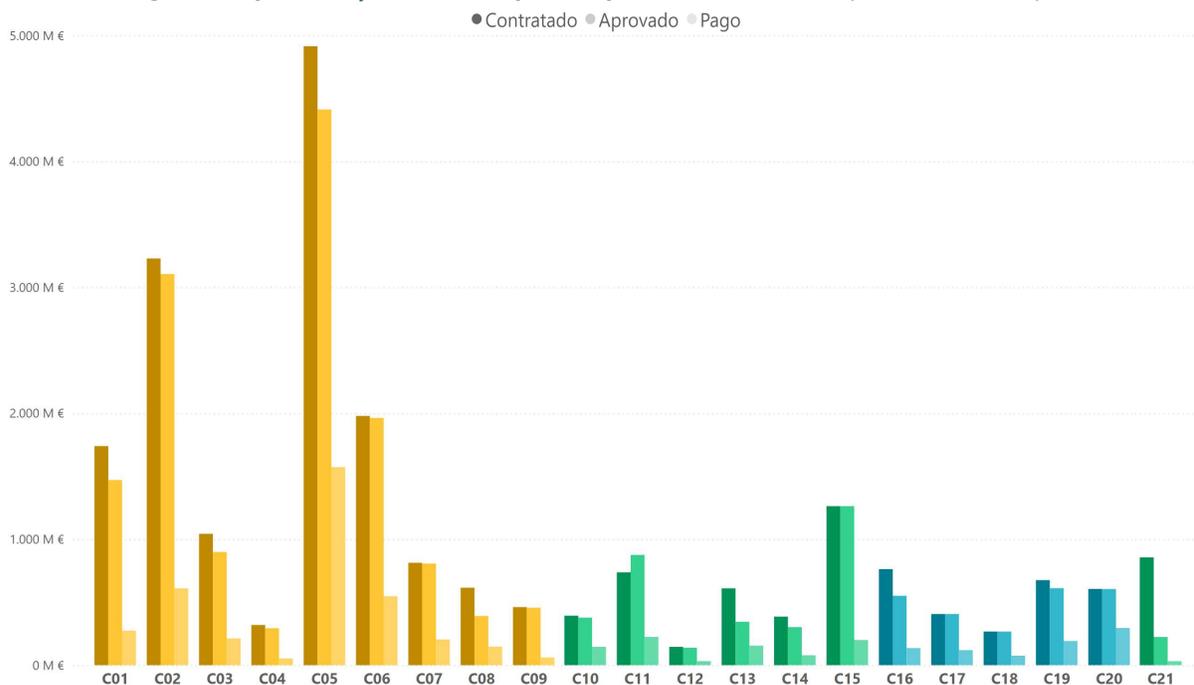

A tabela 1 apresenta a divisão previsional por tipo de Beneficiário Direto e Final da dotação lançada em avisos e procedimentos de contratação pública. Apresenta também os respetivos montantes aprovados e pagos por tipo de Beneficiário Direto ou Final.

Tabela 1: Implementação Financeira por tipologia de Beneficiário a 30.09.2024

TIPO DE BENEFICIÁRIO	Concursos Públicos	Avisos		Beneficiários Diretos e Finais		
	LANÇADOS (€) ¹	DOTAÇÃO (€) ²	CANDIDATURAS SUBMETIDAS	CANDIDATURAS APROVADAS	APROVADO (M€)	PAGO (M€)
Famílias		1.758 M €	265.127	139.157	220 M €	176 M €
Instituições da Economia Solidária e Social		1.191 M €	8.815	5.005	523 M €	140 M €
Empresas		5.398 M €	63.841	40.644	5.872 M €	1.968 M €
Instituições do Sistema Científico e Tecnológico		522 M €	1.004	255	393 M €	123 M €
Instituições de Ensino Superior		733 M €	2.520	338	777 M €	233 M €
Escolas	282 M €	856 M €	1.749	1.125	681 M €	345 M €
Autarquias e Áreas Metropolitanas	83 M €	1.694 M €	6.076	3.737	3.295 M €	534 M €
Entidades Públicas	1.284 M €	2.599 M €	2.043	1.462	5.144 M €	1.296 M €
Empresas Públicas	2.094 M €	1.280 M €	292	237	2.853 M €	549 M €
Total	3.743 M €	16.032 M €	351.467	191.960	19.758 M €	5.364 M €

¹ Procedimentos de Contratação Pública lançados por Beneficiários Diretos.

² Dotação sujeita a alterações no âmbito da contratação em curso entre a Recuperar Portugal e os Beneficiários Intermediários e Diretos.

3. Síntese da implementação financeira

A distribuição dos valores aprovados e pagos a Beneficiários Diretos e a Beneficiários Finais, em cada uma das regiões NUTS III de Portugal e nos projetos de cobertura nacional, é apresentada na tabela 2, bem como a sua distribuição relativa por habitante. A 30 de setembro de 2024, tinha sido aprovado um montante equivalente a 1.910 euros por habitante no território nacional, e pago um montante equivalente a 519 euros por habitante.

Tabela 2: Implementação Financeira por região NUTS III e per capita, a 30.09.2024

NUT III	Beneficiários Diretos e Finais		Por habitante	
	APROVADO (M€)	PAGO (€)	APROVADO (€/HABITANTE)	PAGO (€/HABITANTE)
Projetos Nacionais	4.257 M €	1.293 M €	412 €	125 €
Alto Minho	235 M €	64 M €	1.018 €	279 €
Cávado	577 M €	161 M €	1.386 €	385 €
Ave	477 M €	160 M €	1.141 €	382 €
Área Metropolitana do Porto	2.723 M €	781 M €	1.569 €	450 €
Alto Tâmega	72 M €	16 M €	851 €	195 €
Tâmega e Sousa	409 M €	118 M €	1.002 €	288 €
Douro	267 M €	54 M €	1.455 €	296 €
Terras de Trás-os-Montes	149 M €	40 M €	1.393 €	374 €
Região de Aveiro	776 M €	216 M €	2.111 €	587 €
Região de Coimbra	701 M €	172 M €	1.604 €	394 €
Região de Leiria	397 M €	127 M €	1.384 €	442 €
Viseu Dão Lafões	332 M €	101 M €	1.314 €	398 €
Beira Baixa	105 M €	22 M €	1.296 €	276 €
Beiras e Serra da Estrela	228 M €	61 M €	1.084 €	288 €
Oeste	241 M €	71 M €	664 €	194 €
Médio Tejo	245 M €	80 M €	1.070 €	348 €
Lezíria do Tejo	193 M €	48 M €	819 €	204 €
Área Metropolitana de Lisboa	4.359 M €	1.087 M €	1.519 €	379 €
Alentejo Litoral	208 M €	48 M €	2.159 €	498 €
Baixo Alentejo	253 M €	49 M €	2.200 €	427 €
Alto Alentejo	290 M €	50 M €	2.763 €	479 €
Alentejo Central	179 M €	47 M €	1.174 €	309 €
Algarve	518 M €	117 M €	1.109 €	250 €
Região Autónoma dos Açores	812 M €	248 M €	3.436 €	1.049 €
Região Autónoma da Madeira	753 M €	135 M €	3.003 €	537 €
Total	19.758 M €	5.364 M €	1.910 €	519 €

3. Síntese da implementação financeira

FLUXOS DE TESOURARIA

A 3 de agosto de 2021, Portugal recebeu o adiantamento de 13% dos fundos do PRR, nos termos do disposto no artigo 13º do Regulamento (EU) 2021/241 do Parlamento Europeu e do Conselho e no seguimento da assinatura dos acordos de financiamento e de empréstimos. O pré-financiamento correspondeu a um valor total de 2.159 milhões de euros, sendo 1.808 milhões de euros relativos a subvenções e 351 milhões de euros relativos a empréstimos.

O desembolso dos fundos do PRR contratados com a Comissão Europeia depende do processo de avaliação do cumprimento de marcos e metas, estando prevista a submissão de 10 pedidos de pagamento até 2026, dos quais 4 foram já submetidos.

O primeiro Pedido de Pagamento foi submetido a 25 de janeiro de 2022, no total de 1.336 milhões de euros, dos quais 636 milhões de euros respeitantes a subvenções e 700 milhões de euros de empréstimos, que, deduzidos do correspondente valor do pré-financiamento de 13%, se traduziu no pagamento líquido, a 9 de maio de 2022, de 1.162 milhões de euros (553 milhões de euros de subvenções, e 609 milhões de euros de empréstimos).


O segundo Pedido de Pagamento foi formalizado a 30 de setembro de 2022, no total de 2.092 milhões de euros, tendo recebido avaliação positiva da Comissão Europeia a 16 de dezembro. Após a dedução respetiva do adiantamento, este Pedido de Pagamento traduziu-se no recebimento líquido de 1.820 milhões de euros, dos quais 1.711 milhões de euros relativos a subvenções e 109 milhões de euros relativos a empréstimos. Com o desembolso do 2.º Pedido de Pagamento, que viria a ser realizado a 8 de fevereiro de 2023, Portugal já recebeu 5.141 milhões de euros, correspondente a cerca de 31% da dotação orçamental global do PRR inicialmente contratada com a Comissão Europeia.

Os terceiro e quarto Pedidos de Pagamento foram formalizados a 4 de outubro de 2023, no total de 3.562 milhões de euros, dos quais 2.947 milhões de euros respeitantes a subvenções e 615 milhões de euros de empréstimos, que, deduzidos do correspondente valor do pré-financiamento de 13%, e do valor suspenso, se traduziu no recebimento líquido, a 28 de dezembro de 2023, de 2.460 milhões de euros, dos quais 1.875 milhões de euros respeitantes a subvenções e 585 milhões de euros de empréstimos. O pedido de levantamento da suspensão recebeu uma avaliação preliminar positiva da Comissão a 24 de junho, resultando no desembolso do valor suspenso de 714 milhões, no início de agosto.

O quinto Pedido de Pagamento foi formalizado a 3 de julho de 2024, no total de 3.191 milhões de euros, dos quais 1.878 milhões de euros respeitantes a subvenções e 1.313 milhões de euros de empréstimos, que deduzidos do correspondente valor de pré-financiamento se traduz no valor líquido de 2.903 milhões de euros, 1.653 milhões de euros em subvenções e 1.250 milhões de euros em empréstimos. A avaliação preliminar positiva foi aprovada pela Comissão já após a data de fecho deste relatório, a 26 de novembro.


3. Síntese da implementação financeira

Figura 4: Cronograma de Pedidos de Pagamento e Desembolsos

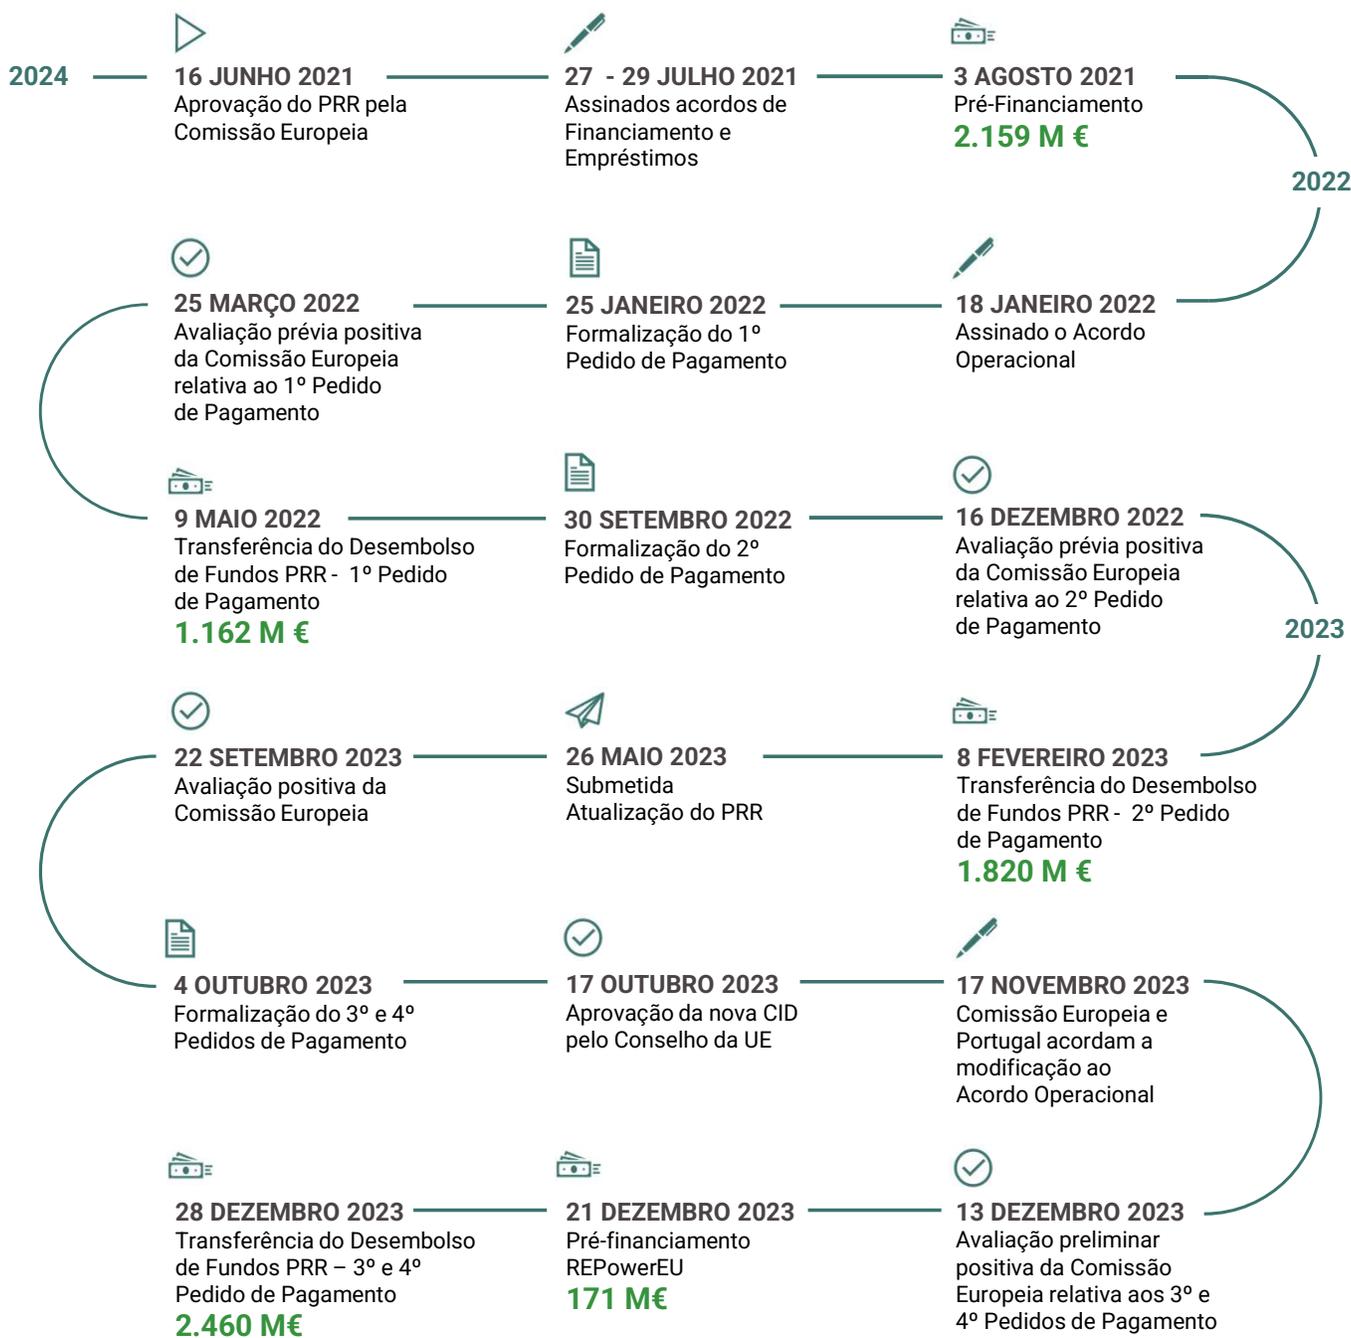

3. Síntese da implementação financeira

Figura 4: (Cont.) Cronograma de Pedidos de Pagamento e Desembolsos

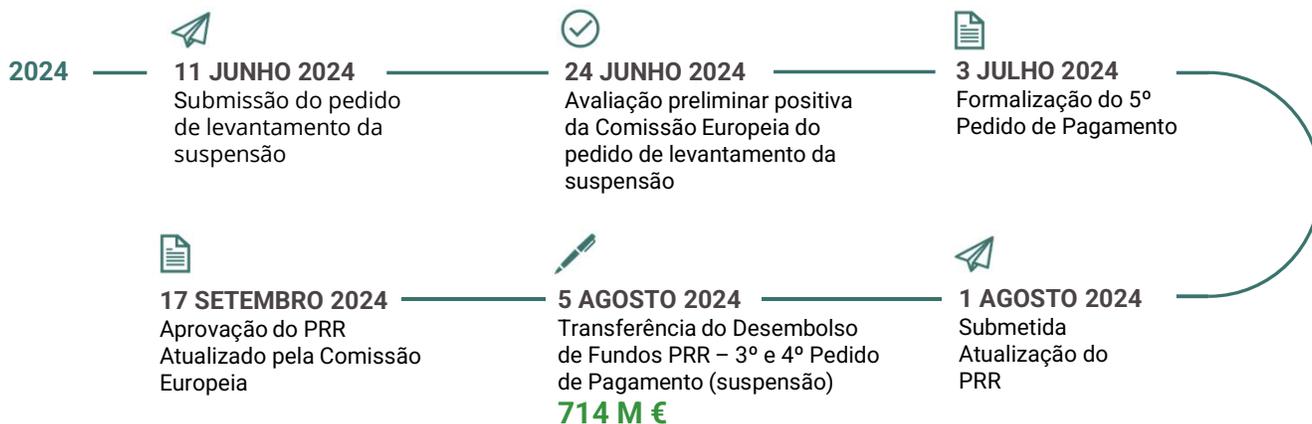

3. Síntese da implementação financeira

A figura 5 representa a distribuição dos valores recebidos da Comissão Europeia pelos Beneficiários Diretos, Intermediários e Finais ao longo da execução do PRR até ao final do 3º trimestre de 2024. De acordo com o Decreto-Lei n.º 29-B/2021, de 4 de maio, a Recuperar Portugal emite ordens de pagamento e a AD&C processa os pagamentos a Beneficiários Diretos e Intermediários. Os Beneficiários Intermediários, por sua vez, fazem pagamentos aos Beneficiários Finais, após seleção e contratação com os mesmos.

A 30 de setembro de 2024, tinham sido pagos 1.389 milhões de euros a Beneficiários Diretos. O montante total transferido a Beneficiários Intermediários ascendia a 5.619 milhões de euros, dos quais 3.975 milhões de euros foram já pagos a Beneficiários Finais e 1.644 milhões de euros encontram-se em trânsito.

Figura 5: Fluxos de Tesouraria do PRR a 30.09.2024





PRR

Plano de Recuperação
e Resiliência

4

Síntese da Implementação por Dimensão Estruturante

4. Síntese da Implementação por Dimensão Estruturante




I - Resiliência




15.113 M €
Dotação orçamental

A dimensão da Resiliência visa reforçar a resiliência social, económica e territorial do país através de 9 componentes estratégicas, incluindo intervenções na saúde, habitação, respostas sociais, cultura, investimento empresarial, competências e qualificações, infraestruturas, florestas e gestão da água. Esta dimensão representa a maior parte do investimento total do PRR para a promoção de uma recuperação transformadora, duradoura, justa, sustentável e inclusiva.

Síntese da Implementação da Dimensão I – Resiliência a 30.09.2024

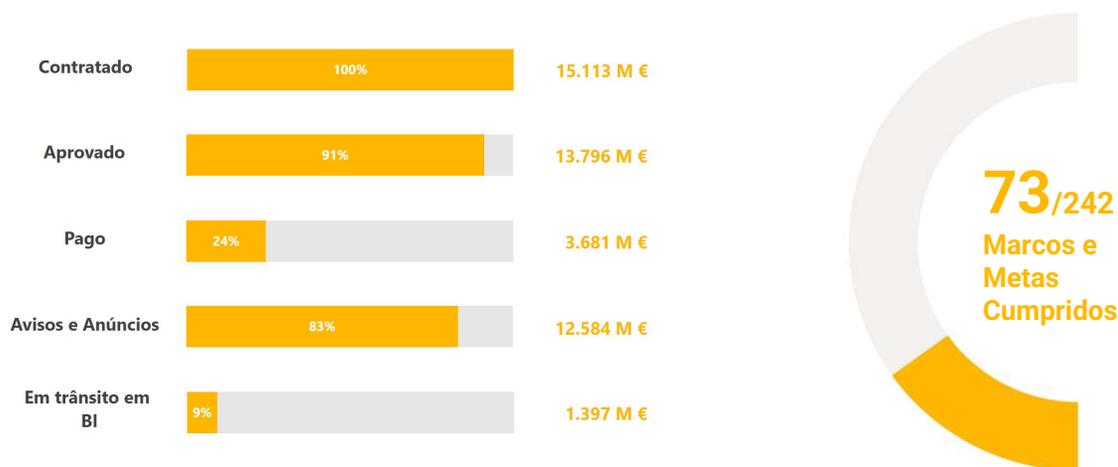

Evolução da Implementação Financeira até ao 3º trimestre de 2024

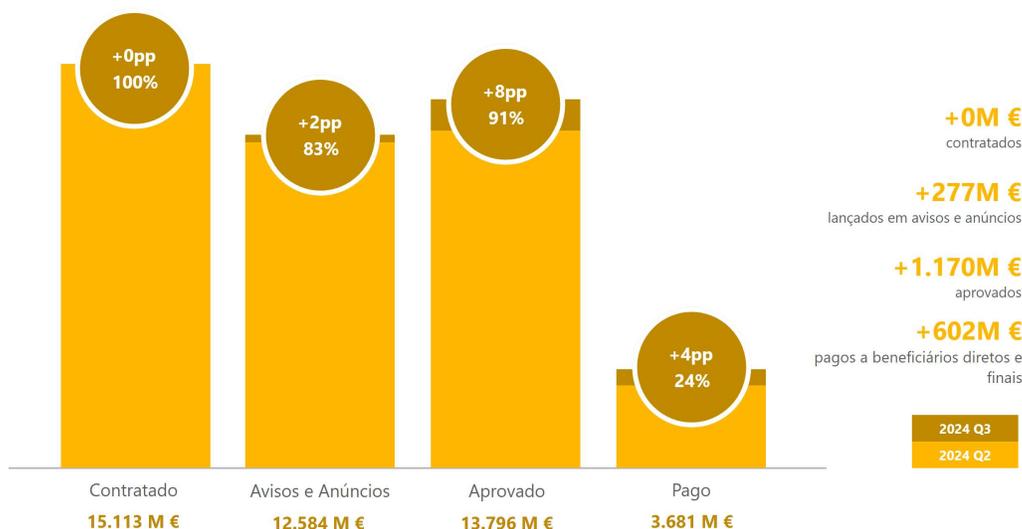

Os valores percentuais bem como as respetivas variações em pontos percentuais foram calculados tendo por base a dotação do PRR de 22.216 M €.

4. Síntese da Implementação por Dimensão Estruturante




II - Transição Climática




4.388 M €
Dotação orçamental

A Transição Climática compreende 7 componentes estratégicos, incluindo intervenções em áreas como o mar, mobilidade sustentável, descarbonização da indústria, bioeconomia, eficiência energética em edifícios, e energias renováveis. Constitui um compromisso para o cumprimento das metas climáticas que permitirá a Portugal atingir a neutralidade carbónica até 2050, apresentando ao país oportunidades significativas para os fatores competitivos do futuro.

Síntese da Implementação da Dimensão II – Transição Climática a 30.09.2024

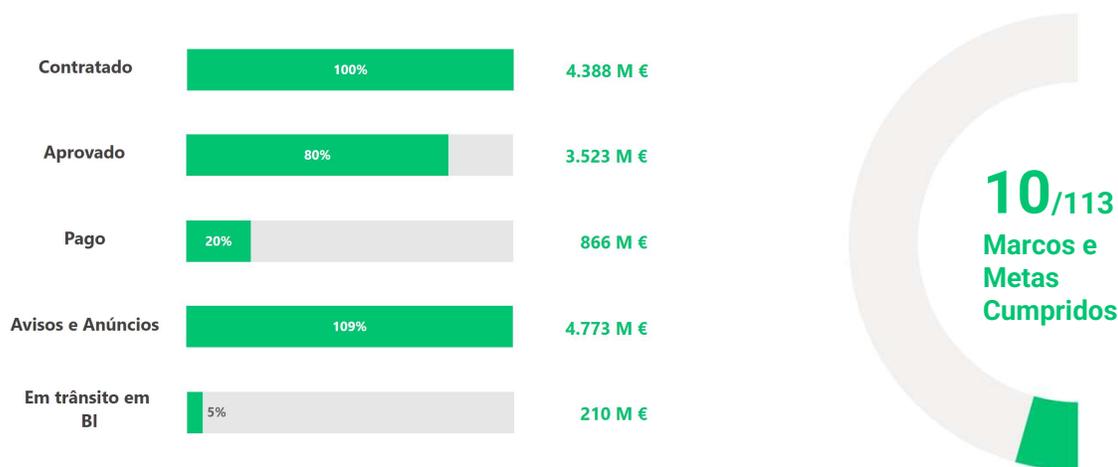

Evolução da Implementação Financeira até ao 3º trimestre de 2024

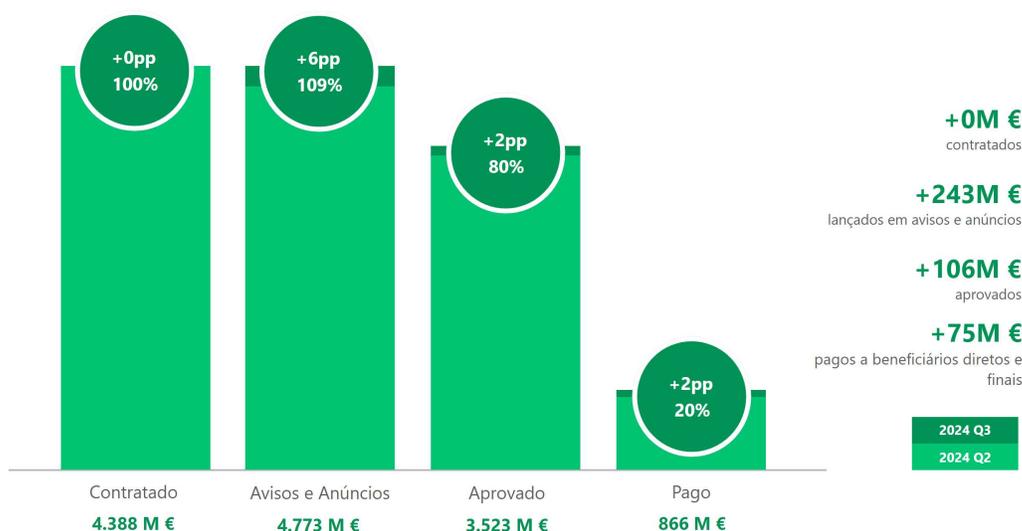

Os valores percentuais bem como as respetivas variações em pontos percentuais foram calculados tendo por base a dotação do PRR de 22.216 M €.

4. Síntese da Implementação por Dimensão Estruturante




III - Transição Digital




2.716 M €
Dotação orçamental

A Transição Digital descreve 5 componentes para acelerar a transição de Portugal para uma sociedade mais digital, incluindo a capacitação e inclusão digital das pessoas através da educação, formação em competências digitais e promoção da literacia digital, transformação digital do setor empresarial e digitalização do Estado.

Síntese da Implementação da Dimensão III – Transição Digital a 30.09.2024

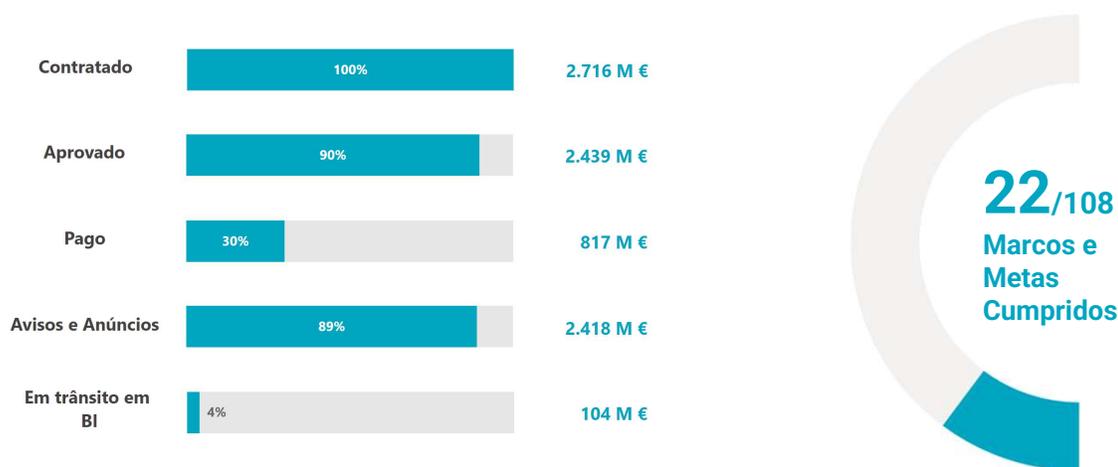

Evolução da Implementação Financeira até ao 3º trimestre de 2024

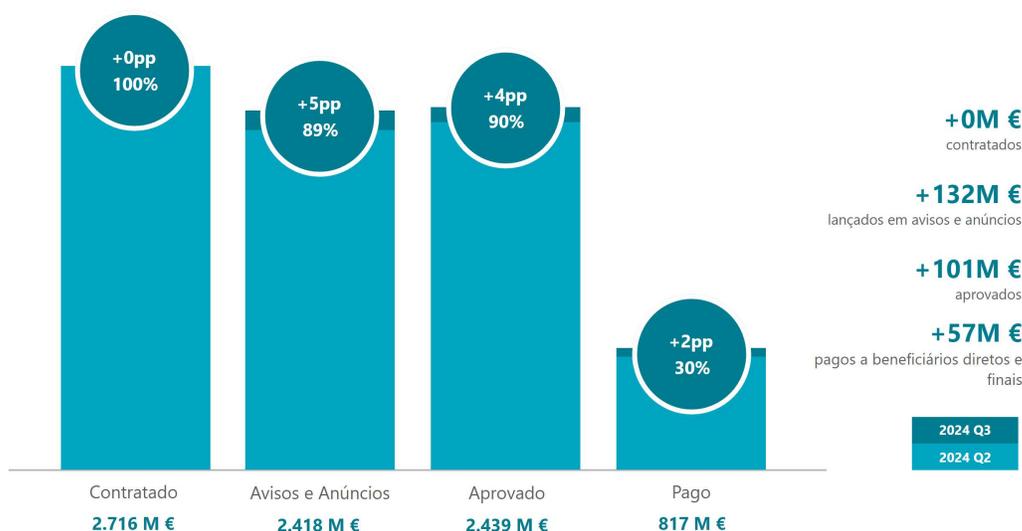

Os valores percentuais bem como as respetivas variações em pontos percentuais foram calculados tendo por base a dotação do PRR de 22.216 M €.



PRR

Plano de Recuperação
e Resiliência

5

Síntese da Implementação por Componente


5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C01
Serviço Nacional de Saúde

1.739 M €
Dotação orçamental

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 30.09.2024

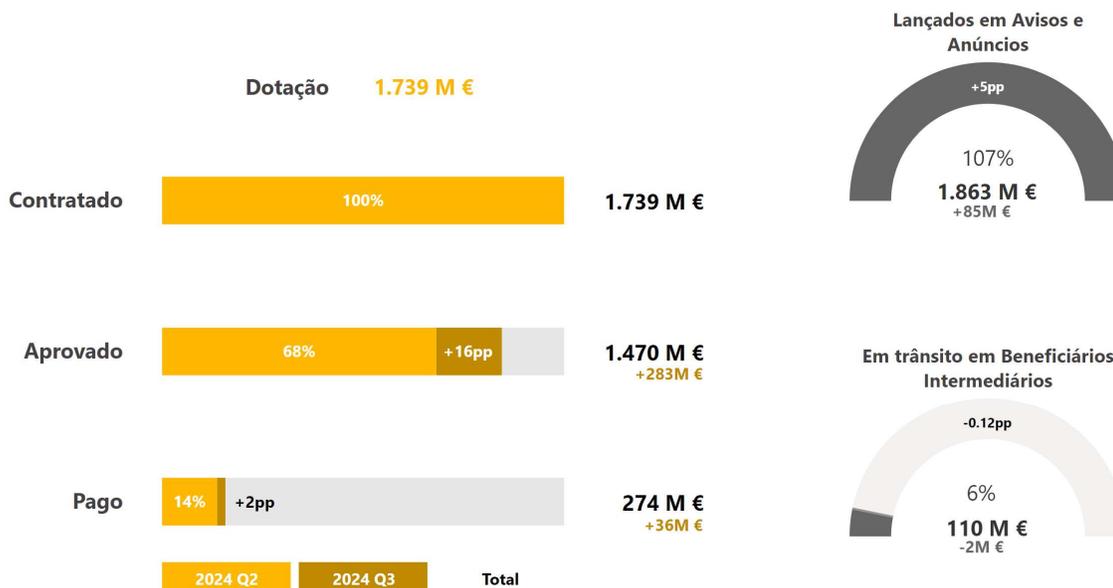

Reformas

CÓDIGO	REFORMA	ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO A 30.09.2024
C01-r01	Reforma dos cuidados de saúde primários	Em fase avançada de implementação
C01-r02	Reforma no domínio da saúde mental	Concretizada
C01-r03	Conclusão da reforma do modelo de governação dos hospitais públicos	Em fase de implementação

5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C01 Serviço Nacional de Saúde

1.739 M €
Dotação orçamental

Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 30.09.2024	PAGO A 30.09.2024
C01-i01	Cuidados de Saúde Primários com mais respostas Responsável: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE I.P.	683 M €	68%	12%
C01-i02	Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e Rede Nacional de Cuidados Paliativos Responsável: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE I.P.	235 M €	124%	24%
C01-i03	Conclusão da Reforma de Saúde Mental e implementação da Estratégia para as Demências Responsável: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE I.P.	88 M €	70%	20%
C01-i04	Construção do Hospital de Lisboa Oriental e Equipamento para Hospitais em Lisboa e Vale do Tejo Responsável: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE I.P.	180 M €	72%	15%
C01-i05.01-RAM	Expansão, Desenvolvimento e Melhoria da Rede de Cuidados Continuados Integrados Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM	60 M €	100%	13%
C01-i05.02-RAM	Reforço das respostas na área da saúde mental e das demências associadas ao envelhecimento Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM	39 M €	100%	17%
C01-i06	Transição Digital na Saúde Responsável: SPMS - SERVIÇOS PARTILHADOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, E.P.E.	300 M €	100%	20%
C01-i07.01-RAM	Digitalização da Saúde na RAM-IASAUDE Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM	4 M €	100%	19%
C01-i07.02-RAM	Digitalização da Saúde na RAM-SESARAM Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM	11 M €	100%	18%
C01-i07.03-RAM	Digitalização da Saúde na RAM-DRS Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM	1 M €	100%	13%
C01-i08-RAA	Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores Responsável: DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FUNDOS ESTRUTURAIS	30 M €	100%	43%
C01-i09	Sistema Universal de Apoio à Vida Ativa Responsável: INSTITUTO PORTUGUÊS DO DESPORTO E JUVENTUDE, I.P.	10 M €	100%	35%
C01-i10	Programa de Modernização Tecnológica do SNS Responsável: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE I.P.	100 M €	71%	0%

5. Síntese da Implementação por Componente

COMPONENTE C02

Habitação

3.229 M €

Dotação orçamental

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 30.09.2024



Reformas

CÓDIGO	REFORMA	ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO A 30.09.2024
C02-r04	Plano Nacional de Alojamento Urgente e Temporário	● Concretizada

Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 30.09.2024	PAGO A 30.09.2024
C02-i01	Programa de apoio ao acesso à habitação Responsável: INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, I.P.	1.210 M €	115%	25%
C02-i02	Bolsa nacional de alojamento urgente e temporário Responsável: INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, I.P.	203 M €	46%	11%
C02-i03-RAM	Reforço da oferta de habitação apoiada na Região Autónoma da Madeira Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM	136 M €	100%	14%
C02-i04-RAA	Aumentar as condições habitacionais do parque habitacional da Região Autónoma dos Açores Responsável: DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FUNDOS ESTRUTURAIS	44 M €	137%	36%
C02-i05	Parque público de habitação a custos acessíveis Responsável: INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, I.P.	900 M €	88%	12%
C02-i06	Alojamento Estudantil a custos acessíveis Responsável: AGÊNCIA NACIONAL PARA A GESTÃO DO PROGRAMA ERASMUS+ EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	516 M €	93%	27%
C02-i07-RAA	Infraestruturas para parcelas de terreno destinadas à habitação Responsável: DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FUNDOS ESTRUTURAIS	4 M €	100%	20%
C02-i08-RAA	Reforço do parque habitacional social Responsável: DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FUNDOS ESTRUTURAIS	19 M €	100%	20%
C02-i09	Programa de apoio ao acesso à habitação (empréstimo) Responsável: INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, I.P.	197 M €	66%	0%


5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C03 Respostas Sociais

1.043 M €
Dotação orçamental

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 30.09.2024

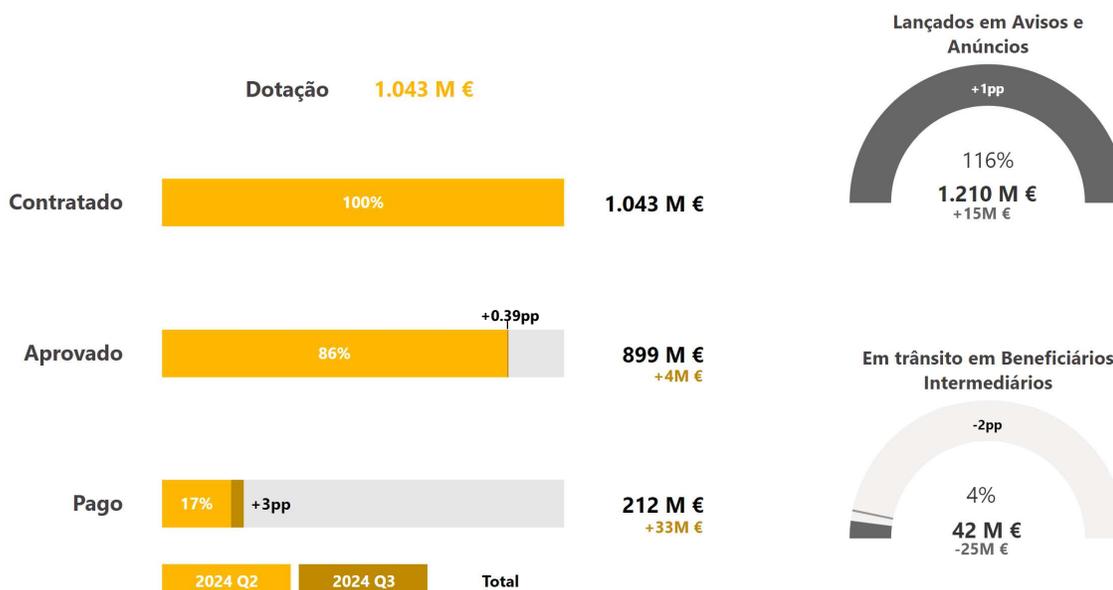

Reformas

CÓDIGO	REFORMA	ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO A 30.09.2024
C03-r05	Reforma da provisão de equipamentos e respostas sociais	● Concretizada
C03-r06	Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência 2021-2025	● Concretizada
C03-r07	Contratualização de programas integrados de apoio às comunidades desfavorecidas nas áreas metropolitanas	● Concretizada
C03-r08	Estratégia Nacional de Combate à Pobreza	● Concretizada
C03-r38	Simplificação e eficácia do sistema de segurança social	◐ Em fase de implementação

5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C03 Respostas Sociais

1.043 M €
Dotação orçamental

Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 30.09.2024	PAGO A 30.09.2024
C03-i01	Nova Geração de Equipamentos e Respostas Sociais Responsável: INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	591 M €	83%	23%
C03-i02	Acessibilidades 360º Responsável: INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇÃO, I.P.	53 M €	43%	8%
C03-i03-RAM	Fortalecimento das respostas sociais na Região Autónoma da Madeira (RAM) Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM	95 M €	87%	13%
C03-i04-RAA	Implementar a Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social - Redes de Apoio Social (RAA) Responsável: DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FUNDOS ESTRUTURAIIS	40 M €	100%	40%
C03-i05	Plataforma +Acesso Responsável: INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇÃO, I.P.	3 M €	100%	28%
C03-i06.01	Operações Integradas em Comunidades Desfavorecidas nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto – Programa Bairros Saudáveis Responsável: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE I.P.	7 M €	98%	69%
C03-i06.02	Operações Integradas em Comunidades Desfavorecidas na Área Metropolitana de Lisboa Responsável: ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA	122 M €	100%	20%
C03-i06.03	Operações Integradas em Comunidades Desfavorecidas na Área Metropolitana do Porto Responsável: ÁREA METROPOLITANA DO PORTO	122 M €	100%	9%
C03-i07-RAA	Modernização e expansão da rede de estruturas residenciais para pessoas idosas (ERPI) Responsável: DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FUNDOS ESTRUTURAIIS	11 M €	100%	25%


5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C04 Cultura

319 M €
Dotação orçamental

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 30.09.2024

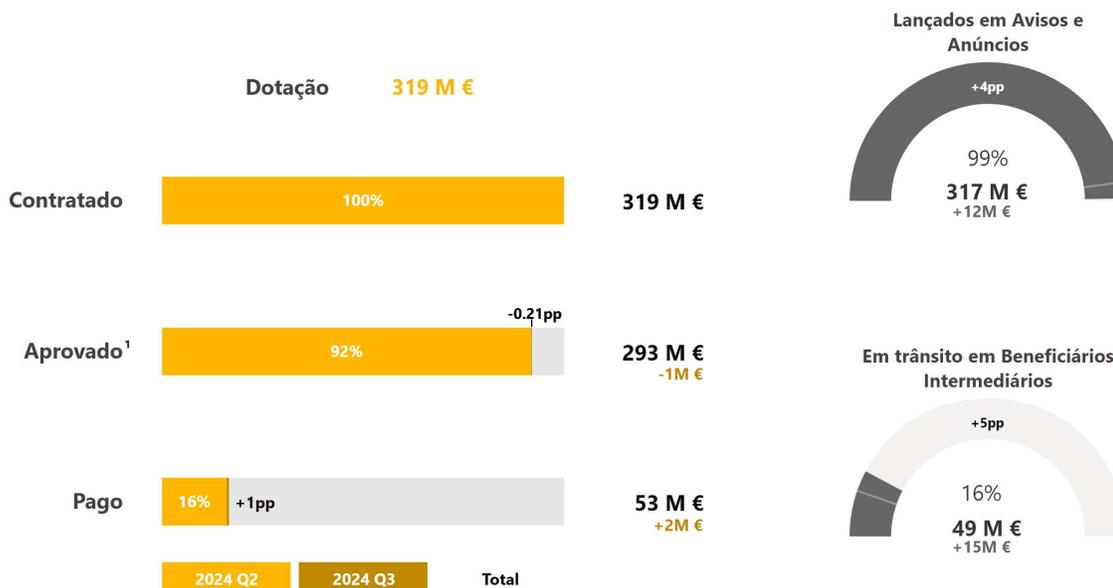

Reformas

Não existem reformas associadas a esta componente.

Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 30.09.2024	PAGO A 30.09.2024
C04-i01	Redes Culturais e Transição Digital Responsável: GABINETE DE ESTRATÉGIA, PLANEAMENTO E AVALIAÇÃO CULTURAI	103 M €	75%	19%
C04-i02	Património Cultural Responsável: FUNDO DE SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO CULTURAL	216 M €	100%	16%

¹Redução decorrente de aditamento ao contrato.

5. Síntese da Implementação por Componente




COMPONENTE C05

Capitalização e Inovação Empresarial

4.915 M €

Dotação orçamental

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 30.09.2024

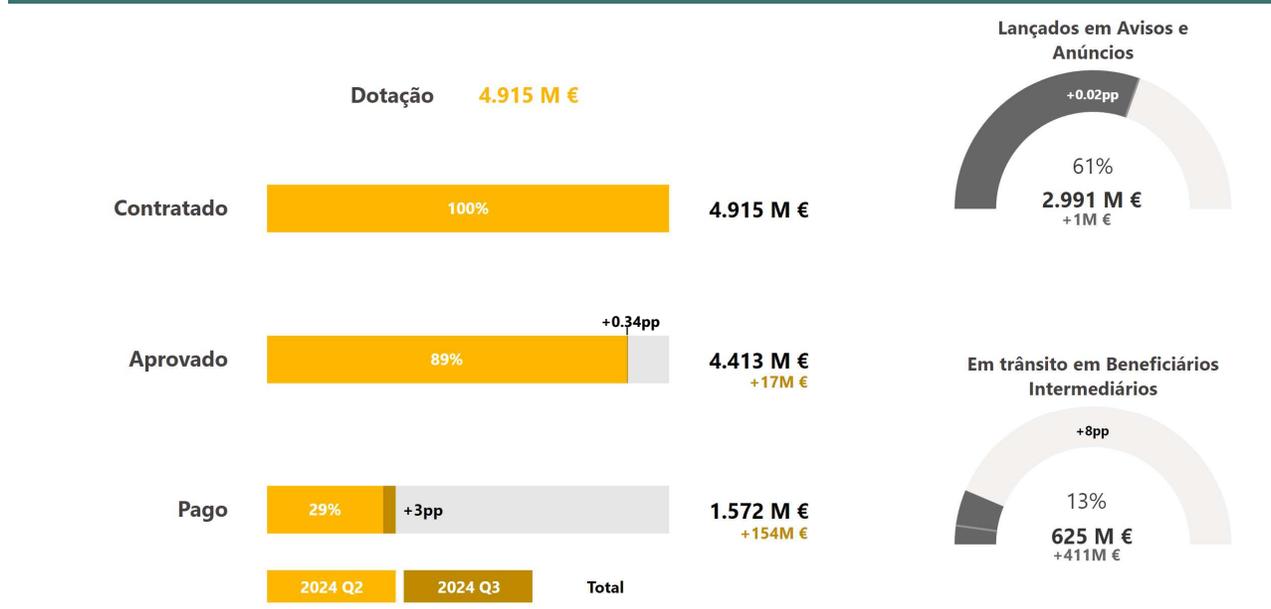

Reformas

CÓDIGO	REFORMA	ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO A 30.09.2024
C05-r09	Promoção da Investigação, Desenvolvimento e Inovação (I&D&I) e do investimento inovador nas empresas	● Concretizada
C05-r10	Criação e desenvolvimento do Banco Português de Fomento	● Concretizada
C05-r11	Alargamento e consolidação da Rede de Instituições de Interface	● Concretizada
C05-r12	Agenda de investigação e inovação para a sustentabilidade da agricultura, alimentação e agroindústria	● Concretizada
C05-r13	Desenvolvimento do mercado de capitais e promoção da capitalização das empresas não-financeiras	● Em fase avançada de implementação

5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C05 Capitalização e Inovação Empresarial

4.915 M €
Dotação orçamental

Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 30.09.2024	PAGO A 30.09.2024
C05-i01.01	Agendas/Alianças mobilizadoras para a Inovação Empresarial Responsável: IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P.	558 M €	223%	77%
C05-i01.02	Agendas/Alianças Verdes para a Inovação Empresarial Responsável: IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P.	372 M €	257%	73%
C05-i02	Missão Interface - renovação da rede de suporte C&T e orientação para o tecido produtivo Responsável: ANI - AGÊNCIA NACIONAL DE INOVAÇÃO, S.A.	186 M €	102%	40%
C05-i03	Agenda de investigação e inovação para a sustentabilidade da agricultura, alimentação e agroindústria Responsável: INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS (IFAP, I.P.)	93 M €	100%	26%
C05-i04-RAA	Recapitalizar Sistema Empresarial dos Açores Responsável: DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FUNDOS ESTRUTURAIIS	125 M €	100%	25%
C05-i05-RAA	Relançamento Económico da Agricultura Açoriana Responsável: DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FUNDOS ESTRUTURAIIS	34 M €	127%	25%
C05-i06.01	Capitalização de empresas e resiliência Financeira Responsável: BANCO PORTUGUÊS DE FOMENTO, S.A.	1.300 M €	71%	20%
C05-i06.02	Capitalização de empresas e resiliência financeira/Banco Português de Fomento Responsável: BANCO PORTUGUÊS DE FOMENTO, S.A.	250 M €	100%	100%
C05-i07-RAM	Instrumentos de capitalização para empresas da Madeira Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM	4 M €		
C05-i08	Ciência Mais Digital Responsável: FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA	48 M €	75%	46%
C05-i09	Reforço: Agendas/Alianças Mobilizadoras para a Inovação Empresarial Responsável: IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P.	319 M €	81%	28%
C05-i10	Reforço: Agendas/Alianças Verdes para a Inovação Empresarial Responsável: IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P.	320 M €	93%	36%
C05-i11	Reforço: Agendas/Alianças Mobilizadoras para a Inovação Empresarial (Empréstimos) Responsável: IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P.	772 M €		
C05-i12	Reforço: Agendas/Alianças Verdes para a Inovação Empresarial (Empréstimos) Responsável: IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P.	533 M €		


5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C06 Qualificação e Competências

1.979 M €
Dotação orçamental

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 30.09.2024

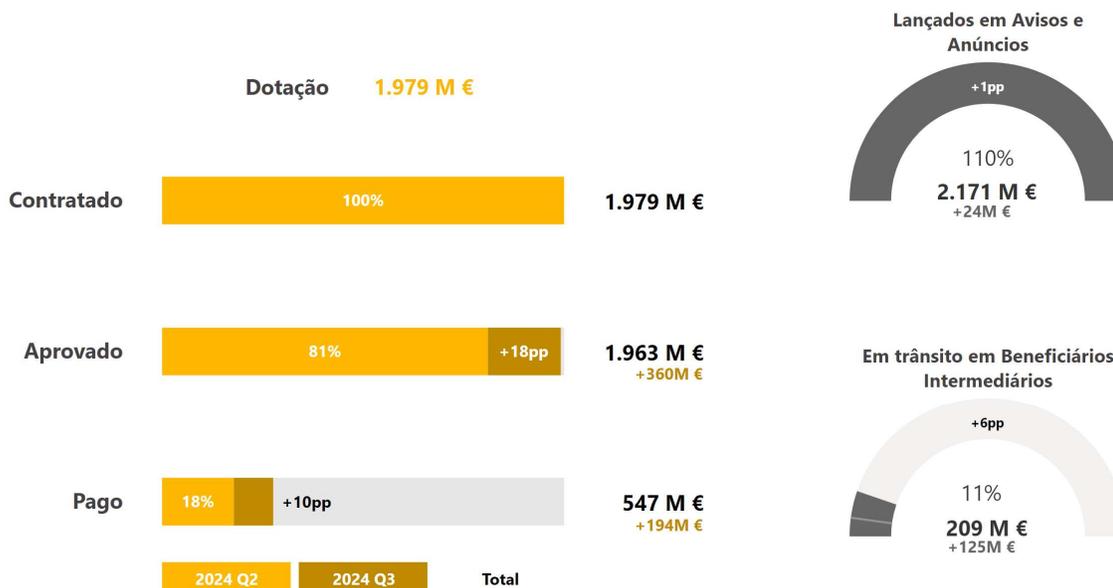

Reformas

CÓDIGO	REFORMA	ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO A 30.09.2024
C06-r14	Reforma do ensino e formação profissionais	Em fase de implementação
C06-r15	Reforma da cooperação entre ensino superior e administração pública e empresas	Concretizada
C06-r16	Redução das restrições nas profissões altamente regulamentadas	Concretizada
C06-r17	Agenda de promoção do trabalho digno	Concretizada
C06-r18	Combate às desigualdades entre mulheres e homens	Em fase de implementação

5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C06 Qualificação e Competências

1.979 M €
Dotação orçamental

Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 30.09.2024	PAGO A 30.09.2024
C06-i01.01	Instalação e/ou modernização dos Centros Tecnológicos Especializados: Responsável: INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO, I.P.	480 M €	90%	23%
C06-i01.02	Modernização da oferta e dos estabelecimentos de ensino e da formação profissional - Modernização da Formação Profissional Responsável: INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P.	230 M €	99%	17%
C06-i01.03	Modernização das instituições de ensino e formação profissionais - Instalação e/ou modernização dos Centros Tecnológicos Especializados - Turismo Responsável: TURISMO DE PORTUGAL I.P.	20 M €	100%	13%
C06-i02	Compromisso Emprego Sustentável Responsável: INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P.	230 M €	155%	84%
C06-i03.01	Incentivo Adultos - Projetos Locais Promotores de Qualificações de Nível B1/B2/B3 Responsável: AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO E O ENSINO PROFISSIONAL, I.P.	40 M €	97%	13%
C06-i03.02	Incentivo Adultos - Acelerador Qualifica Responsável: AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO E O ENSINO PROFISSIONAL, I.P.	55 M €	55%	45%
C06-i03.03	Impulso Adultos Responsável: DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR	138 M €	95%	28%
C06-i04.01	Impulso Jovens STEAM Responsável: DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR	131 M €	93%	33%
C06-i04.02	Impulso Jovens STEAM - Rede Ciência Viva Responsável: CIÊNCIA VIVA - AGÊNCIA NACIONAL PARA A CULTURA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	9 M €	84%	50%
C06-i05-RAA	Qualificação de adultos e aprendizagem ao longo da vida na RAA Responsável: DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FUNDOS ESTRUTURAIS	29 M €	102%	21%
C06-i06	Ciência Mais Capacitação Responsável: FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA	45 M €	7%	1%
C06-i07	Impulso Mais Digital Responsável: DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR	105 M €	100%	30%
C06-i08-RAM	Ampliação do Edifício do CITMA Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM	18 M €	100%	0%
C06-i09.01	Escolas novas ou renovadas - CCDR Norte Responsável: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE, I. P. (CCDR NORTE, I. P.)	125 M €	104%	0%
C06-i09.02	Escolas novas ou renovadas - CCDR Centro Responsável: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO (CCDR CENTRO)	150 M €	100%	0%
C06-i09.03	Escolas novas ou renovadas - CCDR LVT Responsável: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO, I.P. (CCDR LISBOA E VALE DO TEJO, I.P.)	125 M €	97%	29%
C06-i09.04	Escolas novas ou renovadas - CCDR Alentejo Responsável: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, I. P. (CCDR ALENTEJO, I. P.)	20 M €	89%	27%
C06-i09.05	Escolas novas ou renovadas - CCDR Algarve Responsável: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE, I.P. (CCDR ALGARVE, I.P.)	30 M €	86%	26%


5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C07 Infraestruturas

813 M €
Dotação orçamental

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 30.09.2024

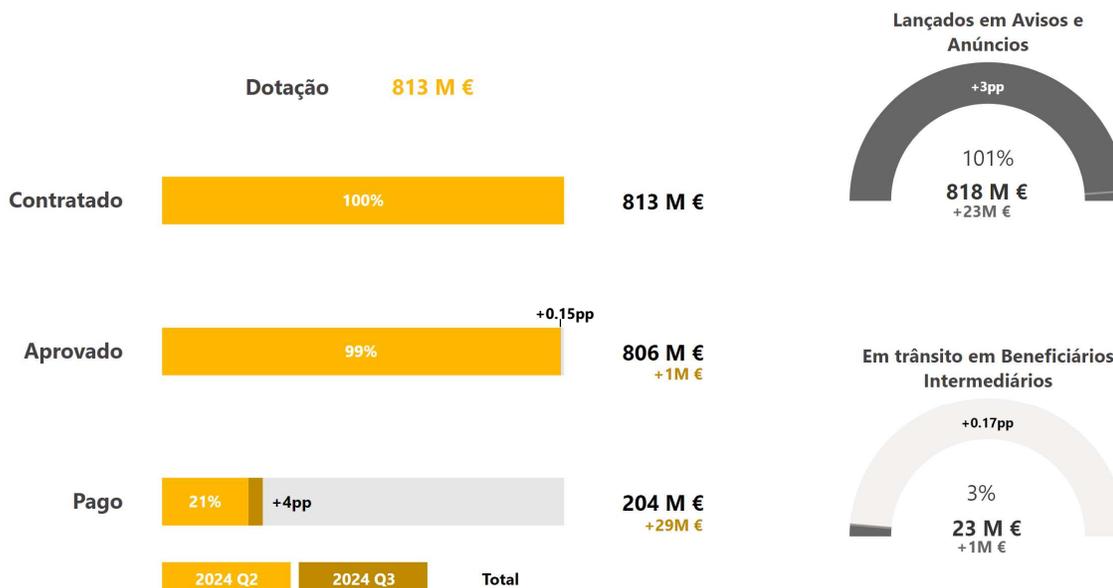

Reformas

Não existem reformas associadas a esta componente.

5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C07 Infraestruturas

813 M €
Dotação orçamental

Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 30.09.2024	PAGO A 30.09.2024
C07-i01.01	Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) Responsável: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE, I. P. (CCDR NORTE, I. P.)	31 M €	100%	7%
C07-i01.02	Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) Responsável: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO (CCDR CENTRO)	32 M €	100%	10%
C07-i01.03	Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) Responsável: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO, I.P. (CCDR LISBOA E VALE DO TEJO, I.P.)	13 M €	100%	1%
C07-i01.04	Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) Responsável: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, I. P. (CCDR ALENTEJO, I. P.)	30 M €	99%	13%
C07-i01.05	Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) Responsável: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE, I.P. (CCDR ALGARVE, I.P.)	4 M €	100%	4%
C07-i02.01	Missing links e Aumento capacidade da Rede - EN14, EN4, IC35, IP2, EN125, EN211, EN344, IC2, IP8 (A26), Baião/Pone Ermida, IP8 (EN121), IP8 (EN259) Responsável: INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.	320 M €	100%	32%
C07-i02.02	Missing links e Aumento capacidade da Rede - Eixo Rodoviário Aveiro – Águeda Responsável: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO (CCDR CENTRO)	47 M €	100%	7%
C07-i03.01	Ligações transfronteiriças - Ponte internacional sobre o Rio Sever Responsável: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, I. P. (CCDR ALENTEJO, I. P.)	11 M €	100%	6%
C07-i03.02	Ligações transfronteiriças - Ponte Alcoutim – Saluncar del Guadiana (ES) Responsável: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE, I.P. (CCDR ALGARVE, I.P.)	11 M €	100%	9%
C07-i03.03	Ligações transfronteiriças - EN103. Vinhais / Bragança (variantes) Responsável: INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.	37 M €	100%	15%
C07-i03.04	Ligações transfronteiriças - Ligação de Bragança a Puebla de Sanabria (ES) Responsável: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE, I. P. (CCDR NORTE, I. P.)	19 M €	100%	10%
C07-i04.01	Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) – Acessibilidades Rodoviárias Responsável: INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.	106 M €	100%	36%
C07-i04.02	Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) – Acessibilidades Rodoviárias - EN10-4. Setúbal/ Mitrena e Ligação da A8 à Área Empresarial das Palhagueiras em Torres Vedras Responsável: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO, I.P. (CCDR LISBOA E VALE DO TEJO, I.P.)	11 M €	100%	17%
C07-i04.03	Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) – Acessibilidades Rodoviárias : Ligação do Parque Empresarial do Casarão ao IC2 Responsável: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO (CCDR CENTRO)	7 M €	100%	13%
C07-i04.04	Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) – Acessibilidades Rodoviárias Responsável: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE, I. P. (CCDR NORTE, I. P.)	42 M €	85%	11%
C07-i04.05	Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) – Acessibilidades Rodoviárias - Rotunda na EN246 para acesso à zona industrial de Portalegre Responsável: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, I. P. (CCDR ALENTEJO, I. P.)	0 M €	100%	84%
C07-i05-RAA	Circuitos Logísticos - Rede Viária Regional dos Açores Responsável: DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FUNDOS ESTRUTURAIIS	92 M €	100%	35%


5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C08
Florestas

615 M €
Dotação orçamental

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 30.09.2024

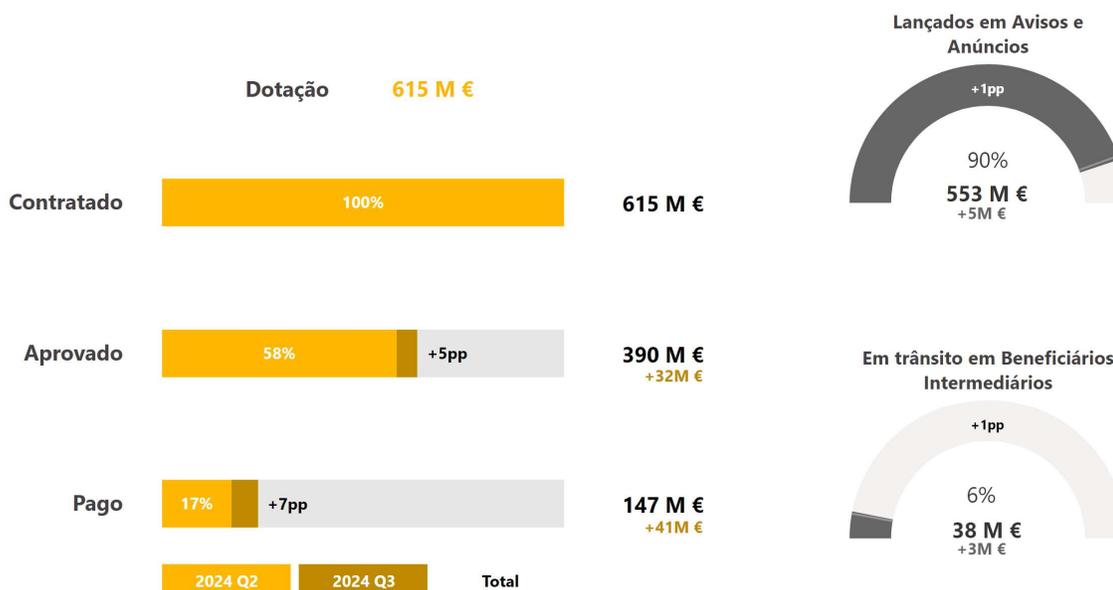

Reformas

CÓDIGO	REFORMA	ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO A 30.09.2024
C08-r19	Transformação da paisagem dos territórios de floresta vulneráveis	● Concretizada
C08-r20	Reorganização do sistema de cadastro da propriedade rústica e do Sistema de Monitorização de Ocupação do Solo	● Concretizada
C08-r21	Prevenção e combate de fogos rurais	● Concretizada

5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C08 Florestas

615 M €
Dotação orçamental

Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 30.09.2024	PAGO A 30.09.2024
C08-i01.01	Transformação da Paisagem dos Territórios de Floresta Vulneráveis – Subinvestimento Áreas integradas de gestão da paisagem (AIGP) e Condomínios de Aldeia Responsável: FUNDO AMBIENTAL	257 M €	18%	3%
C08-i01.02	Transformação da Paisagem dos Territórios de Floresta Vulneráveis: Programas de Reordenamento e Gestão da Paisagem Responsável: DIREÇÃO-GERAL DO TERRITÓRIO	3 M €	100%	32%
C08-i01.03	Transformação da Paisagem dos Territórios de Floresta Vulneráveis - Emparcelar para Ordenar Responsável: INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS (IFAP, I.P.)	10 M €	0%	0%
C08-i02.01	Cadastro da Propriedade Rústica e Sistema de Monitorização da Ocupação do Solo: SMOS e Sistema de conservação do cadastro e de acreditação de técnicos de cadastro predial do Sistema Nacional de Cadastro Predial Responsável: DIREÇÃO-GERAL DO TERRITÓRIO	28 M €	100%	22%
C08-i02.02	Cadastro da Propriedade Rústica e Sistema de Monitorização da Ocupação do Solo: Inventário Florestal Nacional Responsável: INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.	3 M €	100%	0%
C08-i02.03	Cadastro da Propriedade Rústica e Sistema de Monitorização da Ocupação do Solo: Sistema Nacional de Cadastro Predial Responsável: SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA JUSTIÇA	45 M €	99%	60%
C08-i02.04	Cadastro da Propriedade Rústica e Sistema de Monitorização da Ocupação do Solo: Sistema Nacional de Cadastro Predial – Dimensão Local Região Norte Responsável: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE, I. P. (CCDR NORTE, I. P.)	5 M €	101%	0%
C08-i02.05	Cadastro da Propriedade Rústica e Sistema de Monitorização da Ocupação do Solo: Sistema Nacional de Cadastro Predial – Dimensão Local Região Centro Responsável: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO (CCDR CENTRO)	5 M €	100%	0%
C08-i03	Faixas de gestão de combustível - Rede Primária Responsável: INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.	120 M €	100%	16%
C08-i04.01	Meios de prevenção e combate a incêndios rurais – Subinvestimento Meios aéreos Responsável: ESTADO MAIOR DA FORÇA AEREA	70 M €	100%	54%
C08-i04.02	Meios de prevenção e combate a incêndios rurais – Subinvestimento Meios terrestres Responsável: INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.	16 M €	100%	98%
C08-i04.03	Meios de prevenção e combate a incêndios rurais: Rede de radares Responsável: INSTITUTO PORTUGUÊS DO MAR E DA ATMOSFERA, I.P.	3 M €	100%	100%
C08-i05.01	Programa MAIS Floresta: Reforma do sistema de prevenção e combate de incêndios Responsável: SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	40 M €	100%	70%
C08-i05.02	Programa MAIS Floresta: Reforço de atuação das organizações de produtores florestais (OPF) e dos Centros de Competências no setor florestal Responsável: FUNDO AMBIENTAL	10 M €	65%	5%


5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C09 Gestão Hídrica

461 M €
Dotação orçamental

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 30.09.2024

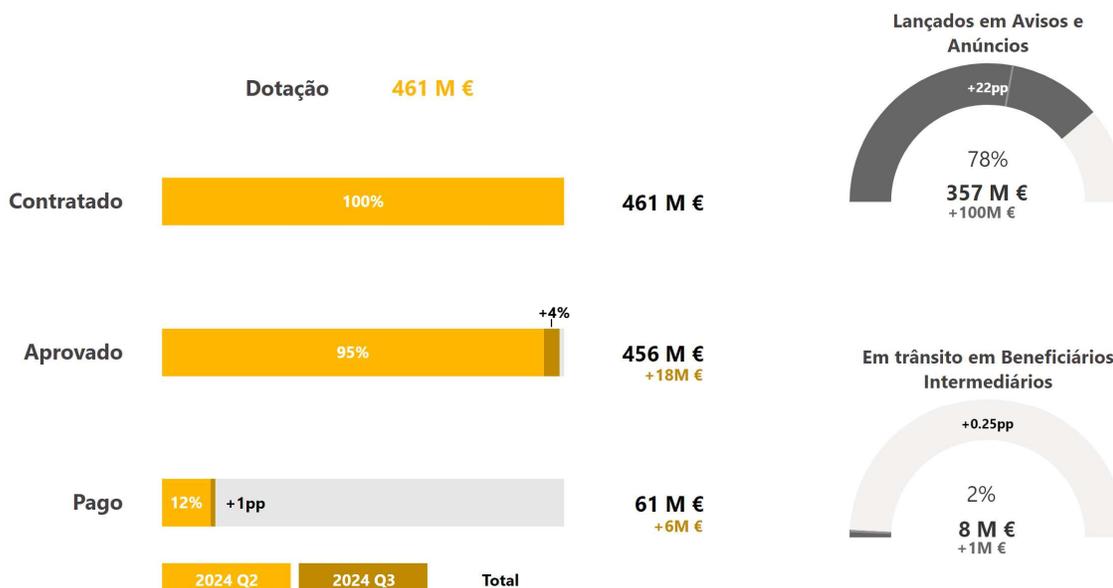

Reformas

Não existem reformas associadas a esta componente.

Investimentos


CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 30.09.2024	PAGO A 30.09.2024
C09-i01.01	Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve: SM1 – Reduzir perdas de água no setor urbano Responsável: CI - AMAL - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE	44 M €	99%	16%
C09-i01.02	Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve: SM2 – Reduzir perdas de água e aumentar a eficiência no setor agrícola Responsável: FUNDO AMBIENTAL	19 M €	73%	7%
C09-i01.03	Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve: SM3 – Reforçar a governança dos recursos hídricos Responsável: AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.	6 M €	100%	13%
C09-i01.04	Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve: SM4 – Promover a utilização de Água Residual Tratada, SM5 – Aumentar a capacidade disponível e resiliência das albufeiras/sistemas de adução em alta existentes e reforçar com novas origens de água e SM Responsável: ÁGUAS DO ALGARVE S.A.	169 M €	100%	10%
C09-i02	Aproveitamento hidráulico de fins múltiplos do Crato-Planeamento Responsável: COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO ALENTEJO	0 M €	0%	0%
C09-i03-RAM	Plano de eficiência e reforço hídrico dos sistemas de abastecimento e regadio da RAM Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM	82 M €	100%	22%
C09-i04	Aproveitamento hidráulico de fins múltiplos do Crato - fase de construção Responsável: COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO ALENTEJO	141 M €	100%	12%

A dotação do investimento C09.i02 é de 0€ uma vez que esta verba foi transferida para o investimento C09.i04

5. Síntese da Implementação por Componente

 COMPONENTE C10 Mar	393 M € Dotação orçamental
--	--------------------------------------

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 30.09.2024

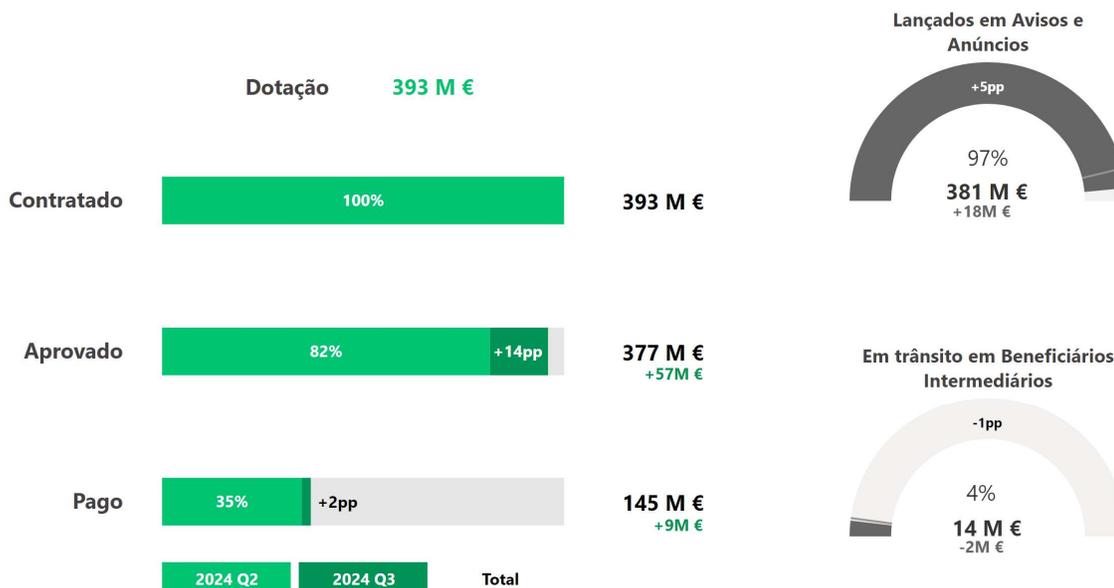

Reformas

CÓDIGO	REFORMA	ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO A 30.09.2024
C10-r23	Reforma do Ecossistema de Infraestruturas de Suporte à Economia Azul	● Concretizada

Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 30.09.2024	PAGO A 30.09.2024
C10-i01	Hub Azul, Rede de Infraestruturas para a Economia Azul Responsável: Fundo Azul	99 M €	97%	25%
C10-i02	Transição Verde e Digital e Segurança nas Pescas Responsável: INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS (IFAP, I.P.)	21 M €	100%	38%
C10-i03.01	Centro de Operações de Defesa do Atlântico e Plataforma Naval - Pilar I - Plataforma Naval Multifuncional e Pilar II - Centro de Operações Responsável: MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL-MARINHA	148 M €	100%	61%
C10-i03.02	Centro de Operações de Defesa do Atlântico e Plataforma Naval - Pilar III - Academia do Arsenal do Alfeite (Academia 4.0) Responsável: ARSENAL DO ALFEITE, S.A.	2 M €	100%	73%
C10-i04-RAA	Desenvolvimento do "Cluster do Mar dos Açores" Responsável: DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FUNDOS ESTRUTURAIS	48 M €	100%	38%
C10-i05-RAA	Transição energética, digitalização e redução do impacto ambiental no setor da Pesca e da Aquicultura Responsável: DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FUNDOS ESTRUTURAIS	5 M €	100%	13%
C10-i06-RAM	Tecnologias Oceánicas Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM	20 M €	100%	13%
C10-i07	Green Shipping Responsável: IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P.	50 M €	75%	0%


5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C11
Descarbonização da Indústria

737 M €
Dotação orçamental

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 30.09.2024

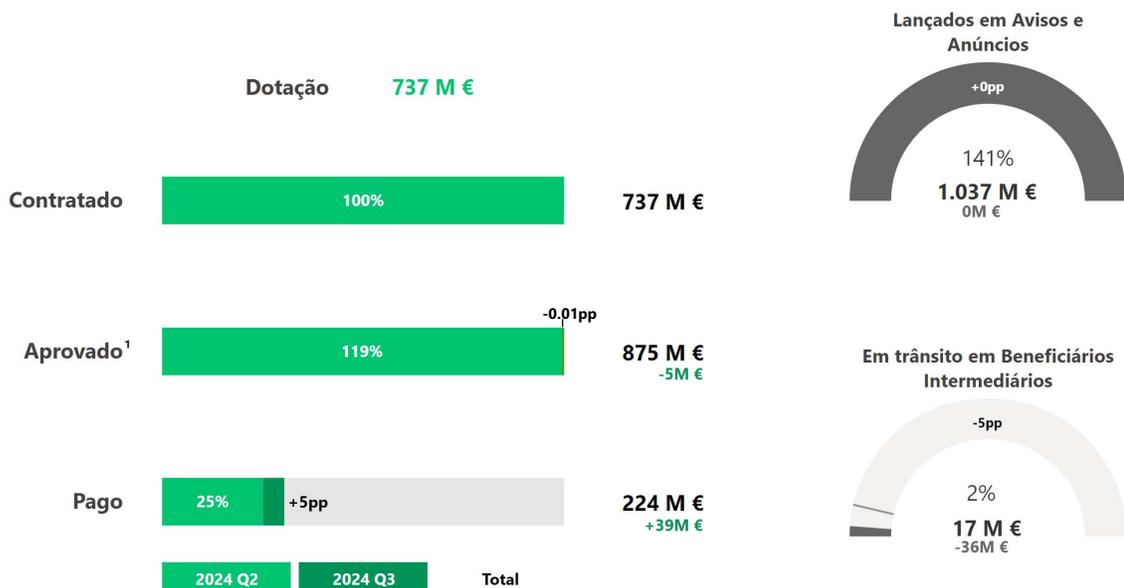

Reformas

Não existem reformas associadas a esta componente.

Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 30.09.2024	PAGO A 30.09.2024
C11-i01	Descarbonização da Indústria Responsável: IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P.	737 M €	119%	30%

¹Desistência e/ou caducidade de projetos


5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C12
Bioeconomia Sustentável

145 M €
Dotação orçamental

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 30.09.2024

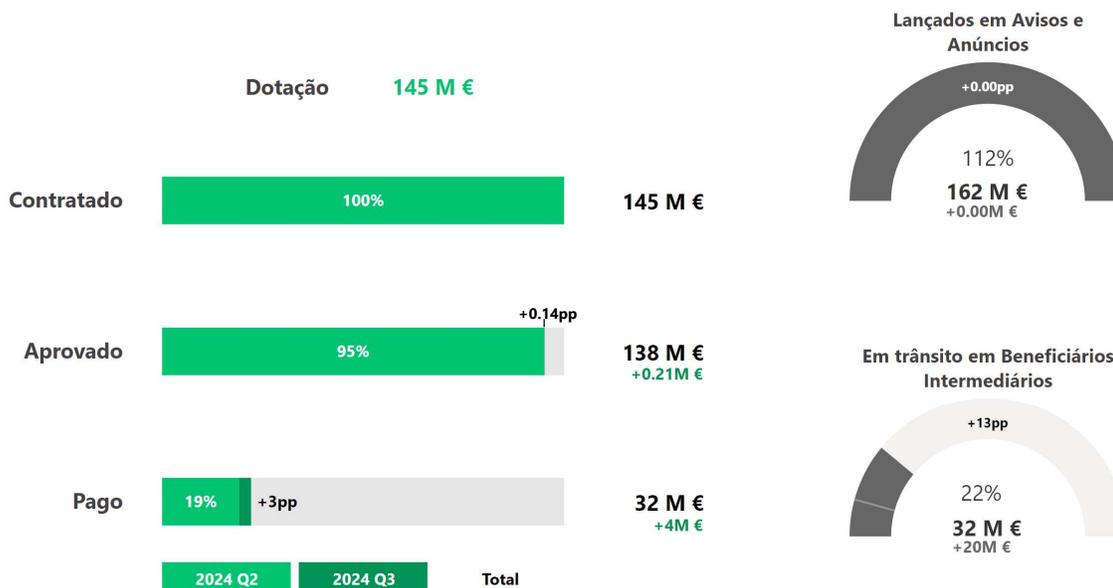

Reformas

CÓDIGO	REFORMA	ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO A 30.09.2024
C12-r25	Bioeconomia sustentável	Concretizada
C12-r39	Promover a economia circular e uma gestão mais eficiente dos resíduos	Em fase de implementação

Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 30.09.2024	PAGO A 30.09.2024
C12-i01.01	Bioeconomia: Projetos Integrados (Têxtil e Vestuário, Calçado e Resina Natural) e Beneficiação de Povoamentos de Pinheiro Bravo com Potencial para a Resinagem Responsável: FUNDO AMBIENTAL	140 M €	95%	20%
C12-i01.02	Bioeconomia - Gestão Florestal e Apoio à Resinagem Responsável: INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.	5 M €	92%	91%


5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C13
Eficiência Energética em Edifícios

610 M €
Dotação orçamental

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 30.09.2024

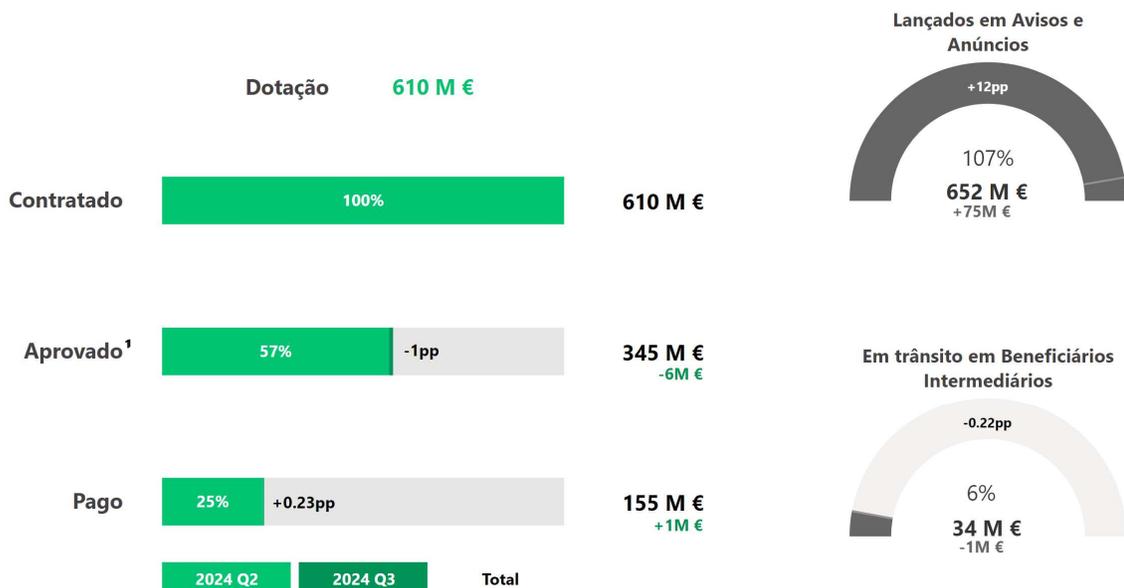

Reformas

Não existem reformas associadas a esta componente.

Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 30.09.2024	PAGO A 30.09.2024
C13-i01	Eficiência energética em edifícios residenciais Responsável: FUNDO AMBIENTAL	300 M €	46%	46%
C13-i02	Eficiência energética em edifícios da administração pública central Responsável: FUNDO AMBIENTAL	240 M €	78%	7%
C13-i03	Eficiência energética em edifícios de serviços Responsável: FUNDO AMBIENTAL	70 M €	31%	3%

¹Desistência de projetos


5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C14
Hidrogénio e Renováveis

385 M €
Dotação orçamental

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 30.09.2024

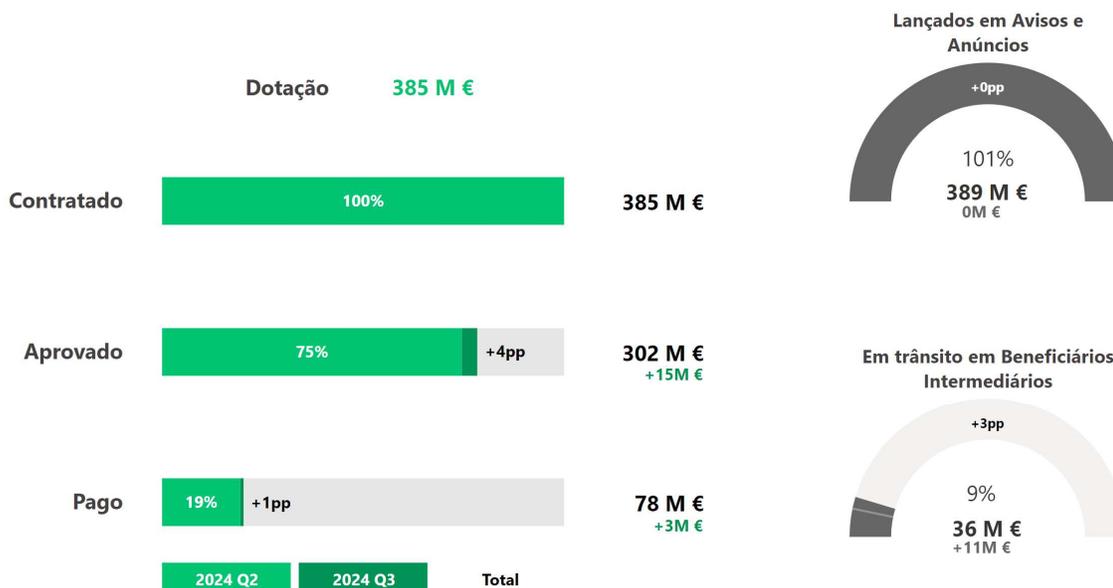

Reformas

CÓDIGO	REFORMA	ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO A 30.09.2024
C14-r29	Estratégia Nacional para o Hidrogénio (EN-H2)	Concretizada

Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 30.09.2024	PAGO A 30.09.2024
C14-i01	Hidrogénio e gases renováveis Responsável: FUNDO AMBIENTAL	185 M €	55%	3%
C14-i02-RAM	Potenciação da eletricidade renovável no Arquipélago da Madeira Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM	84 M €	100%	32%
C14-i03-RAA	Transição Energética nos Açores Responsável: DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FUNDOS ESTRUTURAIS	116 M €	100%	40%


5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C15
Mobilidade Sustentável

1.262 M €
Dotação orçamental

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 30.09.2024

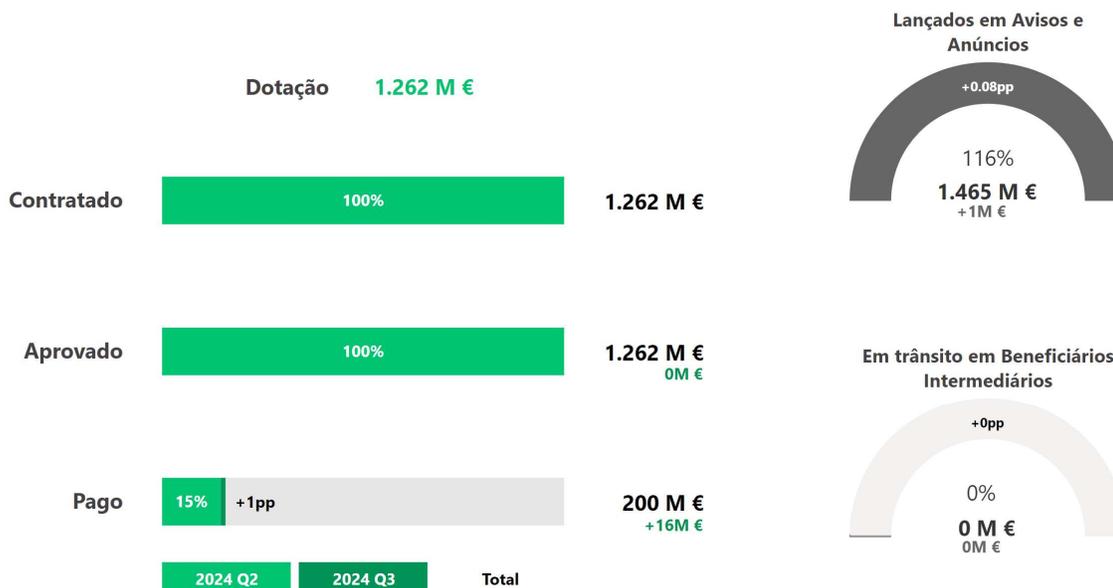

Reformas

CÓDIGO	REFORMA	ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO A 30.09.2024
C15-r30	Reforma do ecossistema de transportes	Em fase de implementação

Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 30.09.2024	PAGO A 30.09.2024
C15-i01	Expansão da Rede de Metro de Lisboa - Linha Vermelha até Alcântara Responsável: METROPOLITANO DE LISBOA, E.P.E.	358 M €	100%	12%
C15-i02	Expansão da Rede de Metro do Porto - Casa da Música-Santo Ovídio Responsável: METRO DO PORTO S.A.	352 M €	100%	18%
C15-i03	Metro Ligeiro de Superfície Odivelas-Loures Responsável: METROPOLITANO DE LISBOA, E.P.E.	390 M €	100%	8%
C15-i04	Linha BRT Boavista - Império Responsável: METRO DO PORTO S.A.	66 M €	100%	38%
C15-i05	Descarbonização dos Transportes Públicos Responsável: FUNDO AMBIENTAL	48 M €	100%	60%
C15-i06	Digitalização do Transporte Ferroviário Responsável: INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.	49 M €	100%	13%


5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C21
REPower EU

855 M €
Dotação orçamental

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 30.09.2024

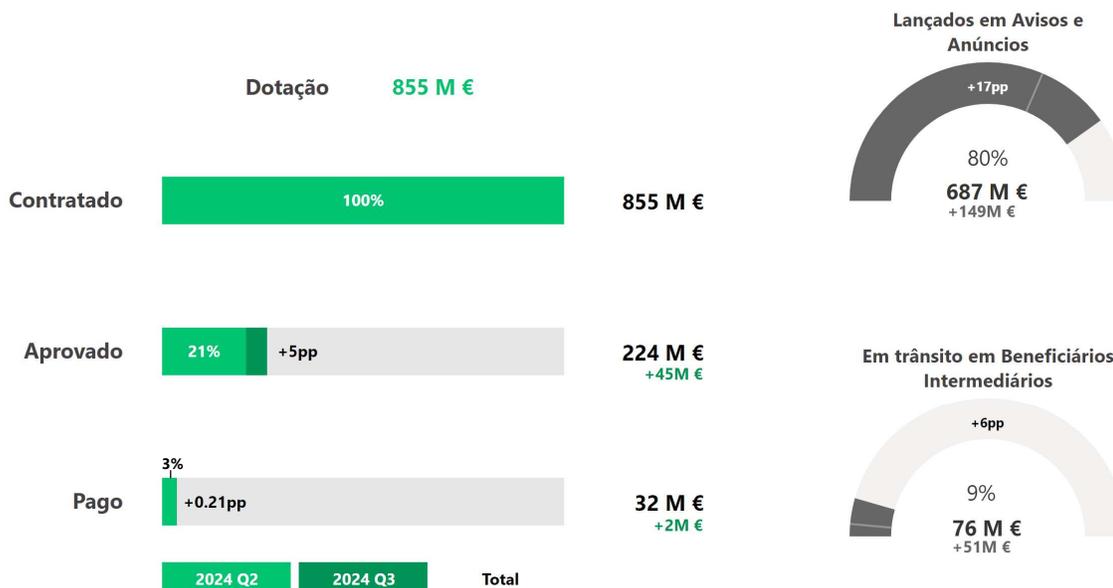

Reformas

CÓDIGO	REFORMA	ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO A 30.09.2024
C21-r43	Observatório Nacional da Pobreza Energética	Em fase de implementação
C21-r44	Criação de balcões únicos para os cidadãos em matéria de eficiência energética (Espaços Cidadão Energia)	Em fase de implementação
C21-r45	Competências verdes	Em fase de implementação
C21-r46	Quadro regulamentar para o hidrogénio renovável	Em fase de implementação
C21-r47	Primeiro leilão para a compra de biometano sustentável e plano de ação para o biometano	Em fase de implementação
C21-r48	Simplificação do quadro jurídico e regulamentar aplicável aos projetos de energias renováveis	Em fase de implementação

5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C21 REPower EU

855 M €
Dotação orçamental

Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 30.09.2024	PAGO A 30.09.2024
C21-i01	Medida reforçada: Descarbonização da Indústria Responsável: IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P.	100 M €	0%	0%
C21-i02	Medida reforçada: Eficiência energética em edifícios residenciais Responsável: FUNDO AMBIENTAL	120 M €	1%	0%
C21-i03	Medida reforçada: Eficiência energética em edifícios de serviços Responsável: FUNDO AMBIENTAL	80 M €	1%	0%
C21-i04-RAM	Eficiência energética em edifícios públicos da Madeira Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM	14 M €	100%	0%
C21-i05	Apoio ao desenvolvimento de uma indústria ecológica Responsável: IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P.	50 M €	35%	0%
C21-i06	Medida reforçada: Hidrogénio e Gases Renováveis Responsável: FUNDO AMBIENTAL	70 M €		
C21-i07.01	Estudos técnicos para potencial energético offshore: Estudos geofísicos, geotécnicos e de parâmetros ambientais Responsável: INSTITUTO PORTUGUÊS DO MAR E DA ATMOSFERA, I.P.	42 M €	100%	25%
C21-i07.02	Estudos técnicos para potencial energético offshore: Estudos de recurso eólico, ondulação e correntes Responsável: LNEG - LABORATÓRIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA I.P.	8 M €	100%	50%
C21-i08	Flexibilidade da Rede e Armazenamento Responsável: FUNDO AMBIENTAL	100 M €	0%	0%
C21-i09	One-Stop-Shop para o Licenciamento e Acompanhamento de Projetos de Energias Renováveis Responsável: DIRECÇÃO-GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA	10 M €	100%	13%
C21-i10-RAA	Sistema de Incentivos à aquisição e instalação de sistemas de armazenamento de energias renováveis nos Açores Responsável: DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FUNDOS ESTRUTURAIIS	6 M €	100%	13%
C21-i11.01-RAM	Sistema de Incentivos à produção e Armazenamento de Energia Proveniente de Fontes Renováveis Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM	6 M €		
C21-i11.02-RAM	Reforço da produção de eletricidade renovável na Ilha do Porto Santo Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM	13 M €	100%	13%
C21-i12	Medida reforçada: Descarbonização dos Transportes Públicos Responsável: FUNDO AMBIENTAL	90 M €		
C21-i13-RAM	Descarbonização dos Transportes Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM	12 M €		
C21-i14	Sistema de BRT Braga Responsável: TUB - TRANSPORTES URBANOS DE BRAGA, E.M.	100 M €	100%	13%
C21-i15-RAA	Aquisição de 2 ferries elétricos Responsável: DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FUNDOS ESTRUTURAIIS	25 M €		
C21-i16	Funicular da Nazaré Responsável: MUNICÍPIO DA NAZARE	10 M €	100%	0%


5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C16 Empresas 4.0

763 M €
Dotação orçamental

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 30.09.2024

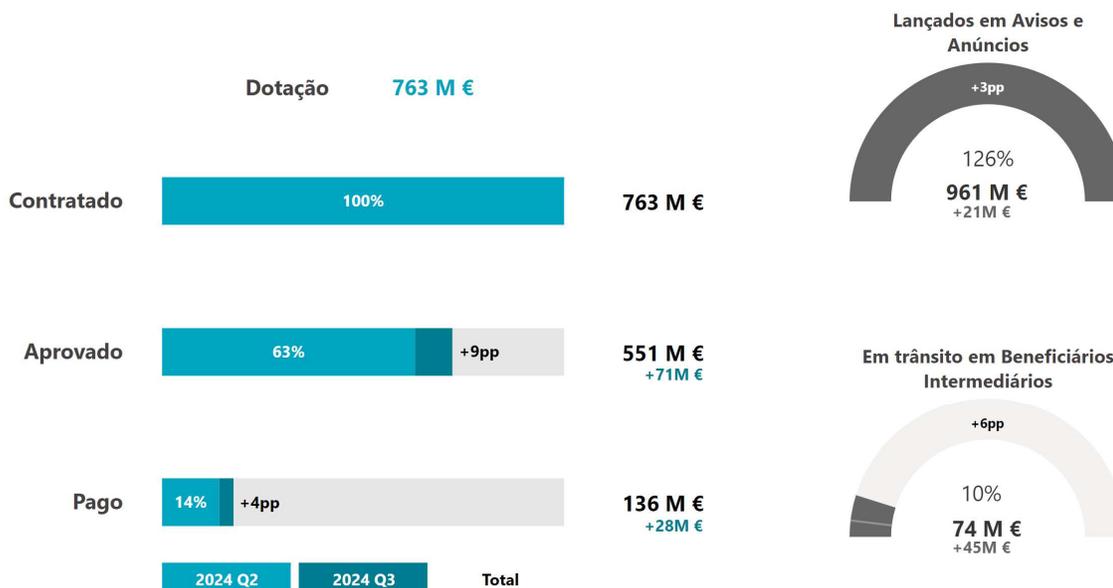

Reformas

CÓDIGO	REFORMA	ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO A 30.09.2024
C16-r31	Transição digital do ambiente empresarial	Concretizada

Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 30.09.2024	PAGO A 30.09.2024
C16-i01	Capacitação Digital das Empresas Responsável: IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P.	100 M €	108%	33%
C16-i02	Transição Digital das Empresas Responsável: IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P.	475 M €	61%	14%
C16-i03	Catalisação da Transição Digital das Empresas Responsável: IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P.	100 M €	71%	16%
C16-i04	Indústria 4.0 Responsável: IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P.	60 M €	101%	22%
C16-i05-RAA	Capacitação e Transformação Digital das Empresas dos Açores Responsável: DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FUNDOS ESTRUTURAIS	22 M €	100%	40%
C16-i06-RAM	Empresas 4.0 Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM	6 M €		


5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C17
Qualidade e Sustentab. das Finanças Públicas

406 M €
Dotação orçamental

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 30.09.2024

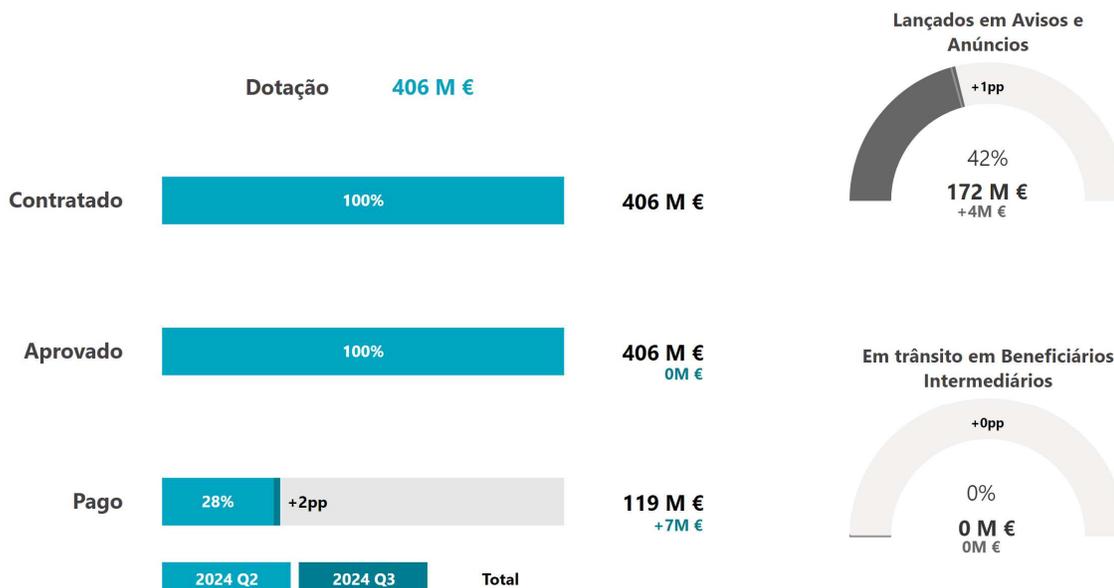

Reformas

CÓDIGO	REFORMA	ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO A 30.09.2024
C17-r32	Modernização e simplificação da gestão financeira pública	Em fase avançada de implementação
C17-r40	Simplificação do sistema fiscal	Em fase de implementação

Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 30.09.2024	PAGO A 30.09.2024
C17-i01.01	Sistemas de informação de Gestão Financeira Pública Responsável: ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, I.P.	161 M €	100%	17%
C17-i01.02	Sistemas de informação de Gestão Financeira Pública/ SIGPIP Responsável: ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, I.P.	2 M €	100%	0%
C17-i02	Modernização da infraestrutura do sistema de informação patrimonial da Autoridade Tributária Responsável: AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	43 M €	100%	23%
C17-i03.01	Transição digital da Segurança Social (ISS) Responsável: INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	19 M €	100%	48%
C17-i03.02	Transição digital da Segurança Social (II) Responsável: INSTITUTO DE INFORMÁTICA, I.P.	182 M €	100%	40%


5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C18
Justiça Económica e Ambiente de Negócios


267 M €
Dotação orçamental

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 30.09.2024

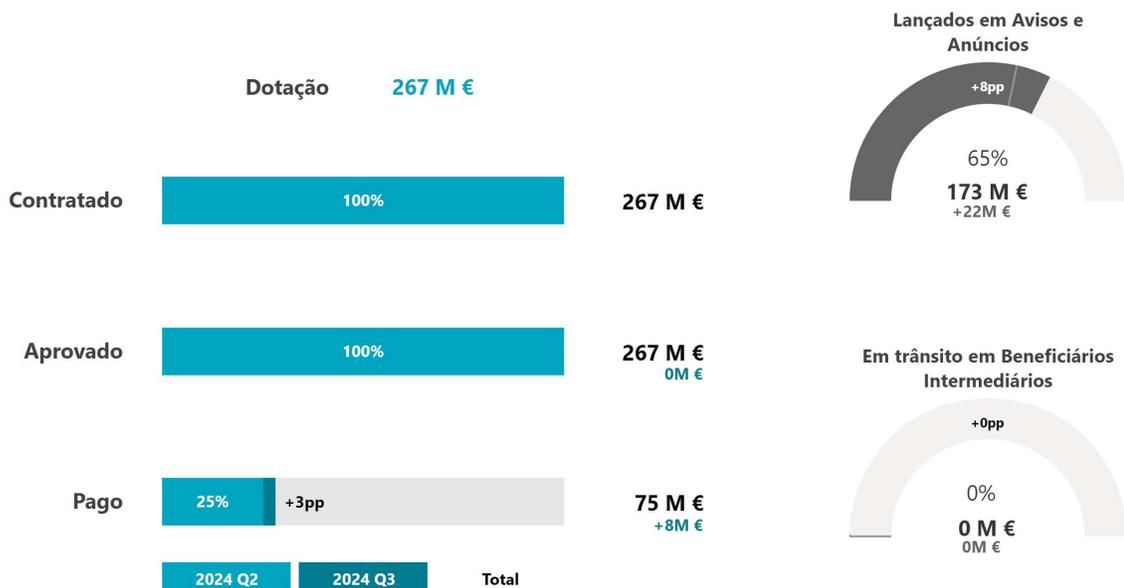

Reformas

CÓDIGO	REFORMA	ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO A 30.09.2024
C18-r33	Justiça económica e ambiente empresarial	Em fase avançada de implementação



5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C18 Justiça Económica e Ambiente de Negócios

267 M €
Dotação orçamental

Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 30.09.2024	PAGO A 30.09.2024
C18-i01.01	TD C18-i01.01: Justiça económica e ambiente de negócios/IGFEJ Responsável: INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA E EQUIPAMENTOS DA JUSTIÇA, I.P.	139 M €	100%	25%
C18-i01.02	TD C18-i01.02: Justiça económica e ambiente de negócios/IRN Responsável: INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO, I.P.	43 M €	100%	29%
C18-i01.03	TD C18-i01.03: Justiça económica e ambiente de negócios/DGPJ Responsável: DIRECÇÃO-GERAL DA POLÍTICA DE JUSTIÇA	24 M €	100%	21%
C18-i01.04	TD C18-i01.04: Justiça económica e ambiente de negócios/DGAJ Responsável: DIRECÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA	16 M €	100%	20%
C18-i01.05	TD C18-i01.05: Justiça económica e ambiente de negócios/PJ Responsável: POLÍCIA JUDICIÁRIA	19 M €	100%	49%
C18-i01.06	TD C18-i01.06: Justiça económica e ambiente de negócios/SGMJ Responsável: SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA JUSTIÇA	9 M €	100%	26%
C18-i01.07	TD C18-i01.07: Justiça económica e ambiente de negócios/INMLCF Responsável: INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL E CIÊNCIAS FORENSES, I.P.	8 M €	100%	58%
C18-i01.08	TD C18-i01.08: Justiça económica e ambiente de negócios/INPI Responsável: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	2 M €	100%	49%
C18-i01.09	TD C18-i01.09: Justiça económica e ambiente de negócios/CAAJ Responsável: COMISSÃO PARA O ACOMPANHAMENTO DOS AUXILIARES DA JUSTIÇA	1 M €	100%	91%
C18-i01.10	TD C18-i01.10: Justiça económica e ambiente de negócios/PGR Responsável: PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA	3 M €	100%	27%
C18-i01.11	TD C18-i01.11: Justiça económica e ambiente de negócios/CSM Responsável: CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA	2 M €	100%	28%
C18-i01.12	TD C18-i01.12: Justiça económica e ambiente de negócios/CSTAF Responsável: CONSELHO SUPERIOR DOS TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS E FISCAIS	0 M €	100%	13%
C18-i01.13	Justiça Económica e Ambiente de Negócios / MENAC Responsável: MECANISMO NACIONAL ANTICORRUPÇÃO (MENAC)	1 M €	100%	13%


5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C19
Administração Pública mais Eficiente

675 M €
Dotação orçamental

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 30.09.2024

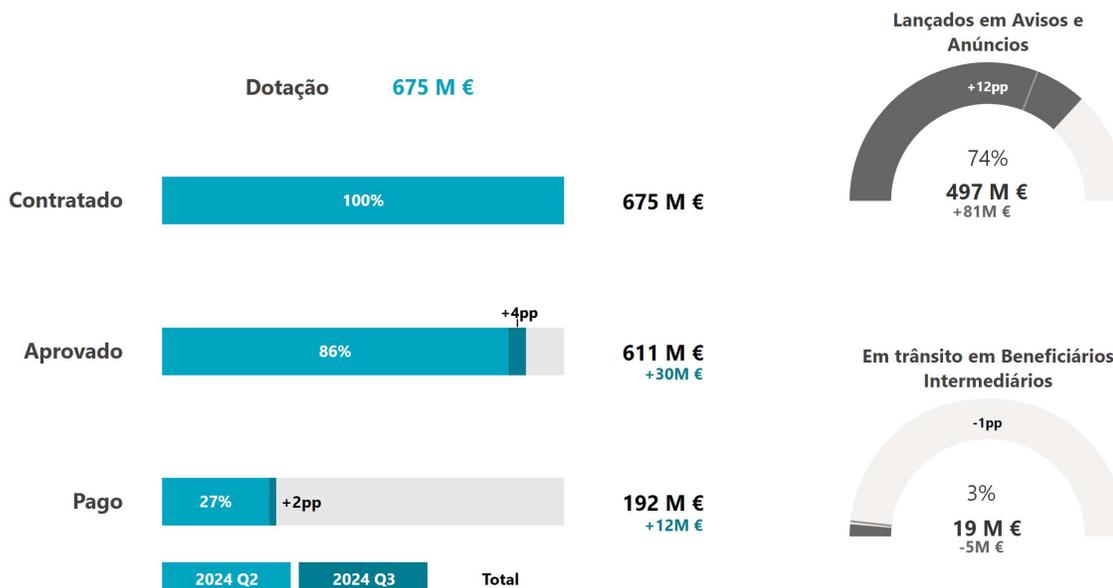

Reformas

CÓDIGO	REFORMA	ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO A 30.09.2024
C19-r34	Serviços públicos digitais, simples, inclusivos e seguros para os cidadãos e para as empresas	● Concretizada
C19-r35	Reforma funcional e orgânica da administração pública	◐ Em fase de implementação
C19-r36	Administração pública capacitada para a criação de valor público	● Concretizada
C19-r41	Acesso aos serviços públicos: harmonizar e consolidar o acesso presencial e em linha	◐ Em fase de implementação
C19-r42	Novo sistema de avaliação para capacitar e rejuvenescer o pessoal da administração pública	◐ Em fase de implementação

5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C19 Administração Pública mais Eficiente

675 M €
Dotação orçamental

Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 30.09.2024	PAGO A 30.09.2024
C19-i01.01	Reformulação do atendimento dos serviços público e consulares Responsável: AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.	165 M €	87%	30%
C19-i01.02	Reformulação do atendimento dos serviços público e consulares/SGMNE Responsável: SECRETARIA GERAL DO MINISTERIO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS	51 M €	100%	44%
C19-i02.01	Serviços Eletrónicos sustentáveis, baseados na interoperabilidade e utilização dos dados para um aumento de transparência e eficiência Responsável: AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.	65 M €	95%	33%
C19-i02.02	Serviços Eletrónicos sustentáveis/INE Responsável: INSTITUTO NACIONAL DE ESTATISTICA	5 M €	100%	29%
C19-i03	Reforço do quadro geral de cibersegurança Responsável: GABINETE NACIONAL DE SEGURANÇA (GNS)	52 M €	100%	14%
C19-i04.01	Transição Digital na Rede Informática do Governo (RING)/CEGER Responsável: CENTRO DE GESTÃO DA REDE INFORMÁTICA DO GOVERNO - CEGER	13 M €	100%	54%
C19-i04.02	Infraestruturas críticas digitais eficientes, seguras e partilhadas/SGMAI Responsável: SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	62 M €	100%	51%
C19-i04.03	Infraestruturas críticas digitais eficientes, seguras e partilhadas Responsável: AGÊNCIA PARA A INTEGRAÇÃO, MIGRAÇÕES E ASILO, I.P.	4 M €	100%	26%
C19-i04.04	Infraestruturas críticas digitais eficientes, seguras e partilhadas Responsável: SECRETARIA GERAL DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS	4 M €	100%	34%
C19-i05.01-RAM	Transição Digital da Administração Pública da RAM- DRI Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM	77 M €	100%	14%
C19-i05.02-RAM	Transição Digital da Administração Pública da RAM-DRAPMA Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM	4 M €	100%	14%
C19-i06-RAA	Modernização e digitalização da Administração Pública- RAA Responsável: DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FUNDOS ESTRUTURAIIS	31 M €	100%	37%
C19-i07.01	Capacitação da Administração Pública - INA Responsável: INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, I.P. (INA, I.P.)	30 M €	108%	22%
C19-i07.02	C19 – i07.02 – Capacitação da Administração Pública – Entidade responsável pela implementação da reforma TD-r35 Responsável: SECRETARIA GERAL DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS	2 M €	100%	13%
C19-i07.03	Capacitação da Administração Pública - Formação Lojas do Cidadão/ Espaços Cidadão Responsável: AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.	1 M €	100%	38%
C19-i07.04	Capacitação da Administração Pública - PlanAPP Responsável: CENTRO DE COMPETÊNCIAS DE PLANEAMENTO, DE POLÍTICAS E DE PROSPETIVA DA ADMINISTRAÇÃO (PLANAPP)	12 M €	100%	20%
C19-i07.05	TD C19-i07.05 - Capacitação da Administração Pública - Programa de Estágios e Promoção do Teletrabalho Responsável: DIRECÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E DO EMPREGO PÚBLICO	38 M €	92%	34%
C19-i08	Territórios Inteligentes - AMA Responsável: AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.	60 M €	37%	5%


5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C20
Escola Digital

605 M €
Dotação orçamental

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 30.09.2024

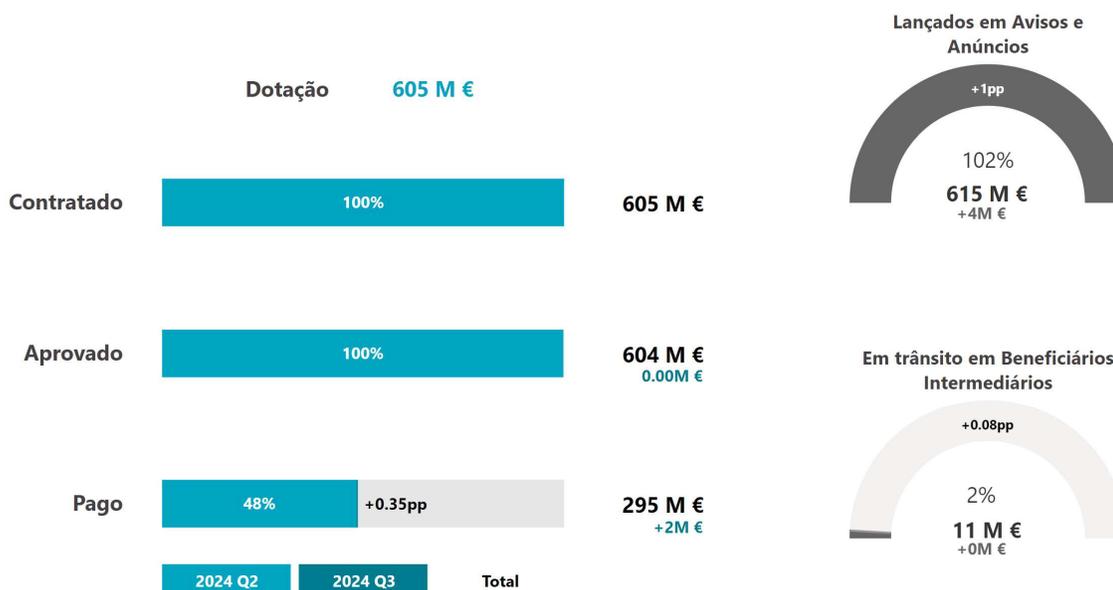

Reformas

CÓDIGO	REFORMA	ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO A 30.09.2024
C20-r37	Reforma para a educação digital	Em fase de implementação

Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 30.09.2024	PAGO A 30.09.2024
C20-i01.01	Transição digital na Educação Responsável: SECRETARIA-GERAL DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA	312 M €	100%	13%
C20-i01.02	Transição digital na Educação Responsável: SECRETARIA-GERAL DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA	228 M €	100%	100%
C20-i02-RAA	Educação digital (Açores) Responsável: DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FUNDOS ESTRUTURAIIS	43 M €	100%	49%
C20-i03-RAM	Programa de aceleração da digitalização da Educação na RAM Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM	22 M €	95%	29%



PRR

Plano de Recuperação
e Resiliência

Anexos

ANEXOS

ANEXO I

Listagem de Projetos Aprovados a Beneficiários Diretos

ANEXO I - Listagem de Projetos Aprovados a Beneficiários Diretos

A listagem dos projetos aprovados a 30 de setembro de 2024 consta de documento autónomo.

ANEXOS

ANEXO II

Listagem de Projetos Aprovados a Beneficiários Finais

ANEXO II - Listagem de Projetos Aprovados a Beneficiários Finais

A listagem dos projetos aprovados a 30 de setembro de 2024 consta de documento autónomo.

