



RECUPERAR
PORTUGAL

Revisão para a simplificação do PRR

31 outubro 2025

[Versão: 20 novembro 2025]



PRR
Plano de Recuperação
e Resiliência



REPÚBLICA
PORTUGUESA



Financiado pela
União Europeia
NextGenerationEU

Índice

Parte 1 – Introdução	3
<i>Enquadramento e objetivo geral</i>	3
<i>Metodologia</i>	4
Parte 2 – Revisão e simplificação do PRR	7
<i>Visão global</i>	7
<i>Componentes e M&M alterados</i>	9
 Componente 1 – Serviço Nacional de Saúde	9
 Componente 2 – Habitação	11
 Componente 3 – Respostas Sociais	13
 Componente 4 – Cultura	15
 Componente 5 – Investimento e Inovação	16
 Componente 6 – Qualificações e competências	18
 Componente 6 – Qualificações e competências	18
 Componente 7 – Infraestruturas	20
 Componente 8 – Florestas	22
 Componente 9 – Gestão hídrica	24
 Componente 10 – Mar	26
 Componente 11 – Descarbonização da indústria	27
 Componente 12 – Bioeconomia	28

	Componente 13 – Eficiência energética em edifícios	30
	Componente 14 – Hidrogénio e renováveis.....	31
	Componente 15 – Mobilidade sustentável	33
	Componente 16 – Empresas 4.0	34
	Componente 17 – Qualidade e sustentabilidade das finanças públicas.....	36
	Componente 18 – Justiça económica e ambiente empresarial	38
	Componente 19 – Administração pública digital	39
	Componente 20 – Escola digital	42
	Componente 21 – REPowerEU	43

Parte 1 – Introdução

Enquadramento e objetivo geral


A [Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho “NextGenerationEU – Rumo a 2026”](#), de 4 de junho de 2025, veio reforçar o quadro jurídico e os prazos aplicáveis, bem como as implicações operacionais na apresentação dos pedidos de pagamento e dos elementos de prova no procedimento de suspensão dos pagamentos e na revisão dos Planos de Recuperação e Resiliência (PRR).

Por conseguinte, Portugal deve proceder a uma revisão com vista à simplificação completa do seu PRR, a fim de assegurar que todos os Marcos e Metas (M&M) possam ser cumpridos.

No contexto desta revisão para a simplificação do PRR é igualmente necessário assegurar a solidez dos elementos de prova e a capacidade de os mesmos serem disponibilizados atempadamente, com vista a limitar qualquer constrangimento durante a avaliação de cada um dos M&M.

O calendário para a conclusão do Mecanismo de Recuperação e Resiliência (MRR) foi igualmente clarificado, nomeadamente:

Calendário para a conclusão do MRR



- 31 agosto 2026: conclusão da execução dos M&M (apresentação à Estrutura de Missão Recuperar Portugal (EMRP) de todas as evidências sobre cumprimento dos M&M).
- 30 setembro 2026: a EMRP submete à Comissão Europeia o 10.º e último pedido de pagamento (com factos ocorridos até 31 agosto de 2026).
- 30 novembro 2026: data limite para Comissão Europeia completar a avaliação preliminar do último pedido de pagamento.

- 31 dezembro 2026: data do último desembolso a efetuar pela Comissão Europeia para Portugal.

Neste âmbito, tendo por base o calendário apresentado, é importante salientar que esta revisão para a simplificação do PRR traduz-se no último momento em que será possível efetuar alterações até ao encerramento do PRR. Correspondendo ao ajustamento final até à execução final do PRR, é crucial assegurar a exequibilidade de todos os M&M, bem como garantir a sua comprovação, tendo em vista a plena execução do PRR.


Metodologia

A Comunicação da Comissão Europeia acima referida detalha um conjunto de linhas orientadoras para incorporar numa estratégia para garantir a execução plena do PRR. Neste âmbito, o processo recomendado seguiu o seguinte processo:

- 1) Mapeamento: revisão de todas as medidas (investimentos e reformas) e identificação dos M&M em risco de não cumprimento até 31 de agosto de 2026.
- 2) Ajustamento: após o mapeamento, aferição da exequibilidade das medidas e aplicação das opções de revisão do PRR recomendadas pela Comissão Europeia.
- 3) Simplificação: revisão de todos os M&M e solicitação à Comissão Europeia para remoção e/ou substituição das medidas – apenas investimentos – cujos M&M não possam ser concluídos até 31 de agosto de 2026.



Making RRP fit for 2026 – process

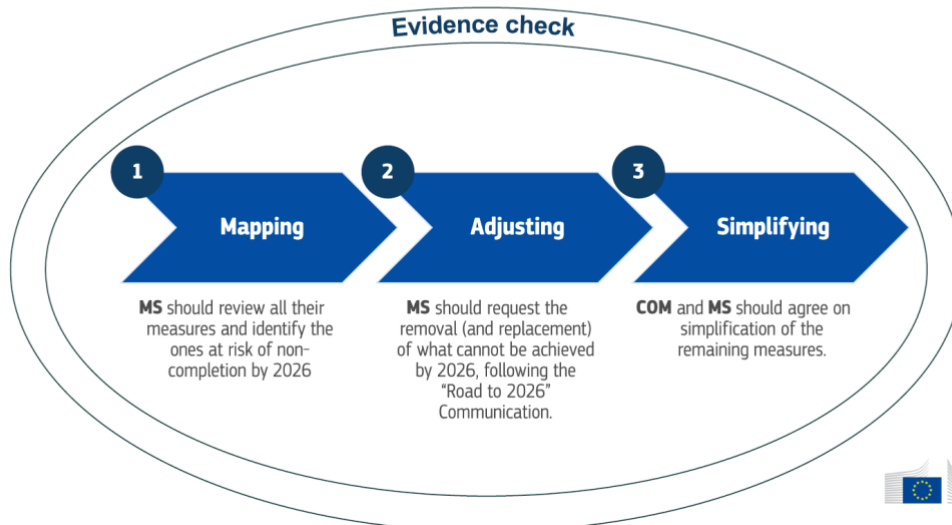

No âmbito das opções de revisão do PRR recomendadas pela Comissão Europeia, são apresentadas 8 alternativas, salientado que Portugal já utilizou as primeiras 6 das 8 abaixo referidas, nomeadamente na última reprogramação em 2025:

1. Reforço / aumento das medidas existentes;
2. Redução da dotação de empréstimos;
3. Faseamento de projetos do PRR para continuação com fundos nacionais ou outros fundos da União Europeia;
4. Instrumentos financeiros e regimes de subvenção;
5. Transferências para o *InvestEU*;
6. Injeções de capital em bancos e instituições de fomento nacionais (*IBPN*);
7. Contribuições para o Programa Europeu para a Indústria da Defesa (*EDIP*);
8. Contribuições para os programas comunitários por comunicação de satélite.

Nesta revisão para a simplificação do PRR foi seguida uma metodologia que permitiu:

- Focar a descrição dos M&M nos objetivos essenciais e eliminar os requerimentos desnecessários à comprovação dos objetivos previstos para as medidas;

- Manter as evidências documentais estritamente necessárias à comprovação dos M&M;
- Reduzir o número de M&M;
- Aumentar a ambição dos M&M em investimentos com possibilidade de maior concretização e reduzir a ambição nos M&M em investimentos com problemas de concretização;
- Aumento de ambição no financiamento às empresas, nomeadamente através do Instrumento Financeiro para a Inovação e Competitividade (IFIC).

De salientar que este processo de revisão para a simplificação é diferente do exercício de reprogramação efetuado e aprovado pelo Conselho Europeu, em 13 maio de 2025, nomeadamente pelo facto de não ser possível incluir novos investimentos. Quando aplicável, opta-se pelo aumento do investimento em medidas já existentes.

Reforça-se que o objetivo visa manter no plano as medidas relativamente às quais exista certeza da sua plena execução dentro do prazo de implementação do PRR. Salienta-se que, caso os M&M não sejam alcançados até 31 de agosto de 2026, Portugal poderá não receber o desembolso total das verbas previstas pelo PRR.

É importante salientar que esta proposta poderá sofrer alterações decorrente da avaliação e negociação com a Comissão Europeia que irá ocorrer até à aprovação desta proposta de revisão do PRR.

Parte 2 – Revisão e simplificação do PRR

Visão global

A presente secção abrange as alterações das componentes do PRR aprovado pela Decisão de Execução do Conselho Europeu n.º ST 12491/25 ADD1, de 29 de setembro de 2025, atualmente em vigor.

A tabela seguinte apresenta os ajustamentos efetuados na dotação e alocação de M&M de cada componente:

PRR - Atual		PRR Simplif.	Dif.
RESILIÊNCIA			
2.058 M € C01.	Serviço Nacional Saúde	2.014 M €	- 43 M €
2.824 M € C02.	Habituação	2.857 M €	+32 M €
1.127 M € C03.	Respostas sociais	862 M €	-264 M €
346 M € C04.	Cultura	330 M €	-15 M €
5.384 M € C05.	Investimento e inovação	6.047 M €	+ 664 M €
1.938 M € C06.	Qualificações e competências	1.991 M €	+ 53 M €
790 M € C07.	Infraestruturas	768 M €	-22 M €
615 M € C08.	Florestas	615 M €	0 M €
236 M € C09.	Gestão hídrica	228 M €	- 8 M €
15.317 M €		15.712 M €	+ 396 M €
TRANSIÇÃO CLIMÁTICA			
384 M € C10.	Mar	366 M €	- 18 M €
737 M € C11.	Descarbonização da indústria	737 M €	0 M €
175 M € C12.	Bioeconomia	175 M €	0 M €
622 M € C13.	Eficiência energética em edifícios	553 M €	- 69 M €
436 M € C14.	Hidrogénio e renováveis	436 M €	0 M €
847 M € C15.	Mobilidade sustentável	549 M €	-298 M €
951 M € C21.	REPowerEU	970 M €	+ 19 M €
4.151 M €		3.785 M €	- 366 M €
TRANSIÇÃO DIGITAL			
699 M € C16.	Empresas 4.0	658 M €	- 41 M €
406 M € C17.	Qualidade e sustentabilidade em finanças públicas	372 M €	-34 M €
267 M € C18.	Justiça económica e ambiente empresarial	267 M €	0 M €
702 M € C19.	Administração pública digital	686 M €	-17 M €
674 M € C20.	Escola digital	425 M €	-249 M €
2.748 M €		2.408 M €	- 340 M €
22.216 M €		21.905 M €	-311 M €

	PRR - Atual	PRR Simplif.	Dif.
RESILIÊNCIA			
C01. Serviço Nacional Saúde	20	13	-7
C02. Habitação	12	7	-5
C03. Respostas sociais	18	16	-2
C04. Cultura	8	3	-5
C05. Investimento e inovação	24	21	-3
C06. Qualificações e competências	16	12	-4
C07. Infraestruturas	6	5	-1
C08. Florestas	9	8	-1
C09. Gestão hídrica	8	7	-1
	121	92	-29
TRANSIÇÃO CLIMÁTICA			
C10. Mar	11	8	-3
C11. Descarbonização da indústria	1	1	0
C12. Bioeconomia	4	3	-1
C13. Eficiência energética em edifícios	4	4	0
C14. Hidrogénio e renováveis	7	7	0
C15. Mobilidade sustentável	4	3	-1
C21. REPowerEU	22	24	2
	53	50	-3
TRANSIÇÃO DIGITAL			
C16. Empresas 4.0	12	11	-1
C17. Qualidade e sustentabilidade em finanças públicas	12	8	-4
C18. Justiça económica e ambiente empresarial	5	5	0
C19. Administração pública digital	21	19	-2
C20. Escola digital	10	5	-5
	60	48	-12
C22. Auditoria e Controlo	2	2	0
	236	192	-44
TOTAL - Marcos e Metas	438	394	-44

Foi libertado o montante de cerca de 311 M€ da componente de empréstimos, essencialmente respeitante aos projetos da linha de metro de Lisboa (linha vermelha até Alcântara) e Hospital de Lisboa Oriental.

Decorrente deste processo de simplificação, verifica-se uma redução de 44 M&M, passando de 438 para 394 M&M.


De salientar a antecipação de 14 M&M para o 8.º Pedido de Pagamento que passa a deter 36 M&M. Paralelamente, os 9.º e 10.º Pedidos de Pagamento passam a deter 56 e 98 M&M, respetivamente, sem prejuízo de algum potencial ajustamento a ocorrer decorrente da discussão com a Comissão Europeia.

Componentes e M&M alterados



Componente 1 – Serviço Nacional de Saúde

Resumo das alterações – Marcos e Metas



Proposta de simplificação | Componente 1 – Serviço Nacional de Saúde

- Marcos e Metas
 - Aumento de ambição de 2 marcos com impacto financeiro de 99.0 M€
 - Redução de ambição de 2 metas com impacto financeiro de 42.1 M€
 - Antecipação de prazo de 4 marcos e metas para o 8.º Pedido de Pagamento pelo facto dos mesmos se encontrarem cumpridos
 - 7 marcos e metas eliminados: 1 por não ser possível concretizar dentro do período PRR com impacto financeiro de 100 M€; 4 por fusão com outros marcos e metas; e 2 seguindo as linhas orientadoras da Comissão Europeia (custos < 10%)
 - 4 marcos e metas adicionais revistos no âmbito do processo de simplificação

Impacto financeiro

PRR atual | Impacto financeiro

2.057.633.320 €

PRR simplif. | Impacto financeiro

2.014.479.101 €



- 43.154.219 €

Resultados esperados

Na **Componente 1 – Serviço Nacional da Saúde**, pretende-se obter os seguintes resultados:


- Criação de 25 novos Centros de Responsabilidade Integrados nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde;
- Construção de 106 novos centros de saúde e requalificação ou adaptação de 386 instalações de saúde, incluindo a modernização de equipamentos de saúde;
- Disponibilização de, pelo menos, 809 veículos elétricos para apoio à prestação de cuidados domiciliários pelos centros de saúde;
- Alargamento do número de novas unidades móveis para 34 para cobertura das regiões de baixa densidade;
- 6.900 lugares/camas requalificadas e 3.850 novos lugares/camas para reforço da capacidade de resposta da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e da Rede Nacional de Cuidados Paliativos;
- Construção e renovação de 3 unidades de psiquiatria forense;
- Reforço da rede de cuidados de saúde mental, como a construção / requalificação de 4 unidades de internamento em hospitais gerais, criação de 15 Centros de Responsabilidade Integrados, requalificação de 20 dos serviços locais de saúde mental existentes, criação de 500 lugares para as necessidades de pessoas institucionalizadas com doença mental crónica;
- Aquisição de equipamento hospitalar até ao montante de cerca de 188.5 M€;

- Aquisição de 4 helicópteros médios para evacuação médica e emergência;
- Aquisição de 124 equipamentos médicos pesados para hospitais do Serviço Nacional de Saúde.



Componente 2 – Habitação

Resumo das alterações – Marcos e Metas



Proposta de simplificação | Componente 2 – Habitação

- Marcos e Metas
 - Aumento de ambição de 2 metas com impacto financeiro de 81.2 M€
 - Redução de ambição de 3 metas com impacto financeiro de 48.7 M€
 - Extensão de prazo de 1 meta.
 - 5 metas eliminadas: 4 por fusão com outras metas; e 1 seguindo as linhas orientadoras da Comissão Europeia (custos < 10%)
 - 3 marcos e metas adicionais revistos no âmbito do processo de simplificação

Impacto financeiro

PRR atual | Impacto financeiro

2.824.076.342 €



PRR simplif. | Impacto financeiro

2.856.510.913 €

+ 32.434.571 €

Resultados esperados


Na **Componente 2 – Habitação**, pretende-se obter os seguintes resultados:

- 27.500 habitações entregues a famílias elegíveis no quadro do programa de apoio ao acesso à habitação;
- 3.500 habitações entregues às famílias elegíveis através da cedência de habitações a custos acessíveis
- 1.800 alojamentos para os quais foram assinados acordos de financiamento no âmbito do programa de Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário
- 840 habitações entregues às forças de segurança e alojamento temporário fornecido por razões humanitárias ou de segurança e 3 Centros de Alojamento Temporário;
- Disponibilização de 18.000 lugares de alojamento estudantil a custos acessíveis (novos e renovados), prioritariamente para alunos do ensino superior.



Componente 3 – Respostas Sociais


Resumo das alterações – Marcos e Metas



Proposta de simplificação | Componente 3 – Respostas sociais

- Marcos e Metas
 - Redução de ambição de 8 metas com impacto financeiro de 243.2 M€.
 - Antecipação de prazo de 1 meta para o 8.º Pedido de Pagamento pelo facto da mesma se encontrar cumprida
 - 2 metas eliminadas: 1 meta eliminada pelo facto do investimento associado não ser concretizável dentro do calendário PRR; e 1 meta por fusão com outra meta (incluindo redução de ambição)
 - 8 marcos e metas adicionais revistos no âmbito do processo de simplificação

Impacto financeiro

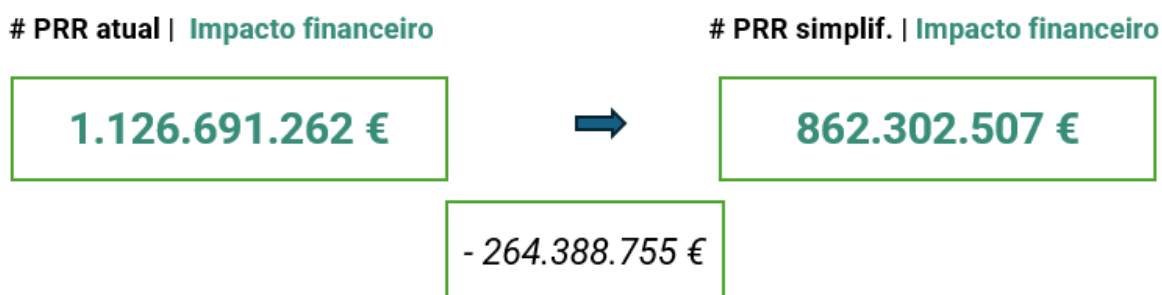

Resultados esperados


Na **Componente 3 – Respostas sociais**, pretende-se obter os seguintes resultados:

- Adoção da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza e da Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência 2021-2025;
- Entrega de 2.000 veículos elétricos a prestadores de respostas sociais a grupos vulneráveis;
- Constituição de 278 equipas de intervenção social;
- Criação de 28.000 lugares em equipamentos sociais para crianças, idosos, pessoas com deficiência e outras pessoas vulneráveis, dos quais 15.000 novos e os restantes remodelados;
- 1.250 habitações e instalações de serviços públicos com intervenções adicionais para melhorar as condições de acesso para pessoas com deficiência
- 75.000 m2 de espaço público com intervenções para melhorar as condições de acesso para pessoas com deficiência;
- Entrega de 565 veículos elétricos para pessoas com mobilidade reduzida;
- 910 vagas novas e reabilitadas disponibilizadas em lares residenciais e não residenciais na Região Autónoma da Madeira;
- Entrada em funcionamento do centro de atendimento telefónico para Língua Gestual Portuguesa;
- Medidas de apoio para projetos das Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto no valor de 225 M€;
- 11.561 crianças e jovens apoiados por medidas de combate ao abandono escolar e promoção do ensino superior na Região Autónoma dos Açores.



Componente 4 – Cultura


Resumo das alterações – Marcos e Metas



Proposta de simplificação | Componente 4 – Cultura

- Marcos e Metas
 - Redução de ambição de 3 marcos e metas com impacto financeiro de 15.2 M€, dos quais 2 removidos
 - 5 marcos e metas eliminados: 2 por fusão com outros marcos e metas, 1 seguindo as linhas orientadoras da Comissão Europeia (custos < 10%) e as 2 remanescentes acima referidas
 - 2 marcos e metas adicionais revistos no âmbito do processo de simplificação

Impacto financeiro

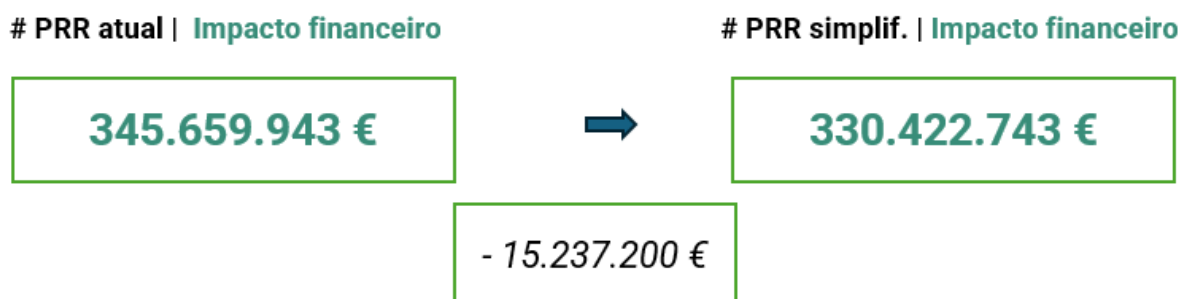

Resultados esperados


Na **Componente 4 – Cultura**, pretende-se obter os seguintes resultados:

- Digitalização de coleções da Biblioteca Nacional, da Biblioteca Pública de Évora, Cinemateca e de outros museus e monumentos portugueses;
- Aquisição de equipamento tecnológico para 444 espaços culturais, 4 laboratórios e para o Arquivo Nacional do Som;
- Conclusão de obras de requalificação e conservação de 84 museus, monumentos, palácios e teatros nacionais;
- Conclusão da construção do Arquivo Nacional do Som.



Componente 5 – Investimento e Inovação

Resumo das alterações – Marcos e Metas




Proposta de simplificação | Componente 5 – Investimento e Inovação

- **Marcos e Metas**
 - Aumento de ambição de 4 metas com impacto financeiro de 713.6 M€
 - Redução de ambição de 1 meta com impacto financeiro de 50.0 M€
 - Antecipação de prazo de 2 metas, uma das quais para o 8.º Pedido de Pagamento pelo facto da mesma se encontrar cumprida

- 3 marcos e metas eliminados: 2 por fusão com outros marcos e metas e o remanescente seguindo as linhas orientadoras da Comissão Europeia (custos < 10%)
- 11 marcos e metas adicionais revistos no âmbito do processo de simplificação

Impacto financeiro

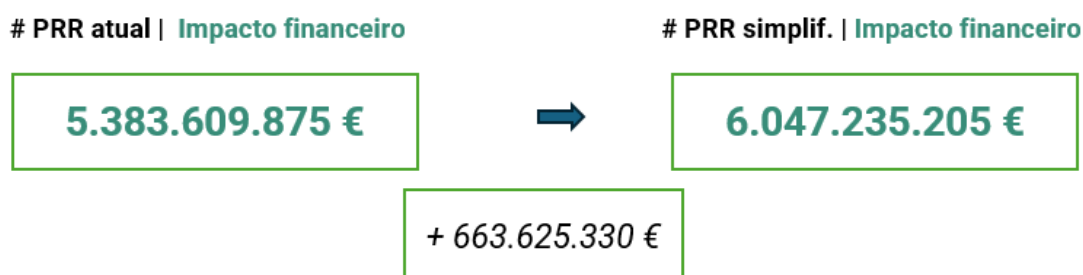

Resultados esperados

Na **Componente 5 – Investimento e Inovação**, pretende-se obter os seguintes resultados:


- Aprovação da Agenda de Inovação para a Agricultura;
- Revisão do Código dos Valores Mobiliários;
- Entrada em vigor de legislação relativa ao desenvolvimento do mercado de capitais;
- Conclusão de 959 produtos, processos ou serviços em áreas estratégicas relevantes no âmbito das agendas mobilizadoras;
- Prestação de serviços a 560 empresas pelas entidades de interface, incluindo Laboratórios Colaborativos;
- Requalificação de 24 polos de inovação agrícola e financiamento de 100 projetos de Investigação e Inovação, focados nos aspetos ecológicos e digitalização da Agenda de Inovação para a Agricultura 2030;
- Construção do «Campus Ciência XXI» e do «Balcão de Ciência» e prestação de serviços através do Programa Nacional para a Ciência Aberta e Dados Abertos de Investigação (PNCADAI);

- 94 projetos financiados no âmbito do programa de I&D na Administração Pública, incluindo nos domínios da inteligência artificial (IA), da cibersegurança e da ciência dos dados;
- Conclusão da infraestrutura de apoio e do centro de dados do Centro Nacional de Computação Avançada;
- Aquisição de supercomputadores Deucalion e Mare Nostrum 5;
- Desenvolvimento de um modelo linguístico de grande dimensão (LLM) para o português de Portugal;
- Aquisição de equipamento ou conclusão de projetos de renovação e/ou modernização de unidades de investigação num montante total de 160 M€;
- Cerca de 932 M€ destinados ao Instrumento Financeiro para a Inovação e Competitividade (IFIC);
- Entrega, por um instrumento de capitalização, de um total de 850 M€ a empresas;
- Contribuição de 450 M€ no programa InvestEU para apoio a concessão de empréstimos a empresas portuguesas.



Componente 6 – Qualificações e competências


Resumo das alterações – Marcos e Metas



Proposta de simplificação | Componente 6 – Qualificações e competências

- **Marcos e Metas**
 - Aumento de ambição de 1 meta com impacto financeiro de 60.0 M€
 - Redução de ambição de 1 meta com impacto financeiro de 7.2 M€
 - Antecipação de 3 metas para o 8.º Pedido de Pagamento pelo facto das mesmas se encontrarem cumpridas
 - 4 marcos e metas eliminadas: 3 por fusão noutros marcos e metas e a remanescente de acordo com as linhas orientadoras da CE (meta intermédia)
 - 7 marcos e metas adicionais revistos no âmbito do processo de simplificação

Impacto financeiro

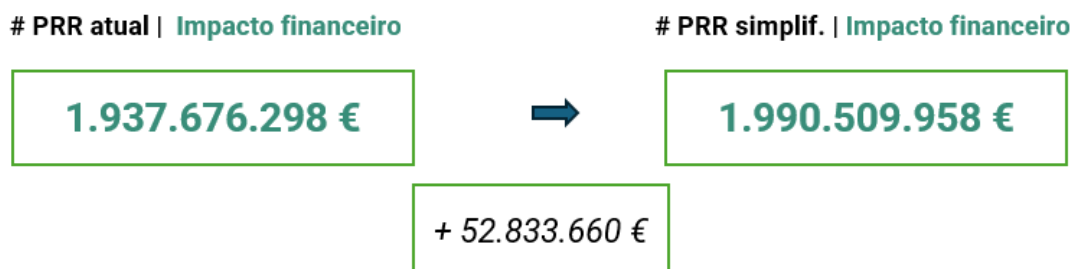

Resultados esperados

Na **Componente 6 – Qualificações e competências**, pretende-se obter os seguintes resultados:


- Entrada em vigor da lei que cria concursos especiais de admissão ao ensino superior;
- Entrada em vigor da lei relativa às profissões regulamentadas;
- Entrada em vigor da lei que regula o trabalho em plataformas;
- Publicação de uma norma para um Sistema de Gestão de Igualdade Salarial;

- Entrada em vigor de um ato regulamentar que permite a entrega do «Selo Igualdade Salarial» a empresas;
- 365 Centros Tecnológicos Especializados renovados ou construídos para cursos profissionais no ensino secundário;
- Pelo menos 111 centros de formação profissional da rede do serviço público de emprego (IEFP) ou da rede de escolas do Turismo de Portugal renovados, construídos ou dotados de diversos tipos de equipamento;
- 145.500 participantes em medidas de apoio à melhoria das qualificações dos adultos;
- 650 novos clubes adicionados à rede de clubes Ciência Viva nas escolas;
- Acreditação ou registo de 200 cursos do ensino superior em CTEAM;
- 20.000 novas vagas abertas em cursos profissionais em áreas emergentes com base na atualização no Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ);
- Entrada em vigor do novo quadro legal que rege a cooperação das instituições de ensino superior com a administração pública e as empresas;
- Apoio a 242 contratos permanentes com investigadores doutorados no âmbito da *FCT-Tenure* e apoio a investigadores no âmbito do ERC Portugal;
- Construção e renovação de 77 escolas públicas;
- 17 escolas profissionais melhoradas na Região Autónoma dos Açores.



Componente 7 – Infraestruturas


Resumo das alterações – Marcos e Metas



Proposta de simplificação | Componente 7 – Infraestruturas

- **Marcos e Metas**
 - Redução de ambição de 1 meta com impacto financeiro de 22.0 M€.
 - 1 meta eliminada por fusão com outra meta.
 - 4 marcos e metas revistos no âmbito do processo de simplificação

Impacto financeiro

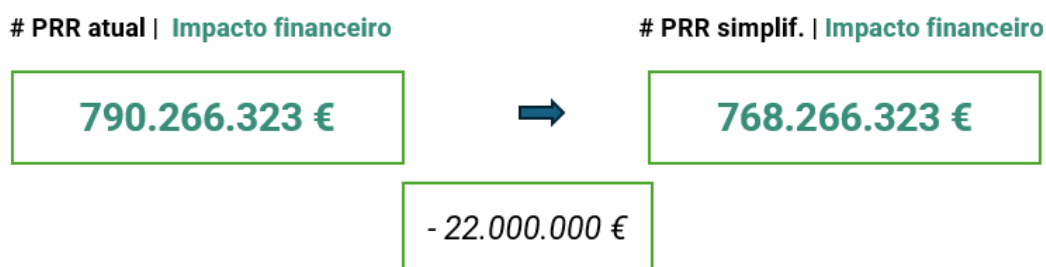

Resultados esperados


Na **Componente 7 – Infraestruturas**, pretende-se obter os seguintes resultados:

- 15.000 pontos de carregamento acessíveis ao público para veículos elétricos;
- 111 km de estradas construídas ou reabilitadas destinadas a ligações em falta na rede rodoviária e aumento da capacidade da rede;
- 22 km de estradas construídas ou reabilitadas relativas aos circuitos logísticos na Rede Regional dos Açores;
- Intervenções em 8 áreas de acolhimento empresarial com trabalhos destinados a melhorar a sustentabilidade ambiental e digitalização;
- 30 km de estradas construídas ou reabilitadas em ligações transfronteiriças;
- 42 km de estradas construídas ou reabilitadas em zonas de acolhimento de empresas para melhoria de acessibilidade rodoviária.



Componente 8 – Florestas


Resumo das alterações – Marcos e Metas



Proposta de simplificação | Componente 8 – Florestas

- Marcos e Metas
 - Redução de ambição de 2 marcos e metas com impacto financeiro de 9.1 M€
 - Aumento de ambição de 1 meta com impacto financeiro de 9.1 M€
 - Extensão de prazo de 2 metas para garantir conclusão do objetivo
 - 1 meta eliminada de acordo com as linhas orientadoras da CE (custos < 10%)
 - 3 marcos e metas adicionais revistos no âmbito do processo de simplificação

Impacto financeiro



Resultados esperados

Na **Componente 8 – Florestas**, pretende-se obter os seguintes resultados:


- Entrada em funcionamento do Sistema de Monitorização de Ocupação do Solo (SMOS);
- Criação do Sistema de Gestão de Informação de Incêndios Florestais (SGIFR).
- Entrada em vigor do quadro jurídico que implementa o arrendamento forçado de prédios rústicos em áreas florestais;
- Desenvolvimento de Programas de Reordenamento e Gestão da Paisagem (PRGP) para 20 zonas vulneráveis homogêneas ou áreas afetadas por grandes incêndios;
- 60 Operações Integradas de Gestão da Paisagem (OIGP);
- Financiamento de projetos de gestão de combustível em, pelo menos, 600 aldeias rurais situadas em territórios florestais (Condomínios de Aldeia);
- Execução das medidas de emparcelamento rural Programa «Emparcelar para Ordenar»;
- Lançamento da Plataforma BUPi 2.0 e ações de formação a técnicos qualificados a nível nacional;
- Produção de cartografia de referência para o Sistema de Monitorização de Ocupação do Solo (SMOS);
- Implementação da rede primária de faixas de gestão de combustível (RPFGC), a fim de criar descontinuidades horizontais na paisagem para isolar focos de incêndio;
- 21.727 ha de área de servidão constituída na rede primária de faixas de gestão de combustível (RPFGC);
- 21.000 ha de área de implementação da Rede Primária de Faixas de Gestão de Combustível (RPFGC), a fim de criar descontinuidades horizontais na paisagem (faixas de gestão de combustível) para isolar focos de incêndio;
- Entrega de 179 veículos, maquinaria e equipamento de combate a incêndios e prevenção de incêndios;

- Entrega de 2 helicópteros bombardeiros ligeiros (HEBL) e de 9 helicópteros bombardeiros médios (HEBM), incluindo construção e/ou renovação de edifícios e infraestruturas para a utilização e manutenção dos helicópteros;
- Instalação de dois radares de dupla polarização, com sistema de computação e arquivo, dois detetores de trovoadas e duas estações meteorológicas automáticas;
- Fornecimento de 2.000 armadilhas inteligentes para a implementação de um sistema inteligente de vigilância de vetores de doença relevantes para a fitossanidade e a saúde animal;
- Entrega de 134 unidades de equipamento para gestão florestal (estilhaçadoras de madeira e tratores florestais);
- Fornecimento de 20.000 kits de armadilhas inteligentes para monitorização de pragas florestais e de controlo de plantas lenhosas invasoras.



Componente 9 – Gestão hídrica

Resumo das alterações – Marcos e Metas



Proposta de simplificação | Componente 9 – Gestão hídrica

- **Marcos e Metas**
 - Redução de ambição de 1 marco com impacto financeiro de 8.2 M€.
 - 1 meta eliminada por fusão com outra meta.
 - 6 marcos e metas adicionais revistos no âmbito do processo de simplificação

Impacto financeiro

PRR atual | Impacto financeiro

236.365.904 €

PRR simplif. | Impacto financeiro

228.134.298 €



- 8.231.606 €

Resultados esperados


Na **Componente 9 – Gestão hídrica**, pretende-se obter os seguintes resultados:

- Construção de 50 piezómetros;
- 125 km de intervenções nas redes para otimização de pressões e reabilitação de rede com a otimização da pressão e medição do caudal;
- Modernização da área rural correspondente a 10.300 ha de zonas abrangidas pela adoção de sistemas de distribuição mais eficientes, implementação de sistemas de teledeteção e controlo dos consumos, e a implementação de sistemas de deteção de fugas dos aproveitamentos hidroagrícolas coletivos;
- Abertura de 4 estações de tratamento para assegurar a produção de águas residuais tratadas aptas para reutilização;
- Construção da primeira fase da ligação entre os sistemas de abastecimento em alta do Barlavento/Sotavento Algarvio;
- Reparação e extensão de 53 km de condutas de água construídas, renovadas ou reabilitadas na Região Autónoma da Madeira para obter 4 hm³ de volume adicional de água disponibilizado para abastecimento público e irrigação;
- 43 MW de produção adicional e operacional de energia fotovoltaica instalada em centrais fotovoltaicas flutuantes na albufeira da barragem de Alqueva.



Componente 10 – Mar


Resumo das alterações – Marcos e Metas



Proposta de simplificação | Componente 10 – Mar

- **Marcos e Metas**
 - Redução de ambição de 1 meta com impacto financeiro de 18.3 M€.
 - 3 marcos eliminados por fusão com outros marcos e metas
 - 7 marcos e metas adicionais revistos no âmbito do processo de simplificação

Impacto financeiro



Resultados esperados

Na **Componente 10 – Mar**, pretende-se obter os seguintes resultados:

- Conclusão da instalação e/ou requalificação de 6 Polos Azuis (*Blue Hubs*) e atualização da Escola do Polo Azul;
- 82 projetos que apoiam a inovação, a transição energética e a redução do impacto ambiental para entidades do setor da pesca;

- Construção das infraestruturas para o Tecnopolo MARTEC na ilha do Faial, no âmbito do centro experimental e de desenvolvimento ligado ao mar nos Açores;
- Entrega de um navio de investigação, incluindo um sistema integrado de equipamento eletrónico acústico de investigação e fornecimento de 2 módulos para o novo navio de investigação (um módulo ROV e um módulo de equipamento de arrasto);
- 15 projetos de modernização e renovação da frota de pesca, inovação nas pescas e na aquicultura para melhorar o desempenho energético, modernização dos processos, redução da produção de resíduos no mar e promoção da economia circular em todos os setores da pesca e da aquicultura;
- Construção de um navio de investigação multifuncional, de um veículo autónomo não tripulado de superfície e de dois veículos subaquáticos autónomos na Região Autónoma da Madeira;
- Construção da «Plataforma Naval de Natureza Multifuncional» e do «Centro de Operações»;
- 10 intervenções em matéria de eficiência energética dos navios.



Componente 11 – Descarbonização da indústria


Resumo das alterações – Marcos e Metas

# PRR atual 1 Marcos e Metas		# PRR simplif. 1 Marcos e Metas		Alterações		
0	8.º Pedido de Pagamento	1	1	8.º Pedido de Pagamento	0	Ambição
1	9.º Pedido de Pagamento		0	9.º Pedido de Pagamento	1	Prazo
0	10.º Pedido de Pagamento		0	10.º Pedido de Pagamento	1	Outros

Proposta de simplificação | Componente 11 – Descarbonização da indústria

- Marcos e Metas
 - Antecipação de 1 meta para o 8.º Pedido de Pagamento pelo facto a mesma se encontrar atualmente cumprida.
 - A mesma meta foi revista no âmbito do processo de simplificação.

Impacto financeiro



Resultados esperados


Na **Componente 11 – Descarbonização da indústria**, pretende-se obter os seguintes resultados:

- Apoio financeiro a 310 projetos de descarbonização industrial.



Componente 12 – Bioeconomia

Resumo das alterações – Marcos e Metas




Proposta de simplificação | Componente 12 – Bioeconomia

- Marcos e Metas

- 1 meta eliminada de acordo com as linhas orientadoras da CE (custos < 10%).
- 3 marcos e metas revistos no âmbito do processo de simplificação

Impacto financeiro



Resultados esperados


Na **Componente 12 – Bioeconomia**, pretende-se obter os seguintes resultados:

- Entrada em vigor do novo Regime Geral de Gestão de Resíduos (RGGR), que simplifica o processo administrativo e reduz os custos associados à utilização de subprodutos;
- Entrada em vigor da Estratégia Nacional para as Compras Públicas Ecológicas revista, que especifica critérios ecológicos relacionados com a aquisição de serviços e produtos que integrem materiais de base biológica sustentável;
- Entrada em vigor da definição harmonizada de critérios para a ecomodulação;
- Entrada em funcionamento do sistema de depósito e reembolso;
- Sistema de retoma de resíduos elétricos e equipamentos eletrónicos;
- 15 novos produtos, tecnologias e processos-piloto que integrem recursos de base biológica;



Componente 13 – Eficiência energética em edifícios


Resumo das alterações – Marcos e Metas



Proposta de simplificação | Componente 13 – Eficiência energética em edifícios

- Marcos e Metas
 - Redução de ambição de 3 metas com impacto financeiro de 69.0 M€, 1 das quais eliminada
 - Criação de 1 nova meta com a inclusão de um novo sub-investimento
 - 1 marco adicional revisto no âmbito do processo de simplificação

Impacto financeiro



Resultados esperados


Na **Componente 13 – Eficiência energética em edifícios**, pretende-se obter os seguintes resultados:

- 45.000 habitações com equipamentos de eficiência energética em edifícios residenciais privados;
- 18.000 «Vales eficiência» distribuídos a agregados familiares em situação de pobreza energética para substituir equipamentos antigos e adotar soluções eficientes do ponto de vista energético;
- 1.040.000 m² de área renovada em edifícios da administração pública central;
- 360 000 m² de área renovada em edifícios de serviços;
- 58.200 «Vales E-Lar» atribuídos a agregados familiares em situação de pobreza energética.



Componente 14 – Hidrogénio e renováveis

Resumo das alterações – Marcos e Metas




Proposta de simplificação | Componente 14 – Hidrogénio e renováveis

- Marcos e Metas
 - 2 metas eliminadas: 1 meta eliminada por contrapartida da criação de 2 novos marcos e metas com a passagem para o sistema de incentivos; a remanescente eliminada seguindo as linhas orientadoras da Comissão Europeia (custos < 10%)
 - 5 marcos e metas adicionais revistos no âmbito do processo de simplificação

- Criação de 2 novos marcos e metas relativas ao sistema de incentivos, tal como acima mencionado

Impacto financeiro



Resultados esperados


Na **Componente 14 – Hidrogénio e renováveis**, pretende-se obter os seguintes resultados:

- Entrada em vigor do Regulamento da Rede Nacional de Transporte de Gás e do Regulamento da Rede Nacional de Distribuição de Gás;
- Apoio a projetos de gases renováveis e hidrogénio renovável;
- Instalação de um compensador síncrono com uma potência mínima de 15 MVA na Região Autónoma da Madeira;
- Fornecimento e instalação de 130.000 novos contadores inteligentes;
- Modernização da Central Hidroelétrica dos Socorridos na Região Autónoma da Madeira;
- Na Região Autónoma da Madeira, renovação da Central Hidroelétrica da Serra de Água, da Central Hidroelétrica da Calheta I e instalação de um sistema de baterias.



Componente 15 – Mobilidade sustentável


Resumo das alterações – Marcos e Metas



Proposta de simplificação | Componente 15 – Mobilidade sustentável

- Marcos e Metas
 - Redução de ambição de 1 meta para se ajustar ao que é possível concretizar dentro do calendário do PRR
 - 1 meta eliminada pelo investimento não ser concretizável dentro do período PRR
 - 2 metas revistas no âmbito do processo de simplificação

Impacto financeiro



Resultados esperados

Na **Componente 15 – Mobilidade sustentável**, pretende-se obter os seguintes resultados:


- Obras de extensão para a expansão da rede de metro do Porto (7 estações);

- Construção de uma linha de serviço direto de autocarros (BRT) entre a Praça do Império e a Praça Mouzinho de Albuquerque no Porto;
- Aquisição de 145 novos autocarros com nível nulo de emissões (elétricos ou a hidrogénio) utilizados para transporte público;
- Novos sistemas eletrónicos de sinalização nas linhas ferroviárias instalados na Área Metropolitana de Lisboa;
- Instalação de um módulo de transmissão específica (STM) em comboios equipados com o Sistema Europeu de Controlo dos Comboios (ECTS);
- Construção, aquisição de equipamento ou serviços para sistemas de telemática, telecomunicações e sinalização.



Componente 16 – Empresas 4.0

Resumo das alterações – Marcos e Metas




Proposta de simplificação | Componente 16 – Empresas 4.0

- **Marcos e Metas**
 - Redução de ambição de 3 metas com impacto financeiro de 43.9 M€
 - Aumento de ambição de 1 meta com impacto financeiro de 3.3 M€
 - Extensão de prazo para 2 metas do 9.º Pedido de Pagamento para o 10.º Pedido de Pagamento de forma a garantir a conclusão dos objetivos
 - Antecipação de 2 metas para o 8.º Pedido de Pagamento pelo facto das mesmas se encontrarem cumpridas

- 1 meta eliminada de acordo com as linhas orientadoras da CE (custos < 10%)
- 4 marcos e metas adicionalmente revistos no âmbito do processo de simplificação

Impacto financeiro



Resultados esperados

Na **Componente 16 – Empresas 4.0**, pretende-se obter os seguintes resultados:


- 225.000 participantes na formação do Emprego + Digital;
- Criação de 30 novos *Massive Open Online Courses (MOOCs)* disponíveis através da Academia Portugal Digital;
- Apoio à Rede Nacional de *Test Beds*;
- Criação de 75 Bairros de Comércio Digital em centros urbanos e zonas suburbanas ou rurais;
- 12.800 PME apoiadas via *vouchers* para comércio digital, bem como apoios a 4.600 PME no âmbito dos programas de digitalização, internacionalização via comércio eletrónico, *Coaching 4.0* e *vouchers* para *start-ups* para o desenvolvimento de novos produtos digitais;
- Apoio aos Digital Innovation Hubs (pelo menos, 33.0 M€);
- 300 projetos Indústria 4.0 apoiados;
- 409 projetos apoiados no âmbito do Sistema de Incentivos à Transição Digital das Empresas na Região Autónoma dos Açores;
- Ampliação dos Parques de Ciência e Tecnologia na Região Autónoma dos Açores;

- Apoio a 300 projetos de digitalização de PME's na Região Autónoma da Madeira.



Componente 17 – Qualidade e sustentabilidade das finanças públicas


Resumo das alterações – Marcos e Metas



Proposta de simplificação | Componente 17 – Qualidade e sustentabilidade das finanças públicas

- Marcos e Metas
 - Redução de ambição de 1 marco com impacto financeiro de 28.2 M€;
 - 4 marcos e metas eliminados: 1 pela existência de risco elevado na sua concretização dentro do período PRR (impacto financeiro de 5.6 M€); 1 de acordo com as linhas orientadoras da CE (custos < 10%) e os 2 remanescentes pela fusão com outros marcos e metas;
 - 6 marcos e metas revistos no âmbito do processo de simplificação.

Impacto financeiro



Resultados esperados

Na **Componente 17 – Qualidade e sustentabilidade das finanças públicas**, pretende-se obter os seguintes resultados:


- Entrada em vigor da legislação subjacente à Entidade Contabilística Estado e conclusão da sua implementação;
- Entrada em vigor de um ato jurídico que modifica o quadro jurídico aplicável a determinados benefícios fiscais e simplifica estes benefícios;
- Criação da Unidade Técnica de Avaliação Tributária e Aduaneira (U-TAX) permanente;
- Entrada em vigor de legislação relativa à integração das revisões de despesa no processo orçamental regular, incluindo a avaliação ex post dos ganhos de eficiência;
- Conclusão e aprovação do modelo para acompanhamento da execução orçamental e financeira das administrações públicas;
- Conclusão da implementação do Sistema de Gestão de Património Imobiliário Público (SIGPIP) e da modernização dos sistemas de informação sobre os veículos do Estado;
- Conclusão da implementação do preenchimento prévio para transações específicas sujeitas ao imposto de selo;
- Expansão de 10 novas funcionalidades do sítio Web Segurança Social Direta;

- Implementação de dois modelos de vigilância inteligentes, que utilizem processos de aprendizagem automática para apoio à prevenção de fraude.



Componente 18 – Justiça económica e ambiente empresarial


Resumo das alterações – Marcos e Metas



Proposta de simplificação | Componente 18 – Justiça económica e ambiente empresarial

- Marcos e Metas
 - 5 marcos e metas revistos no âmbito do processo de simplificação

Impacto financeiro



Resultados esperados


Na **Componente 18 – Justiça económica e ambiente empresarial**, pretende-se obter os seguintes resultados:

- Criação de secções especializadas nos tribunais administrativos e fiscais superiores;
- Entrada em vigor de um regime jurídico para incentivar os acordos judiciais e extrajudiciais;
- Entrada em vigor do quadro jurídico revisto para a insolvência e recuperação;
- Entrada em vigor dos estatutos dos funcionários judiciais;
- Entrada em vigor do pacote legislativo relativo à remoção de obstáculos ao licenciamento;
- Entrada em funcionamento de um sistema informático modernizado para a investigação criminal;
- Entrada em funcionamento do sistema de informação «Empresa 2.0»;
- Entrada em funcionamento de um novo sistema de informação para a tramitação de processos judiciais eletrónicos;
- Execução do novo Plano Tecnológico de Equipamentos e Infraestruturas da Justiça.



Componente 19 – Administração pública digital


Resumo das alterações – Marcos e Metas



Proposta de simplificação | Componente 19 – Administração pública digital

- Marcos e Metas
 - Redução de ambição de 1 marco com impacto financeiro de 3.0 M€
 - Antecipação de prazo de 3 metas: 1 para o 8.º Pedido de Pagamento pelo facto de se encontrar atualmente cumpridas e 2 do 10.º Pedido de Pagamento para o 9.º Pedido de Pagamento
 - 2 marcos e metas eliminados por não ser possível a sua concretização dentro do período PRR com impacto financeiro de 13.6 M€
 - 15 marcos e metas adicionais revistos no âmbito do processo de simplificação

Impacto financeiro

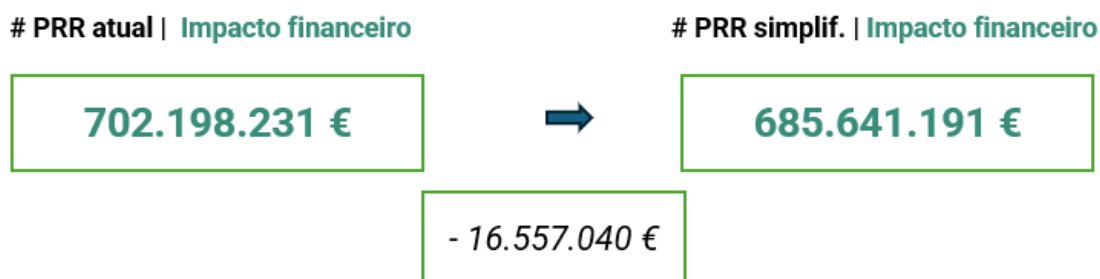

Resultados esperados


- Quadro jurídico para a transformação digital da administração pública
- Alterações funcionais e orgânicas da administração pública central
- Revisão do Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública (SIADAP)
- 25 serviços disponíveis através de vários canais, como portal único de serviços digitais, centro de contacto, Lojas do Cidadãos, Espaços Cidadão;

- Desmaterialização de 10 serviços consulares e um centro de atendimento consular a funcionar em, pelo menos, 15 países;
- Criação de 31 novas Lojas de Cidadão e 400 novos Espaços Cidadão;
- Lançamento de uma aplicação para cidadãos para que possam aceder digitalmente aos serviços públicos mais populares e outras funcionalidades;
- Disponibilização do portal “Informação de infraestrutura territorial” disponível, providenciando informação geográfica, cartográfica, demográfica, socioeconómica e ambiental;
- Criação de 7 centros de competências para apoiar o desenvolvimento de capacidades de cibersegurança e aplicabilidade do Quadro Nacional de Cibersegurança em 47 entidades da Administração Pública;
- Aquisição de 150 equipamentos criptográficos em entidades públicas;
- Melhorias na Rede Nacional de Segurança Interna e na Rede de Comunicações de Emergência do Estado;
- Aquisição de 17.500 computadores portáteis para trabalhadores da administração pública;
- Formação de 96.400 participantes num conjunto diversificado de programas de reforço de capacidades (p.e., capacitação digital, SIADAP, PlanAPP, etc.);
- Modernização e instalação de uma plataforma de gestão urbana em 129 municípios;
- Criação de 5 gémeos digitais em domínios prioritários nacionais como a água e a agricultura, a resiliência às alterações climáticas, a mobilidade e a descarbonização, a saúde, a energia, o turismo e a proteção civil;
- Formação a trabalhadores do setor público em matéria de recolha e gestão de dados e outros conteúdos ligados a cidades e edifícios inteligentes, e sustentabilidade.
- Conclusão da transição digital na administração pública nas Regiões Autónomas dos Açores e Madeira



Componente 20 – Escola digital


Resumo das alterações – Marcos e Metas



Proposta de simplificação | Componente 20 – Escola digital

- Marcos e Metas
 - Redução de ambição de 2 metas com impacto financeiro de 249.4 M€, 1 das quais eliminada
 - 5 metas eliminadas: 4 metas eliminada de acordo com as linhas orientadoras da CE (custos < 10%), 1 das quais com redução de ambição inerente; a remanescente por fusão com outro marco.
 - 4 marcos e metas adicionais revistos no âmbito do processo de simplificação

Impacto financeiro



Resultados esperados


Na **Componente 20 – Educação digital**, pretende-se obter os seguintes resultados:

- 600.000 computadores portáteis para empréstimo a professores e alunos;
- Criação de 1.300 novos Laboratórios de Educação Digital com equipamento de projeto especializado, incluindo kits de robótica, impressoras 3D, equipamento de medição e ensaio e computadores;
- 40.000 novos projetores em estabelecimentos de ensino público;
- Produção de recursos educativos digitais e digitalização de exames finais;
- 31.900 novos computadores portáteis e tábletes adquiridos para o ensino pré-escolar, primeiro e segundo ciclos e ensino secundário na Região Autónoma dos Açores;
- 15.910 manuais digitais para alunos no segundo e terceiro ciclos e estudantes do ensino secundário na Região Autónoma da Madeira.



Componente 21 – REPowerEU


Resumo das alterações – Marcos e Metas



Proposta de simplificação | Componente 21 – REPowerEU

- Marcos e Metas
 - Aumento de ambição de 1 meta com impacto financeiro de 60.0 M€
 - Redução de ambição de 1 meta pelo objetivo inicial não ser possível cumprir até final do PRR com impacto financeiro de cerca de 41.1 M€
 - Antecipação de prazo de 2 metas para o 8.º Pedido de Pagamento pelo facto das mesmas se encontrarem atualmente cumpridas
 - 2 marcos e metas eliminados relativos aos investimentos retirados por substituição do sistema de incentivos
 - 4 marcos e metas criados associados ao novo sistema de incentivos
 - 17 marcos e metas revistos no âmbito do processo de simplificação

Impacto financeiro

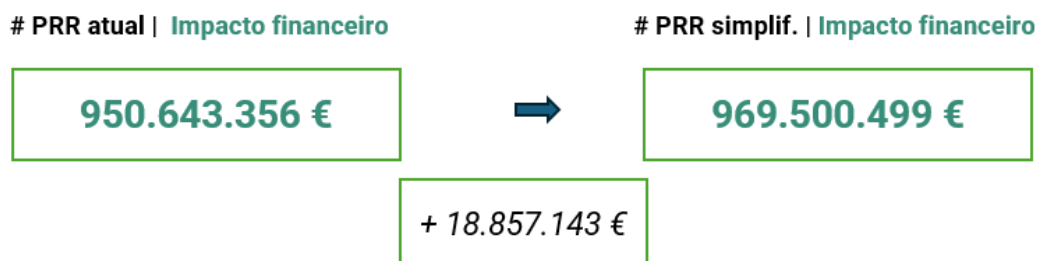

Resultados esperados

Na **Componente 21 – REPowerEU**, pretende-se obter os seguintes resultados:

- Entrada em vigor de legislação que cria o Observatório Nacional da Pobreza Energética (ONPE);
- Lançamento do instrumento financeiro para combater a pobreza energética;

- Entrada em vigor da portaria que estabelece o programa «Trabalhos & Competências Verdes» para formação de mais de 12.500 pessoas;
- Lançamento do primeiro leilão para a compra centralizada de biometano sustentável;
- Adoção do Plano de Ação para o Biometano;
- Criação da EMER 2030;
- Adoção de um calendário de atribuição de novas capacidades em matéria de energias renováveis para o desenvolvimento de projetos de energias renováveis;
- Publicação dos estudos técnicos sobre a energia eólica offshore;
- Criação do balcão único digital para o licenciamento e a monitorização de projetos de energias renováveis;
- Criação de esquemas de incentivos para o hidrogénio e gases renováveis e flexibilidade a rede e armazenamento.
- Apoio financeiro a 500 projetos adicionais de descarbonização industrial;
- Renovação de 340.000 m2 adicionais em edifícios utilizados pelo setor dos serviços;
- Renovação de 99.688 m2 de edifícios da administração pública e 540 kW de capacidade adicional de produção de energia renovável para autoconsumo em edifícios públicos na Região Autónoma da Madeira.
- Lançamento de website com 50 Espaços Cidadão Energia físicos e cursos de formação técnica;
- Formação de 500 gestores e técnicos da administração pública central, regional e local em procedimentos de licenciamento de projetos de energias renováveis e de armazenamento de energia;
- Instalação de, pelo menos, 8,75 MW de capacidade de armazenamento instalada para autoconsumo na Região Autónoma dos Açores;
- Instalação de unidades fotovoltaicas e capacidade de armazenamento de, pelo menos, 5,25 MW na Região Autónoma da Madeira;
- Capacidade instalada de energias renováveis na ilha de Porto Santo (capacidade adicional de produção de energia eólica de 7 MW e de energia solar de 4 MW ligadas à rede elétrica);

- Aquisição de 757 novos autocarros adicionais com nível nulo de emissões (elétricos ou a hidrogénio) utilizados para transporte público e 15 novos autocarros na Região Autónoma da Madeira, incluindo abate de 400 veículos;
- Construção de uma linha de trânsito rápido de autocarros em Braga (linha vermelha);
- Construção de um funicular na Nazaré.



RECUPERAR
PORTUGAL



ANEXO



PRR
Plano de Recuperação
e Resiliência



REPÚBLICA
PORTUGUESA



Financiado pela
União Europeia
NextGenerationEU

Componente 1 – Serviço Nacional de Saúde

#	Medida	Inv. / Ref.	Target / Milest.	Subv. / Emp.	Benef.	PP	Descrição	Exercício simplificação	Obs.
1.15	C01-i01	I	T	S	ACSS, I.P.	10	Construção de 124 novas unidades de saúde	Eliminação	Fusão desta meta com Marco 1.18.
1.16	C01-i01	I	M	S	ACSS, I.P.	10	Conclusão da cobertura nacional dos programas de rastreio e diagnóstico precoce nos cuidados de saúde primários	Eliminação	Fusão deste marco com Marco 1.17.
1.17	C01-i01	I	M	S	ACSS, I.P.	10	Aumento da capacidade de resposta dos cuidados de saúde primários e alargamento dos seus domínios de intervenção	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo do marco para reduzir carga administrativa, incorporando Marco 1.16.
1.18	C01-i01	I	M	S	ACSS, I.P.	10	Remodelação das instalações e dos equipamentos de saúde para garantir a acessibilidade, a qualidade e condições de segurança nos cuidados de saúde primários	Alocação + Simplificação	Fusão deste marco com Meta 1.15 e ajustamento da alocação, nomeadamente a redução na construção de 124 para 106 novas instalações e aumento de 347 para 386 requalificações, mantendo-se a dotação financeira. Simplificação através da transformação do marco em meta e ajustamento do descritivo para reduzir carga administrativa.
1.19	C01-i01	I	M	S	ACSS, I.P.	10	Reforço dos cuidados assentes na comunidade e das intervenções domiciliárias e comunitárias	Aumento ambição + Eliminação	Aumento de ambição de 34 para 39 viaturas a adquirir com a inclusão de beneficiários finais. Impacto financeiro de cerca de 1.7 M€. Eliminação de acordo com linhas orientadoras da CE (custos < 10%).

Componente 1 – Serviço Nacional de Saúde

#	Medida	Inv. / Ref.	Target / Milest.	Subv. / Emp.	Benef.	PP	Descrição	Exercício simplificação	Obs.
1.21	C01-i02	I	T	S	ACSS, I.P.	9	Reforço da capacidade de resposta com 7.400 novos lugares na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e da Rede Nacional de Cuidados Paliativos, nas vertentes de internamento e ambulatório	Redução ambição + Aumento ambição + Simplificação	Redução de ambição com a diminuição do número de novos lugares criados para 3.850 novos lugares, representando uma redução de 3.550 lugares/camas. Impacto financeiro de cerca de 112.6 M€. Aumento de ambição com o reforço da capacidade de resposta com requalificação de 6.900 lugares na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e da Rede Nacional de Cuidados Paliativos, nas vertentes de internamento e ambulatório. Impacto financeiro de cerca de 83.2 M€. O objetivo revisto integra 6.900 lugares/camas requalificadas e 3.850 novos lugares/camas, representado um objetivo final de 10.750 lugares/camas. Impacto financeiro líquido negativo de cerca de 29.4 M€.
1.23	C01-i03	I	T	S	ACSS, I.P.	9	Construção e renovação de 3 unidades e do equipamento de psiquiatria forense	Eliminação	Fusão desta meta com marco 1.25
1.25	C01-i03	I	M	S	ACSS, I.P.	9	Conclusão do reforço da rede de cuidados de saúde mental	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo do marco para reduzir carga administrativa e incorporação da meta 1.23.

Componente 1 – Serviço Nacional de Saúde

#	Medida	Inv. / Ref.	Target / Milest.	Subv. / Emp.	Benef.	PP	Descrição	Exercício simplificação	Obs.
1.26	C01-i04	I	M	S	ACSS, I.P.	10	Construção e renovação de edifícios para serviços de saúde e equipamento para hospitais	Aumento ambição + Simplificação	Aumento de ambição com a aquisição de equipamento para entidades da saúde. Impacto financeiro de cerca de 65.2 M€. Aumento de ambição com a aquisição de 4 helicópteros médios para evacuação médica e emergência. Impacto financeiro de 32.0 M€. Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo do marco para reduzir carga administrativa.
1.27	C01-i05-RAM	I	T	S	IDR, IPRAM	10	Aumento de 1.500 lugares disponíveis no sistema de hospitais comunitários do Serviço Regional de Saúde da Madeira	Eliminação	Eliminação da meta cumprindo as linhas orientadoras da CE (custos < 10%).
1.30	C01-i05-RAM	I	T	S	IDR, IPRAM	10	Aumento de 1.080 lugares em cuidados continuados integrados no Serviço Regional de Saúde da Madeira	Redução ambição + Simplificação	Redução de 1.080 para 939 lugares em cuidados continuados integrados no SRS da Madeira. Impacto financeiro de cerca de 12.7 M€. Simplificação através da passagem de meta a marco e ajustamento do seu descritivo para reduzir carga administrativa, incorporando a meta 1.31.
1.31	C01-i05-RAM	I	T	S	IDR, IPRAM	10	Renovação de 16 cuidados de saúde primários no Serviço Regional de Saúde da Madeira	Eliminação	Fusão desta meta com Meta 1.30.

Componente 1 – Serviço Nacional de Saúde

#	Medida	Inv. / Ref.	Target / Milest.	Subv. / Emp.	Benef.	PP	Descrição	Exercício simplificação	Obs.
1.34	C01-i06	I	T	S	SPMS	8	Implementação de módulos administrativos de tecnologias da informação, de módulos clínicos básicos e de módulos clínicos de emergência (15%)	Simplificação	Simplificação através da passagem de meta a marco e ajustamento do seu nome e descritivo para reduzir carga administrativa.
1.35	C01-i07-RAM	I	T	S	IDR, IPRAM	9	3.600 novos equipamentos informáticos para o Serviço Regional de Saúde da Madeira	Antecipação prazo + Simplificação	Antecipação da meta do 9.º PP para o 8.º PP, pelo facto da mesma encontrar-se concluída. Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo da meta para reduzir carga administrativa.
1.36	C01-i08-RAA	I	T	S	DRPFE	9	Maior acesso ao portal dos utentes do Serviço Regional de Saúde dos Açores (25.000 utentes individuais adicionais por ano)	Antecipação prazo + Simplificação	Antecipação da meta do 9.º PP para o 8.º PP, pelo facto da mesma encontrar-se concluída. Simplificação através da passagem de meta a marco e ajustamento do seu nome e descritivo para reduzir carga administrativa.
1.38	C01-i09	I	T	S	IPDJ, IP	9	Conclusão da execução nas escolas dos programas «Desporto Escolar Territórios» e «Desporto Escolar Sobre Rodas» (1.980 kits de bicicletas)	Antecipação prazo + Simplificação	Antecipação da meta do 9.º PP para o 8.º PP, pelo facto da mesma encontrar-se concluída. Passagem de meta a marco e ajustamento do seu nome e descritivo para reduzir carga administrativa.
1.39	C01-i09	I	M	S	IPDJ, IP	9	Lançamento da campanha nacional para o Sistema Universal de Apoio à Vida Ativa e a plataforma tecnológica conexa	Antecipação prazo + Simplificação	Antecipação do marco do 9.º PP para o 8.º PP, pelo facto do mesmo encontrar-se concluído. Ajustamento do nome e descritivo do marco para reduzir carga administrativa.

Componente 1 – Serviço Nacional de Saúde

#	Medida	Inv. / Ref.	Target / Milest.	Subv. / Emp.	Benef.	PP	Descrição	Exercício simplificação	Obs.
1.43	C01-i10	I	T	S	ACSS, I.P.	10	Aquisição de equipamento médico pesado	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do descritivo da meta para reduzir carga administrativa.
1.44	C01-i11- RAA	I	T	S	DRPFE	10	Modernização do Serviço Regional de Saúde dos Açores	Alocação	Mantendo-se a dotação financeira, reformulação das medidas da meta. Neste âmbito, retira-se deste investimento a renovação de um centro de saúde, 23 viaturas elétricas, 514 equipamentos médicos e a intervenção para a criação de 8 lugares em UCC. Impacto financeiro de cerca de 8.5 M€. Inclui-se a requalificação e ampliação do Hospital da Horta. Impacto financeiro de cerca de 8.5 M€. Impacto financeiro líquido neutro.
1.45	C01-i12	I	M	E	ACSS, I.P.	10	Construção do Hospital de Lisboa Oriental	Eliminação	Eliminação do marco pelo facto de não ser possível concretizar o investimento dentro do período PRR. Impacto financeiro de 100.0 M€.

Componente 2 – Habitação

#	Medida	Inv. / Ref.	Target / Milest.	Subv. / Emp.	Benef.	PP	Descrição	Exercício simplificação	Obs.
2.3	C02-i01	I	T	S	IHRU, I. P.	10	Programa de apoio ao acesso à habitação — disponibilização às famílias de 20.209 habitações adquiridas, construídas (eficiência energética elevada) ou reabilitadas	Aumento ambição + Simplificação	Aumento da ambição com a inclusão adicional de 592 habitações atribuídas no âmbito do programa de apoio ao acesso à habitação, totalizando 20.801 habitações. Impacto financeiro de cerca de 32.0 M€. Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo da meta para reduzir carga administrativa.
2.7	C02-i02	I	T	S	IHRU, I. P.	10	Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário — 2.000 alojamentos prontos	Redução ambição + Simplificação	Redução de ambição da entrega de 2.000 para 1.800 alojamentos. Impacto financeiro de cerca de 16.2 M€. Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo da meta para reduzir carga administrativa, incorporando a Meta 2.8.
2.8	C02-i02	I	T	S	IHRU, I. P. / PSP / Exército Português	10	Alojamento entregue às forças de segurança e alojamento temporário fornecido por razões humanitárias ou de segurança (804 habitações) Sete centros de alojamento temporário por razões humanitárias ou de segurança Alojamento entregue às forças armadas referente a alojamento temporário fornecido por razões humanitárias ou de segurança (427 habitações)	Redução ambição + Eliminação	Redução de ambição no n.º de centros de alojamento temporário por razões humanitárias ou de segurança de 7 para 3. Impacto financeiro de cerca de 31.2 M€. Simplificação através do ajustamento do descritivo da meta para reduzir carga administrativa, através da fusão com Meta 2.7.

Componente 2 – Habitação

#	Medida	Inv. / Ref.	Target / Milest.	Subv. / Emp.	Benef.	PP	Descrição	Exercício simplificação	Obs.
2.11	C02-i03-RAM	I	T	S	IDR, IPRAM	10	Habitação apoiada na Região Autónoma da Madeira (805 habitações atribuídas)	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo da meta para reduzir carga administrativa.
2.12	C02-i03-RAM	I	T	S	IDR, IPRAM	10	325 habitações ocupadas por proprietários privados e habitações públicas renovadas, incluindo com melhoria da eficiência energética	Redução ambição + Eliminação	Redução de ambição de 325 para 251 habitações ocupadas por proprietários privados e habitações públicas renovadas devido a fraca adesão das famílias. Impacto financeiro de cerca de 1.4 M€. Utilizando as linhas orientadores da CE (< 10% custos), esta meta foi eliminada.
2.17	C02-i04-RAA	I	T	S	DRPFE	9	Edifícios construídos no parque habitacional público na Região Autónoma dos Açores	Extensão prazo + Simplificação	Extensão de prazo do 9.º PP para o 10.º PP. Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo da meta para reduzir carga administrativa, incorporando as Metas 2.18 e 2.31.
2.18	C02-i04-RAA	I	T	S	DRPFE	9	Intervenções no parque habitacional público na Região Autónoma dos Açores — renovação de 379 edifícios / apartamentos	Eliminação	Fusão desta meta com meta 2.17.

Componente 2 – Habitação

#	Medida	Inv. / Ref.	Target / Milest.	Subv. / Emp.	Benef.	PP	Descrição	Exercício simplificação	Obs.
2.24	C02-i05	I	T	E	IHRU, I. P.	10	Parque habitacional público a custos acessíveis — 3.500 habitações atribuídas (construídas de acordo com a norma de eficiência energética ou reabilitadas com melhoria do desempenho energético)	Aumento ambição + Simplificação	Aumento da ambição com a inclusão adicional de 908 habitações atribuídas no âmbito do Programa 1.º Direito. A fusão da meta 2.32 implica o acréscimo de 5.791 habitações, igualmente ao abrigo do Programa 1.º Direito. No seu conjunto, esta meta inclui 10.199 habitações decorrentes do Programa 1.º Direito e do Programa de apoio ao acesso à habitação. Impacto financeiro de cerca de 49.1 M€. Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo da meta para reduzir carga administrativa.
2.28	C02-i06	I	T	E	AN ERASMUS+ EF	10	18.000 lugares para alojamento estudantil a custos acessíveis	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do descritivo da meta para reduzir carga administrativa.
2.30	C02-i07-RAA	I	T	S	DRPFE	10	145 infraestruturas de parcelas de terreno	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do descritivo da meta para reduzir carga administrativa.
2.31	C02-i08-RAA	I	T	S	DRPFE	9	Reforço do parque habitacional social da Região Autónoma dos Açores — habitações construídas (77 habitações construídas)	Eliminação	Fusão desta meta com Meta 2.17.
2.32	C02-i09	I	T	E	IHRU, I.P.	10	Programa de apoio ao acesso à habitação (empréstimo) — + 5.791 habitações adquiridas, construídas (eficiência energética elevada) ou reabilitadas (com melhor desempenho energético) e disponibilizadas a famílias	Eliminação	Fusão desta meta com Meta 2.24.

Componente 3 – Respostas sociais

#	Medida	Inv. / Ref.	Target / Milest.	Subv. / Emp.	Benef.	PP	Descrição	Exercício simplificação	Obs.
3.1	C03-i01	I	T	S	ISS, IP	10	Entrega de 2.500 veículos elétricos	Redução ambição + Simplificação	Redução de ambição de 2.500 veículos elétricos para 2.000 veículos devido à diminuição das condições de elegibilidade com o decorrer do tempo e difícil aplicação da medida em todo o território nacional. Impacto financeiro de cerca de 15.5 M€. Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo da meta para reduzir carga administrativa.
3.4	C03-i01	I	T	S	ISS, IP	10	Criação de 42.142 novos lugares e renovação de lugares existentes em equipamentos sociais	Redução ambição + Simplificação	Redução de ambição com a passagem de 42.142 para 28.000 lugares existentes em equipamentos sociais decorrente do atraso na conclusão de algumas obras dentro do período elegível para o PRR. Impacto financeiro de cerca de 157.1 M€. Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo da meta para reduzir carga administrativa.
3.5	C03-i01	I	T	S	ISS, IP	10	63.825 utentes ou funcionários dos serviços de apoio domiciliário que recebem acesso a táboletes ou outro equipamento informático e de comunicação, equipamento de apoio técnico ou formação.	Eliminação	Eliminação da meta por não ser possível a sua concretização dentro do período PRR. Impacto financeiro de cerca de 21.2 M€.

Componente 3 – Respostas sociais

#	Medida	Inv. / Ref.	Target / Milest.	Subv. / Emp.	Benef.	PP	Descrição	Exercício simplificação	Obs.
3.7	C03-i02	I	T	S	INR, I.P.	9	Habitações com melhoria da acessibilidade para pessoas com deficiência (total de 1.000 habitações)	Redução ambição + Simplificação	Redução de ambição do n.º total de habitações de 1.000 para 500. Impacto financeiro de cerca de 5.9 M€. Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo da meta para reduzir carga administrativa, incorporando Meta 3.9.
3.8	C03-i02	I	T	S	INR, I.P.	9	Espaço público com melhoria da acessibilidade para pessoas com deficiência (200.000 m2)	Redução ambição + Simplificação	Redução de ambição de 200.000 m2 para 75.000 m2 de intervenções em espaço público com melhoria da acessibilidade para pessoas com deficiência devido a um conjunto relevante de desistências por parte dos beneficiários finais. Impacto financeiro de cerca de 18.4 M€. Redução de ambição do n.º de veículos elétricos para pessoas com mobilidade reduzida entregues aos Municípios de 2.000 para 565. Impacto financeiro de cerca de 4.3 M€. Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo da meta para reduzir carga administrativa, utilizando igualmente as linhas orientadoras da CE (< 10% custos).

Componente 3 – Respostas sociais

#	Medida	Inv. / Ref.	Target / Milest.	Subv. / Emp.	Benef.	PP	Descrição	Exercício simplificação	Obs.
3.9	C03-i02	I	T	S	INR, I.P.	9	Serviços públicos com melhoria da acessibilidade para pessoas com deficiência (1.500 instalações)	Redução ambição + Eliminação	Redução de ambição de 1.500 para 750 instalações de serviços públicos que beneficiam de intervenções para melhorar as condições de acesso para pessoas com deficiência devido a fraca adesão do mercado. Impacto financeiro de cerca de 5.9 M€. Simplificação através do ajustamento do descritivo da meta para reduzir carga administrativa, incorporando a mesma na Meta 3.7.
3.10	C03-i03- RAM	I	T	S	IDR, IPRAM	10	910 vagas novas e reabilitadas em lares residenciais e não residenciais	Redução ambição + Simplificação	Redução de ambição do número de vagas novas e reabilitadas disponíveis em lares residenciais e não residenciais na Região Autónoma da Madeira de 910 para 582, tendo por base o nível de maturidade das obras (construções e renovações) associadas. Impacto financeiro de cerca de 32.8 M€. Simplificação através do ajustamento do descritivo da meta para reduzir carga administrativa.
3.12	C03-i04- RAA	I	T	S	DRPFE	9	Formação para 2.500 membros de famílias abrangidas pelo Rendimento Social de Inserção	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo da meta para reduzir carga administrativa.

Componente 3 – Respostas sociais

#	Medida	Inv. / Ref.	Target / Milest.	Subv. / Emp.	Benef.	PP	Descrição	Exercício simplificação	Obs.
3.13	C03-i04- RAA	I	T	S	DRPFE	10	124 novas vagas para pessoas com deficiência em centros de cuidados de apoio a pessoas com deficiência	Redução ambição + Simplificação	Redução de ambição de 124 para 103 novas vagas para pessoas com deficiência em centros de cuidados de apoio a pessoas com deficiência na Região Autónoma dos Açores, de acordo com o nível de maturidade dos projetos. Impacto financeiro de cerca de 0.6 M€. Simplificação através do ajustamento do nome, indicador e descritivo para reduzir carga administrativa.
3.14	C03-i04- RAA	I	T	S	DRPFE	9	130 veículos adquiridos para as Instituições Particulares de Solidariedade Social	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo da meta para reduzir carga administrativa.
3.15	C03-i04- RAA	I	T	S	DRPFE	9	Projeto «Ageing in place» (425 idosos ou pessoas com deficiência)	Antecipação prazo + Simplificação	Antecipação do 9.º PP para 8.º PP pelo facto desta meta encontrar-se cumprida. Simplificação através da passagem de meta a marco e ajustamento do seu descritivo para reduzir carga administrativa.
3.16	C03-i04- RAA	I	T	S	DRPFE	9	Medidas de combate ao abandono escolar precoce de 11.561 crianças e jovens	Simplificação	Simplificação através da passagem de meta a marco e ajustamento do seu nome e descritivo para reduzir carga administrativa.
3.19	C03-i05	I	M	S	INR, I.P.	9	Centro de atendimento telefónico para Língua Gestual Portuguesa	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do descritivo do marco para reduzir carga administrativa.

Componente 3 – Respostas sociais

#	Medida	Inv. / Ref.	Target / Milest.	Subv. / Emp.	Benef.	PP	Descrição	Exercício simplificação	Obs.
3.26	C03-i06	I	T	S	AML / AMP / ACSS	9	Aplicação de medidas sociais (225.000.000 EUR)	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo da meta para reduzir carga administrativa.
3.27	C03-i03-RAM	I	T	S	IDR, IPRAM	9	90 vagas em estruturas de apoio a pessoas em situação de sem-abrigo	Simplificação	Simplificação através da passagem de meta a marco e respetivo ajustamento do nome e descritivo para reduzir carga administrativa.
3.28	C03-i07-RAA	I	T	S	DRPFE	10	117 vagas novas ou reabilitadas em estruturas residenciais para pessoas idosas	Redução ambição + Simplificação	Redução de ambição do n.º de vagas novas ou reabilitadas em estruturas residenciais para pessoas idosas de 117 para 113. Impacto financeiro de cerca de 2.8 M€. Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo da meta para reduzir carga administrativa.
3.29	C03-r38	R	M	S	-	8	Relatório do grupo de trabalho sobre a Prestação Social Única	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo do marco para reduzir carga administrativa.
3.30	C03-r38	R	M	S	-	10	Entrada em vigor da prestação social única (ao abrigo do sistema de proteção social da cidadania) e do Código das Prestações Sociais	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo do marco para reduzir carga administrativa.

Componente 4 – Cultura

#	Medida	Inv. / Ref.	Target / Milest.	Subv. / Emp.	Benef.	PP	Descrição	Exercício simplificação	Obs.
4.2	C04-i01	I	T	S	GEPAC	9	Apoio financeiro para a transição digital de 200 livrarias/estabelecimentos	Redução ambição + Eliminação	Redução da ambição de 200 para 120 livrarias/estabelecimentos, pela fraca adesão do mercado. Impacto financeiro de cerca de 1.5 M€. Utilizando as linhas orientadores da CE (< 10% custos), esta meta foi eliminada.
4.3	C04-i01	I	M	S	GEPAC	9	Digitalização e virtualização de coleções públicas	Redução ambição + Simplificação	Redução da ambição de 45.000 para 5.949 horas de conteúdos de cassetes vídeo relativa a arquivos dos fornecedores históricos de comunicação social e de radiodifusão televisiva, pela fraca procura no mercado. Impacto financeiro de cerca de 8.7 M€. Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo do marco para reduzir carga administrativa.
4.4	C04-i01	I	M	S	GEPAC	10	Entrega de infraestruturas tecnológicas modernizadas para a rede de equipamentos culturais	Simplificação	Simplificação através da passagem de marco a meta e ajustamento do seu nome e descritivo para reduzir carga administrativa, incorporando a Meta 4.10.

Componente 4 – Cultura

#	Medida	Inv. / Ref.	Target / Milest.	Subv. / Emp.	Benef.	PP	Descrição	Exercício simplificação	Obs.
4.5	C04-i01	I	T	S	GEPAC	9	Apoio financeiro para a tradução e edição de 2.250 obras literárias	Redução ambição + Eliminação	Redução da ambição de 2.250 para 900 obras literárias com apoio financeiro para a tradução e edição, pela fraca adesão do mercado. Impacto financeiro de cerca de 5.0 M€. Utilizando as linhas orientadores da CE (< 10% custos), esta meta foi eliminada.
4.8	C04-i02	I	T	S	FSPC	10	Conclusão de 84 obras de requalificação e conservação de edifícios que são património cultural e de teatros nacionais	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo da meta para reduzir carga administrativa, incorporando o Marco 4.12.
4.10	C04-i01	I	T	S	GEPAC	10	Fornecimento de equipamento para a instalação do Arquivo Nacional do Som e para a modernização tecnológica dos laboratórios públicos	Eliminação	Fusão desta meta com Marco 4.4.
4.11	C04-i02	I	M	S	FSPC	9	Criação de laboratórios e rotas da iniciativa «Saber Fazer» e criação de atividades pedagógicas e informativas sobre técnicas tradicionais	Eliminação	Eliminação deste marco no âmbito das linhas orientadoras da CE (custos < 10%).
4.12	C04-i02	I	M	S	FSPC	10	Conclusão da construção do Arquivo Nacional do Som	Eliminação	Fusão deste marco com Meta 4.8.

Componente 5 – Investimento e Inovação

#	Medida	Inv. / Ref.	Target / Milest.	Subv. / Emp.	Benef.	PP	Descrição	Exercício simplificação	Obs.
5.6	C05-i01	I	T	S	IAPMEI	10	Conclusão de 366 produtos, processos ou serviços em áreas estratégicas relevantes	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo da meta para reduzir carga administrativa.
5.10	C05-i02	I	T	S	ANI	9	Benefício pelas empresas dos serviços prestados pelas entidades de interface, incluindo Laboratórios Colaborativos - CoLAB	Aumento ambição + Simplificação	Aumento de ambição, passando de 500 para 560 empresas beneficiadas. Impacto financeiro de 21.6 M€. Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo da meta para reduzir carga administrativa.
5.12	C05-i03	I	T	S	IFAP	9	Conclusão de 100 projetos de inovação e investigação focalizados nos aspetos ecológicos da Agenda de Inovação para a Agricultura 2030	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo da meta para reduzir carga administrativa, incorporando a Meta 5.13.
5.13	C05-i03	I	T	S	IFAP	9	Conclusão de 5 projetos estruturais centrados nos aspetos digitais da Agenda de Inovação para a Agricultura 2030	Eliminação	Fusão desta meta com a Meta 5.12.
5.14	C05-i03	I	T	S	IFAP	9	Renovação/requalificação de 24 polos de inovação agrícola	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo da meta para reduzir carga administrativa.
5.17	C05-i04-RAA	I	T	S	DRPFE	10	Transferência de um montante total de 95 000 000 EUR para as empresas não financeiras da região, sob a forma de apoio de capital ou quase-capital	Redução ambição + Simplificação	Redução de ambição com a diminuição do montante a transferir para as empresas não financeiras, por não se concretizar o lançamento de avisos para aferir o grau de resposta do mercado. Impacto financeiro de 50 M€. Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo da meta para reduzir carga administrativa.

Componente 5 – Investimento e Inovação

#	Medida	Inv. / Ref.	Target / Milest.	Subv. / Emp.	Benef.	PP	Descrição	Exercício simplificação	Obs.
5.19	C05-i05-RAA	I	T	S	DRPFE	9	2 estruturas novas (para substituir estruturas obsoletas) ou requalificadas para o abate de animais e certificação da qualidade do leite e da segurança dos alimentos	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo da meta para reduzir carga administrativa.
5.20	C05-i05-RAA	I	T	S	DRPFE	9	11 projetos apoiados no âmbito de regimes de apoio à reestruturação de empresas do setor da transformação e comercialização	Antecipação prazo + Simplificação	Antecipação do prazo da meta do 9.º PP para o 8.º PP, pelo facto da mesma encontrar-se cumprida. Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo da meta para reduzir carga administrativa, incorporando a Meta 5.21.
5.21	C05-i05-RAA	I	T	S	DRPFE	9	213 projetos apoiados no âmbito de regimes de apoio à reestruturação das explorações agrícolas	Eliminação	Fusão desta meta com Meta 5.20.
5.22	C05-i05-RAA	I	T	S	DRPFE	9	Apoios técnicos especializados entregues a explorações agrícolas ao abrigo do Programa de Capacitação dos Agricultores	Eliminação	Eliminação da meta de acordo com as linhas orientadoras da CE (custos < 10%).
5.29	C05-i06	I	T	E	BPF	10	Entrega, por um instrumento de capitalização, de um total de 850 000 000 EUR a empresas não financeiras estabelecidas e/ou ativas em Portugal, sob a forma de apoio de capital ou quasecapital, em consonância com a política de investimento do instrumento	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo da meta para reduzir carga administrativa.
5.32	C05-i06	I	T	E	BPF	10	Foram aprovadas pelo Comité de Investimento InvestEU 100 % das garantias disponibilizadas pelo aumento de capital	Simplificação	Simplificação através da passagem de meta a marco e ajustamento do seu nome e descritivo para reduzir carga administrativa.
5.34	C05-i07-RAM	I	T	S	IDR, IPRAM	9	Garantias de empréstimo para apoio a projetos de empresas regionais (15.900.000 EUR)	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do descritivo da meta para reduzir carga administrativa.

Componente 5 – Investimento e Inovação

#	Medida	Inv. / Ref.	Target / Milest.	Subv. / Emp.	Benef.	PP	Descrição	Exercício simplificação	Obs.
5.35	C05-i08	I	T	S	FCT	9	Conclusão do «Campus Ciência XXI» e do «Balcão de Ciência» e prestação de serviços através do Programa Nacional para a Ciência Aberta e Dados Abertos de Investigação (PNCADAI)	Simplificação	Simplificação através da passagem de meta a marco e ajustamento do seu nome e descritivo para reduzir carga administrativa.
5.36	C05-i08	I	T	S	FCT	10	Conclusão de 94 projetos financiados no âmbito do programa de I&D na administração pública [incluindo nos domínios da inteligência artificial (IA), da cibersegurança e da ciência dos dados]. Conclusão e entrada em funcionamento de seis soluções de IA para processos da administração pública. 50 novos cursos oferecidos através da plataforma nacional de cursos massivos online (NAU).	Simplificação	Simplificação através da passagem de meta a marco e ajustamento do seu nome e descritivo para reduzir carga administrativa.
5.38	C05-i08	I	M	S	FCT	10	Conclusão da infraestrutura de apoio e do centro de dados do Centro Nacional de Computação Avançada e desenvolvimento de um modelo linguístico de grande dimensão (LLM) para o português de Portugal	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo do marco para reduzir carga administrativa.
5.45	C05-i11	I	T	E	IAPMEI	10	Conclusão de 593 produtos, processos ou serviços	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo da meta para reduzir carga administrativa.
5.48	C05-i16	I	M	E	BPF	8	Assinatura do acordo de contribuição entre o Governo de Portugal e a Comissão Europeia	-	-
5.49	C05-i16	I	T	E	BPF	10	Operações de financiamento ou investimento aprovadas pelo Comité de Investimento InvestEU	Antecipação prazo	Antecipação do prazo da meta do 10.º PP para o 9.º PP.

Componente 5 – Investimento e Inovação

#	Medida	Inv. / Ref.	Target / Milest.	Subv. / Emp.	Benef.	PP	Descrição	Exercício simplificação	Obs.
5.50	C05-i13	I	T	S	FCT	10	Aquisição de equipamento ou conclusão de projetos de renovação e/ou modernização de unidades de investigação (110.000.000 EUR)	Aumento ambição + Simplificação	Aumento de ambição com aumento de dotação de 50 M€, de 110 M€ para 160 M€, para aquisição de equipamento ou conclusão de projetos de renovação e/ou modernização de unidades de investigação. Impacto financeiro de 50 M€. Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo da meta para reduzir carga administrativa.
5.51	C05-i14	I	M	S	BPF	8	Acordo de execução	-	-
5.52	C05-i14	I	T	S	BPF	10	Acordos jurídicos assinados com os beneficiários finais e o ministério para conclusão do investimento (Portugal deve transferir 315 146 000 EUR para o Banco Português de Fomento, destinados ao Mecanismo)	Aumento ambição	Aumento de ambição com aumento de dotação proveniente da libertação de dotação de outros marcos e metas que não possam ser executados. Impacto financeiro de cerca de 632.0 M€.
5.53	C05-i15-RAA	I	M	S	DRPFE	8	Acordo de execução	-	-
5.54	C05-i15-RAA	I	T	S	DRPFE	10	Acordos jurídicos assinados com o fundo de capitais próprios e o ministério para conclusão do investimento	Aumento ambição + Simplificação	Aumento de ambição em 10 M€ através da redução de ambição da Meta 5.17. Simplificação através do ajustamento do descritivo da meta para reduzir carga administrativa.

Componente 6 – Qualificações e competências

#	Medida	Inv. / Ref.	Target / Milest.	Subv. / Emp.	Benef.	PP	Descrição	Exercício simplificação	Obs.
6.2	C06-i01	I	T	S	IGeFE	9	365 Centros Tecnológicos Especializados renovados ou construídos	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo da meta para reduzir carga administrativa.
6.4	C06-i01	I	T	S	IEFP	9	111 Centros de formação renovados, construídos ou dotados de equipamentos adquiridos	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do descritivo da meta para reduzir carga administrativa.
6.6	C06-i03	I	T	S	ANQEP, I.P.	9	145.500 participantes em medidas de apoio à melhoria das qualificações dos adultos	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo da meta para reduzir carga administrativa.
6.7	C06-i04	I	T	S	DGES	9	650 Clubes Ciência Viva	Antecipação de prazo + Simplificação	Antecipação de prazo do 9.º PP para 8.º PP, pelo facto da meta encontrar-se cumprida. Simplificação através do ajustamento do descritivo da meta para reduzir carga administrativa.
6.8	C06-i04	I	T	S	DGES	8	Número adicional de estudantes formados em cursos do ensino superior em domínios CTEAM (+7.500)	Eliminação	Eliminação da meta de acordo com as linhas orientadoras da CE (meta intermédia). Fusão desta meta com meta final 6.9.
6.9	C06-i04	I	T	S	DGES	9	Número adicional de estudantes formados em cursos do ensino superior em CTEAM (+2.500)	Antecipação prazo + Simplificação	Antecipação de prazo do 9.º PP para 8.º PP, pelo facto da meta encontrar-se cumprida. Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo da meta para reduzir carga administrativa.

Componente 6 – Qualificações e competências

#	Medida	Inv. / Ref.	Target / Milest.	Subv. / Emp.	Benef.	PP	Descrição	Exercício simplificação	Obs.
6.10	C06-i05-RAA	I	T	S	DRPFE	9	953 adultos matriculados no ensino pós-secundário e superior	Antecipação prazo + Simplificação	Antecipação de prazo do 9.º PP para o 8.º PP, pelo facto da meta encontrar-se cumprida. Simplificação através da passagem de meta a marco e ajustamento do seu nome e descritivo para reduzir carga administrativa.
6.11	C06-i05-RAA	I	T	S	DRPFE	9	17 Escolas profissionais melhoradas na Região Autónoma dos Açores	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo da meta para reduzir carga administrativa.
6.12	C06-r14	R	M	S	-	9	Abertura de 20.000 vagas para formação	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo do marco para reduzir carga administrativa.
6.19	C06-i06	I	T	S	FCT	10	Apoio a 255 contratos permanentes com investigadores doutorados no âmbito da FCT-Tenure e apoio a investigadores no âmbito do ERC Portugal	Redução ambição + Simplificação	Redução de ambição, passando de 25 para 12 contratos para apoio a investigadores no âmbito do ERC Portugal. Impacto financeiro de cerca de 7.2 M€. Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo da meta para reduzir carga administrativa, incorporando marco 6.20.
6.20	C06-i06	I	M	S	FCT	10	Parcerias Internacionais em Ciência, Tecnologia e Inovação: apoio a parcerias internacionais, apoio a projetos de I&I, apoio à mobilidade internacional	Eliminação	Fusão deste marco com meta 6.19

Componente 6 – Qualificações e competências

#	Medida	Inv. / Ref.	Target / Milest.	Subv. / Emp.	Benef.	PP	Descrição	Exercício simplificação	Obs.
6.21	C06-i07	I	T	S	DGES	10	Modernização tecnológica e digital das ciências agrárias: Reforma curricular das ciências agrárias, abertura das escolas agrícolas aos alunos do ensino secundário e requalificação dos profissionais	Eliminação	Fusão desta meta com Meta 6.23.
6.22	C06-i07	I	T	S	DGES	10	Modernização da medicina (12.500 estudantes e profissionais)	Eliminação	Fusão desta meta com Meta 6.23.
6.23	C06-i07	I	T	S	DGES	10	Reforçar as competências digitais (11.750 jovens e adultos de áreas não CTEAM)	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo da meta para reduzir carga administrativa, incorporando metas 6.21 e 6.22.
6.25	C06-i07	I	T	S	DGES	10	Inovação e modernização pedagógica no ensino superior	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome, indicador e descritivo da meta para reduzir carga administrativa.
6.29	C06-i09	I	T	E	CCDRs / Exército Português	10	75 escolas construídas ou renovadas 2 escolas públicas devem ser construídas ou renovadas e estar prontas para utilização	Aumento ambição + Simplificação	Aumento de ambição do n.º de escolas construídas e renovadas de 77 para 87 escolas. Impacto financeiro de cerca de 60.0 M€. Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo da meta para reduzir carga administrativa.

Componente 7 – Infraestruturas

#	Medida	Inv. / Ref.	Target / Milest.	Subv. / Emp.	Benef.	PP	Descrição	Exercício simplificação	Obs.
7.3	C07-i00	I	T	S	MOBle	9	Pontos públicos de carregamento de veículos (+ 4.550)	Simplificação	Simplificação através de ajustamento do descritivo da meta para reduzir carga administrativa.
7.5	C07-i06	I	T	E	CCDRs	9	Conclusão das intervenções em 10 áreas de acolhimento empresarial selecionadas	Redução ambição + Simplificação	Redução de ambição do número de áreas de acolhimento empresarial de 10 para 8. Impacto financeiro de cerca de 22.0 M€. Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo da meta para reduzir carga administrativa.
7.8	C07-i02	I	T	S	IP / CCDRs	9	Estradas construídas ou reabilitadas (111 km)	Simplificação	Simplificação através de ajustamento do nome e descritivo da meta para reduzir carga administrativa.
7.10	C07-i03	I	T	E	IP / CCDRs	9	Estradas construídas ou reabilitadas (30 km)	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo da meta para reduzir carga administrativa, incorporando Meta 7.12.
7.12	C07-i04	I	T	E	IP / CCDRs	9	Estradas construídas ou reabilitadas (42 km)	Eliminação	Fusão desta meta com Meta 7.10.
7.15	C07-i05-RAA	I	T	S	DRPFE	10	Estradas construídas ou reabilitadas (34,38 km)	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo da meta para reduzir carga administrativa.

Componente 8 – Florestas

#	Medida	Inv. / Ref.	Target / Milest.	Subv. / Emp.	Benef.	PP	Descrição	Exercício simplificação	Obs.
8.1	C08-i01	I	T	S	DGT	9	Desenvolvimento de Programas de Reordenamento e Gestão da Paisagem (PRGP) nos territórios definidos como vulneráveis	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo da meta para reduzir carga administrativa.
8.3	C08-i01	I	T	S	FA	8	600 aldeias com projetos de gestão de combustível	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo da meta para reduzir carga administrativa.
8.6	C08-i02	I	M	S	DGT / ICNF	10	Produção de cartografia de referência para o Sistema de Monitorização de Ocupação do Solo (SMOS)	Redução ambição + Simplificação	Redução de ambição dos requisitos “(iii) mapas de vegetação” e “(iv) mapas de biomassa e madeira” por não ser possível a sua concretização dentro do período PRR. Impacto financeiro de 1.6 M€. Simplificação com ajustamento do nome e descritivo do marco para reduzir carga administrativa.
8.8	C08-i03	I	T	S	ICNF	9	Área de servidão constituída (21.727 ha)	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo da meta para reduzir carga administrativa.
8.9	C08-i03	I	T	S	ICNF	9	Implementação da rede primária de faixas de gestão de combustível (RPFGC) (21.000 ha)	Extensão prazo + Simplificação	Extensão do prazo do 9.º PP para o 10.º PP para conclusão desta meta. Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo da meta para reduzir carga administrativa.

Componente 8 – Florestas

#	Medida	Inv. / Ref.	Target / Milest.	Subv. / Emp.	Benef.	PP	Descrição	Exercício simplificação	Obs.
8.11	C08-i04	I	T	S	FAP	9	Entrega de 11 helicópteros bombardeiros ligeiros e médios	Extensão prazo + Simplificação	Extensão do prazo do 9.º PP para o 10.º PP para assegurar cumprimento da meta. Simplificação com ajustamento do nome e descritivo da meta para reduzir carga administrativa.
8.16	C08-i05	I	T	S	FA	9	Implementação de um programa de formação nacional (150 técnicos)	Eliminação	Eliminação da meta de acordo com as linhas orientadoras da CE (custos < 10%).
8.20	C08-i01	I	T	S	IFAP	9	Execução das medidas de emparcelamento rural Programa «Emparcelar para Ordenar» (2.000 ha)	Redução ambição + Simplificação	Redução de ambição pela impossibilidade de concretização da totalidade do investimento dentro do período PRR. Impacto financeiro de 7.5 M€. Simplificação através da passagem de meta a marco e respetivo ajustamento do nome e descritivo para reduzir carga administrativa.
8.22	C08-i05	I	T	S	INIAV / ICNF	10	Aplicação de medidas no domínio da prevenção de incêndios rurais e do reforço das capacidades nas zonas do setor florestal	Aumento ambição + Simplificação	Aumento de ambição para aquisição, no total, de 134 unidades de equipamento para gestão florestal. Impacto financeiro total de 9.1 M€. Simplificação do nome e descritivo da meta para reduzir carga administrativa. Simplificação adicional de acordo com linhas orientadoras da CE (custos < 10%).

Componente 9 – Gestão hídrica

#	Medida	Inv. / Ref.	Target / Milest.	Subv. / Emp.	Benef.	PP	Descrição	Exercício simplificação	Obs.
9.1	C09-i01	I	T	S	APA, IP	8	Instalação de 50 pontos adicionais para a monitorização dos recursos hídricos subterrâneos (SM3)	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo da meta para reduzir carga administrativa.
9.2	C09-i01	I	T	S	AMAL	10	Conclusão das intervenções nas redes para reduzir as perdas de água (SM1) (125 km)	Simplificação	Simplificação através da passagem de meta a marco e ajustamento do seu nome e descritivo para reduzir carga administrativa.
9.3	C09-i01	I	T	S	FA	10	Modernização de superfícies de aproveitamentos hidroagrícolas coletivos e de regadio individual (SM2) (10.300 ha)	Simplificação	Simplificação através da passagem de meta a marco e ajustamento do seu nome e descritivo para reduzir carga administrativa.
9.4	C09-i01	I	T	S	AdA	10	4 estações de tratamento para assegurar a produção e a afinação de águas residuais tratadas (SM4)	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo da meta para reduzir carga administrativa.
9.12	C09-i03-RAM	I	T	S	IDR, IPRAM	8	53 Km adicionais de condutas renovadas ou reabilitadas	Eliminação	Fusão desta meta com Meta 9.13.
9.13	C09-i03-RAM	I	T	S	IDR, IPRAM	9	Volume adicional de água disponibilizado na parte sul da ilha da Madeira para abastecimento público e irrigação (4 hm3)	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo da meta para reduzir carga administrativa, incorporando a Meta 9.12.
9.14	C09-i05	I	T	S	EDIA	10	Capacidade de produção adicional e operacional de energia fotovoltaica na albufeira da barragem de Alqueva (43 MW)	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo da meta para reduzir carga administrativa.

Componente 9 – Gestão hídrica

#	Medida	Inv. / Ref.	Target / Milest.	Subv. / Emp.	Benef.	PP	Descrição	Exercício simplificação	Obs.
9.15	C09-i01	I	M	S	AdA	10	Reforço das interconexões hídricas	Redução de ambição + Simplificação	Redução de ambição com a eliminação das obras de reforço da interligação entre Chão das Donas e a ETA de Fontainhas por não serem concretizáveis dentro do período PRR. Impacto financeiro de 8.2 M€. Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo para reduzir carga administrativa.

Componente 10 – Mar

#	Medida	Inv. / Ref.	Target / Milest.	Subv. / Emp.	Benef.	PP	Descrição	Exercício simplificação	Obs.
10.2	C10-i01	I	M	S	Fundo Azul	9	Conclusão da modernização da Escola do Polo Azul	Eliminação	Fusão deste marco com Meta 10.3.
10.3	C10-i01	I	T	S	Fundo Azul	10	Conclusão da instalação e/ou requalificação de 7 polos azuis	Redução ambição + Simplificação	Redução de ambição pelo facto de não ser possível a concretização do Hub da Figueira da Foz dentro do período PRR. Impacto financeiro de cerca de 18.3 M€. Simplificação através da passagem de meta a marco e ajustamento do nome e descritivo para reduzir carga administrativa, incorporando o Marco 10.2.
10.4	C10-i02	I	T	S	IFAP	9	Aprovação dos relatórios finais relativos a 82 projetos que apoiam a inovação, a transição energética e a redução do impacto ambiental para entidades do setor da pesca	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo da meta para reduzir carga administrativa.
10.7	C10-i03	I	M	E	Marinha/AMN	10	Receção e aceitação da «Plataforma Naval de Natureza Multifuncional» e do «Centro de Operações»	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo do marco para reduzir carga administrativa.
10.9	C10-i04-RAA	I	M	S	DRPFE	9	Entrega de um navio de investigação	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo do marco para reduzir carga administrativa, incorporando o Marco 10.11 e, dessa forma, alterando-se o prazo para o 10.º PP.
10.10	C10-i04-RAA	I	M	S	DRPFE	10	Entrada em funcionamento do centro experimental de investigação e desenvolvimento ligado ao mar nos Açores (centro MARTEC)	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo do marco para reduzir carga administrativa.

Componente 10 – Mar

#	Medida	Inv. / Ref.	Target / Milest.	Subv. / Emp.	Benef.	PP	Descrição	Exercício simplificação	Obs.
10.11	C10-i04-RAA	I	M	S	DRPFE	10	Fornecimento de 2 módulos para o novo navio de investigação	Eliminação	Fusão deste marco com Marco 10.9.
10.12	C10-i05-RAA	I	T	S	DRPFE	10	Conclusão de 15 projetos no setor das pescas e da aquicultura	Simplificação	Simplificação através da passagem de meta a marco e ajustamento do seu nome e descritivo para reduzir carga administrativa.
10.14	C10-i06-RAM	I	M	S	IDR, IPRAM	10	Entrega do navio de investigação multifuncional eficiente em termos energéticos	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo do marco para reduzir carga administrativa, incorporando o Marco 10.16.
10.16	C10-i06-RAM	I	M	S	IDR, IPRAM	9	Entrega de dois veículos autónomos não tripulados	Eliminação	Fusão deste marco com o Marco 10.14.
10.18	C10-i07	I	T	E	IAPMEI	10	Conclusão das intervenções em matéria de eficiência energética dos navios	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome, indicador e descritivo da meta para reduzir carga administrativa.

Componente 11 – Descarbonização da indústria

#	Medida	Inv. / Ref.	Target / Milest.	Subv. / Emp.	Benef.	PP	Descrição	Exercício simplificação	Obs.
11.3	C11-i01	I	T	S	IAPMEI	9	Apoio financeiro a 310 projetos de descarbonização industrial	Antecipação prazo + Simplificação	Antecipação de prazo do 9.º PP para 8.º PP pelo cumprimento antecipado da meta. Simplificação do nome e descritivo da meta para redução de carga administrativa.

Componente 12 – Bioeconomia

#	Medida	Inv. / Ref.	Target / Milest.	Subv. / Emp.	Benef.	PP	Descrição	Exercício simplificação	Obs.
12.3	C12-i01	I	T	S	FA	9	15 novos produtos, tecnologias e processos-piloto que integrem recursos de base biológica	Simplificação	Simplificação através da passagem de meta a marco e ajustamento do seu nome e descritivo para reduzir carga administrativa.
12.4	C12-i01	I	T	S	FA	10	Desenvolvimento de florestas de pinheiro-bravo com potencial de produção de resina (8.500 ha)	Eliminação	Eliminação de acordo com linhas orientadoras da CE (custos < 10%).
12.9	C12-r39	R	M	S	-	9	Sistema de retoma de resíduos elétricos e equipamentos eletrónicos	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo do marco para reduzir carga administrativa.
12.10	C12-i02	I	T	S	FA	9	Aumento da capacidade de recolha, reutilização, reciclagem e valorização de resíduos.	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo da meta para reduzir carga administrativa.

Componente 13 – Eficiência energética em edifícios

#	Medida	Inv. / Ref.	Target / Milest.	Subv. / Emp.	Benef.	PP	Descrição	Exercício simplificação	Obs.
13.3	C13-i01	I	T	S	FA	10	40.000 «Vales eficiência» distribuídos a agregados familiares em situação de pobreza energética para substituir equipamentos antigos e adotar soluções eficientes do ponto de vista energético	Redução ambição + Simplificação	Redução de ambição de 40.000 para 20.000 vouchers dada a fraca adesão do mercado. Impacto financeiro de cerca de 26.0 M€. Simplificação do nome e descritivo da meta para reduzir carga administrativa.
13.5	C13-i02	I	T	S	FA	9	Renovação para a eficiência energética em edifícios da administração pública central (1.255.000 m2)	Redução ambição + Simplificação	Redução de ambição de 1.255.000 m2 para 1.040.000 m2 de área renovada para ajustar à adesão do mercado. Impacto financeiro de cerca de 34.5 M€. Simplificação do descritivo da meta para reduzir carga administrativa.
13.8	C13-i03	I	M	S	FA	9	Renovação para a eficiência energética em edifícios de serviços privados (360.000 m2)	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo do marco para reduzir carga administrativa.
13.11	C13-i01	I	T	S	FA	10	Renovações de eficiência energética para agregados familiares em situação de pobreza energética (3.500 habitações)	Eliminação	Eliminação da meta para os Bairros Saudáveis (3.500 habitações) com a introdução da nova Meta 13.12. Impacto financeiro líquido negativo de 8.5 M€, considerando Meta 13.12.

Componente 13 – Eficiência energética em edifícios

#	Medida	Inv. / Ref.	Target / Milest.	Subv. / Emp.	Benef.	PP	Descrição	Exercício simplificação	Obs.
13.12	C13-i01	I	T	S	ApC	10	58.200 vouchers distribuídos a agregados familiares em situação de pobreza energética no âmbito do “Programa E-Lar”	Novo	Nova meta criada no âmbito da atribuição de 58.200 vouchers a agregados familiares, sob a forma de apoio financeiro direto a aquisição de equipamentos elétricos eficientes (“Programa E-Lar”). Com a alocação da dotação financeira da Meta 13.11, impacto financeiro líquido negativo de 8.5 M€.

Componente 14 – Hidrogénio e renováveis

#	Medida	Inv. / Ref.	Target / Milest.	Subv. / Emp.	Benef.	PP	Descrição	Exercício simplificação	Obs.
14.3	C14-i01	I	T	S	FA	10	Capacidade adicional de produção de hidrogénio renovável e gases renováveis (200 MW)	Eliminação	Eliminação da meta por contrapartida da criação das 2 novos marcos e metas relativos ao sistema de incentivos (Metas 14.16 e 14.17).
14.7	C14-i02-RAM	I	T	S	IDR, IPRAM	8	Capacidade instalada adicional em sistema de armazenamento com baterias (21 MW)	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo da meta para reduzir carga administrativa.
14.9	C14-i02-RAM	I	T	S	IDR, IPRAM	10	Instalação de 130.000 contadores inteligentes	Simplificação	Simplificação através da passagem de meta a marco e ajustamento do seu descritivo para reduzir carga administrativa.
14.10	C14-i02-RAM	I	T	S	IDR, IPRAM	9	Substituição de 8.750 pontos de iluminação pública	Eliminação	Meta removida seguindo as linhas orientadoras da CE (custos < 10%).
14.11	C14-i03-RAA	I	T	S	DRPFE	10	Capacidade instalada adicional e remodelada para produção de energia geotérmica (17 MW)	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo da meta para reduzir carga administrativa.
14.14	C14-i03-RAA	I	T	S	DRPFE	10	Instalação de centrais fotovoltaicas de pequena dimensão para produção e consumo locais de eletricidade (38.2 MW)	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo da meta para reduzir carga administrativa.
14.15	C14-i02-RAM	I	T	S	IDR, IPRAM	10	Capacidade adicional de produção	Simplificação	Simplificação através da passagem de meta a marco e ajustamento do seu nome e descritivo para reduzir carga administrativa.

Componente 14 – Hidrogénio e renováveis

#	Medida	Inv. / Ref.	Target / Milest.	Subv. / Emp.	Benef.	PP	Descrição	Exercício simplificação	Obs.
14.16	C14-i04	I	M	S	ApC	10	Sistema de incentivos ao hidrogénio renovável: entrada em vigor do acordo de implementação	Novo	Criação do sistema de incentivos ao hidrogénio renovável.
14.17	C14-i04	I	T	S	ApC	10	Sistema de incentivos ao hidrogénio renovável: assinatura de contratos com beneficiários finais	Novo	Criação do sistema de incentivos ao hidrogénio renovável.

Componente 15 – Mobilidade sustentável

#	Medida	Inv. / Ref.	Target / Milest.	Subv. / Emp.	Benef.	PP	Descrição	Exercício simplificação	Obs.
15.3	C15-i07	I	T	E	ML, E.P.E.	10	Construção de parte da extensão da linha vermelha (3.217 Km)	Eliminação	Meta removida pelo investimento não ser concretizável dentro do período PRR. Impacto financeiro de cerca de 285.2 M€.
15.6	C15-i08	I	T	E	MP	10	Construção de parte da extensão da rede de metro do Porto (5.5 Km)	Redução ambição + Simplificação	Redução de ambição pelo facto de não ser possível concretizar uma das estações dentro do período PRR, passando de 8 para 7. Impacto financeiro de cerca de 12.5 M€. Simplificação através do ajustamento do descritivo da meta para reduzir carga administrativa.
15.11	C15-i04	I	T	S	MP	8	Conclusão da construção de uma linha de serviço direto de autocarros entre a Praça do Império e a Praça Mouzinho de Albuquerque, no Porto (3.8 Km)	Simplificação	Simplificação através da passagem de meta a marco e ajustamento do seu nome e descritivo para reduzir carga administrativa.
15.16	C15-i06	I	T	S	IP	10	Linhas ferroviárias com sistemas eletrónicos de sinalização substituídos (20 Km)	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do descritivo da meta para reduzir carga administrativa.

Componente 16 – Empresas 4.0

#	Medida	Inv. / Ref.	Target / Milest.	Subv. / Emp.	Benef.	PP	Descrição	Exercício simplificação	Obs.
16.3	C16-i01	I	T	S	IEFP	9	225.000 participantes na formação do Emprego + Digital	Antecipação prazo + Simplificação	Antecipação do prazo da meta do 9.º PP para o 8.º PP, pelo facto da mesma encontrar-se cumprida. Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo da meta para reduzir carga administrativa.
16.4	C16-i01	I	T	S	IAPMEI	9	Diagnósticos da Academia Portugal Digital	Antecipação prazo + Simplificação	Antecipação do prazo da meta do 9.º PP para o 8.º PP, pelo facto da mesma encontrar-se cumprida. Simplificação através do ajustamento do nome, indicador e descritivo da meta para reduzir carga administrativa.
16.8	C16-i02	I	T	S	IAPMEI	10	Apoiar a rede nacional de Test Beds (101.000.000 EUR)	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo da meta para reduzir carga administrativa.
16.9	C16-i02	I	T	S	IAPMEI	9	75 Bairros de Comércio Digital	Extensão prazo + Simplificação	Extensão do prazo da meta do 9.º PP para o 10.º PP para permitir a conclusão da mesma. Simplificação através do ajustamento do descritivo da meta para reduzir carga administrativa.

Componente 16 – Empresas 4.0

#	Medida	Inv. / Ref.	Target / Milest.	Subv. / Emp.	Benef.	PP	Descrição	Exercício simplificação	Obs.
16.10	C16-i02	I	T	S	IAPMEI	9	PME apoiadas por aceleradoras de comércio digital	Extensão prazo + Redução ambição + Simplificação	Extensão do prazo da meta do 9.º PP para o 10.º PP para permitir a conclusão desta meta. Redução de ambição de 20.000 para 12.800 PME apoiadas. Mesmo considerando aumento do valor do voucher, impacto financeiro de cerca de 3.9 M€. Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo da meta para reduzir carga administrativa.
16.11	C16-i02	I	T	S	IAPMEI	10	PME, incubadoras e aceleradoras de empresas diretamente apoiadas	Redução ambição + Simplificação	Redução de ambição de 2.000 para 1.000 vouchers de empreendedorismo para Startups. Impacto financeiro de 30.0 M€. Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo da meta para reduzir carga administrativa.
16.12	C16-i02	I	T	S	IAPMEI	9	5.000 empresas em fase de arranque mapeadas na plataforma da Startup Portugal	Eliminação	Eliminação de acordo com linhas orientadoras da CE (custos < 10%).

Componente 16 – Empresas 4.0

#	Medida	Inv. / Ref.	Target / Milest.	Subv. / Emp.	Benef.	PP	Descrição	Exercício simplificação	Obs.
16.15	C16-i03	I	T	S	IAPMEI	10	Apoiar os Digital Innovation Hubs (43.000.000 EUR)	Redução ambição + Simplificação	Redução de ambição, tendo por base os pedidos efetuados e para ajustamento ao mercado. Impacto financeiro de 10.0 M€. Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo da meta para reduzir carga administrativa.
16.17	C16-i04	I	T	S	IAPMEI	10	Conclusão de 300 projetos de Indústria 4.0	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo da meta para reduzir carga administrativa.
16.18	C16-i05-RAA	I	T	S	DRPFE	10	350 projetos concluídos no âmbito do Sistema de Incentivos à Transição Digital das Empresas	Aumento ambição + Simplificação	Aumento de ambição com 59 projetos adicionais. Impacto financeiro de cerca de 3.3 M€. Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo da meta para reduzir carga administrativa.
16.19	C16-i05-RAA	I	M	S	DRPFE	10	Parques de Ciência e Tecnologia ampliados ou equipados	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo do marco para reduzir carga administrativa.
16.20	C16-i06-RAM	I	T	S	IDR, IPRAM	9	Empresas 4.0 (300 projetos de digitalização de PME)	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo da meta para reduzir carga administrativa.

Componente 17 – Qualid. e sustent. finanças públicas

#	Medida	Inv. / Ref.	Target / Milest.	Subv. / Emp.	Benef.	PP	Descrição	Exercício simplificação	Obs.
17.4	C17-r32	R	M	S	-	9	Adoção do modelo de custo para a orçamentação por programas	Antecipação prazo + Simplificação	Antecipação do prazo do marco do 9.º PP para o 8.º PP, pelo facto do mesmo encontrar-se cumprido. Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo do marco para reduzir carga administrativa.
17.8	C17-r32	R	T	S	-	8	136 orçamentos e planos de atividade de empresas públicas coerentemente aprovados pelo ministro das Finanças e/ou pelo(s) respetivo(s) ministro(s) da tutela	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo da meta para reduzir carga administrativa.
17.11	C17-i01	I	M	S	ESPAP	9	Entrada em funcionamento de um sistema de informação de apoio ao novo modelo de controlo orçamental e financeiro	Redução ambição + Simplificação	Redução de ambição por não ser possível concretizar a totalidade do investimento dentro do período PRR. Impacto financeiro de cerca de 28.2 M€. Simplificação através do ajustamento do nome e do descritivo do marco para reduzir carga administrativa.
17.13	C17-i01	I	M	S	ESPAP	10	Conclusão da implementação do Sistema de Gestão de Património Imobiliário Público (SIGPIP) e da modernização dos sistemas de informação sobre os veículos do Estado	Eliminação	Eliminação do marco pela existência de risco elevado na sua concretização dentro do período PRR. Impacto financeiro de cerca de 5.6 M€.
17.14	C17-i01	I	M	S	ESPAP	9	Concluir a implementação do centro de operações de segurança	Eliminação	Eliminação do marco utilizando as linhas orientadoras da CE (custos < 10%).
17.16	C17-i02	I	M	S	AT	9	Disponibilização e operacionalização da versão final do sistema de informação que apoia a avaliação simplificada da propriedade rústica	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo do marco para reduzir carga administrativa, incorporando a fusão da Meta 17.17.

Componente 17 – Qualid. e sustent. finanças públicas

#	Medida	Inv. / Ref.	Target / Milest.	Subv. / Emp.	Benef.	PP	Descrição	Exercício simplificação	Obs.
17.17	C17-i02	I	T	S	AT	9	Conclusão da caracterização edafo-climato-morfológica (solo e clima) e avaliação do potencial económico da propriedade rústica	Eliminação	Fusão desta meta com o Marco 17.16.
17.18	C17-i03	I	T	S	ISS, IP	9	Expansão das funcionalidades do sítio Web Segurança Social Direta, adicionando cinco novos serviços em linha	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo da meta para reduzir carga administrativa, incorporando a Meta 17.19.
17.19	C17-i03	I	T	S	ISS, IP	9	Redução do tempo médio de deferimento de prestações sociais de natureza contributiva em 80 %, para as que tenham um tempo médio superior a 10 dias	Eliminação	Fusão desta meta com Meta 17.18.
17.20	C17-i03	I	T	S	ISS, IP	9	Implementação de modelos de vigilância inteligentes para apoiar a prevenção da fraude, assentes em processos de aprendizagem automática	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo da meta para reduzir carga administrativa.
17.24	C17-r40	R	M	S	-	8	Publicação do relatório de avaliação pela U-TAX sobre os benefícios fiscais existentes	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo do marco para reduzir carga administrativa.
17.25	C17-r40	R	M	S	-	10	Entrada em vigor de um ato jurídico relativo aos benefícios fiscais	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo do marco para reduzir carga administrativa.

Componente 18 – Justiça

#	Medida	Inv. / Ref.	Target / Milest.	Subv. / Emp.	Benef.	PP	Descrição	Exercício simplificação	Obs.
18.4	C18-r33	R	M	S	-	9	Entrada em vigor do pacote legislativo relativo à eliminação de obstáculos ao licenciamento	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo do marco para reduzir carga administrativa.
18.7	C18-i01	I	M	S	IGFEJ	9	Novo sistema de informação para a transformação digital dos tribunais e do Ministério Público	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo do marco para reduzir carga administrativa.
18.8	C18-i01	I	M	S	IGFEJ	9	Execução do novo Plano Tecnológico	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo do marco para reduzir carga administrativa.
18.9	C18-i01	I	M	S	IGFEJ	9	Plataformas de gestão de conhecimento na justiça	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo do marco para reduzir carga administrativa.
18.10	C18-r33	R	M	S	-	8	Estatuto dos funcionários judiciais	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do descritivo do marco para reduzir carga administrativa.

Componente 19 – Administração pública digital

#	Medida	Inv. / Ref.	Target / Milest.	Subv. / Emp.	Benef.	PP	Descrição	Exercício simplificação	Obs.
19.2	C19-i01	I	T	S	AMA	10	+20 serviços públicos disponíveis de forma simplificada e coerente através de diferentes canais	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo da meta para reduzir carga administrativa.
19.3	C19-i01	I	M	S	SGMNE	10	Novo modelo de gestão consular em vigor	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo do marco para reduzir carga administrativa.
19.6	C19-i02	I	T	S	INE	10	Infraestrutura de informação territorial	Antecipação prazo + Simplificação	Antecipação do prazo da meta do 10.º PP para o 9.º PP. Simplificação através da passagem de meta a marco e ajustamento do seu descritivo para reduzir carga administrativa.
19.7	C19-i03	I	T	S	GNS	10	Formação para reforçar as capacidades de cibersegurança e de segurança da informação (9.800 participantes)	Antecipação prazo + Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo da meta para reduzir carga administrativa. A simplificação permite igualmente a antecipação do prazo da meta do 10.º PP para o 9.º PP.
19.8	C19-i03	I	T	S	GNS	10	Adoção da solução criptográfica portuguesa pelas autoridades públicas	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo da meta para reduzir carga administrativa.
19.9	C19-i03	I	T	S	GNS	10	Aplicação do quadro nacional de cibersegurança	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo da meta para reduzir carga administrativa.

Componente 19 – Administração pública digital

#	Medida	Inv. / Ref.	Target / Milest.	Subv. / Emp.	Benef.	PP	Descrição	Exercício simplificação	Obs.
19.10	C19-i03	I	M	S	GNS	10	Remodelação do edifício para as entidades do novo modelo de coordenação da cibersegurança e da segurança da informação	Eliminação	Eliminação do marco por não ser possível concretizar o investimento inerente dentro do período PRR. Impacto financeiro de cerca de 12.1 M€.
19.13	C19-i04	I	M	S	SGMAI	10	Conclusão de melhorias em infraestruturas digitais críticas	Simplificação	Simplificação através da passagem de marco a meta e ajustamento do seu nome e descritivo para reduzir carga administrativa.
19.14	C19-i04	I	M	S	SGMAI	8	Atualização do sistema informático das forças e serviços de segurança	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo do marco para reduzir carga administrativa.
19.15	C19-i04	I	M	S	SG GOV	10	Reforço do centro de gestão da Rede Informática do Governo (RING)	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e do descritivo do marco para reduzir carga administrativa.
19.16	C19-i05-RAM	I	T	S	IDR, IPRAM	8	5 serviços públicos para cidadãos, visitantes e empresas na RAM	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo da meta para reduzir carga administrativa.
19.17	C19-i05-RAM	I	M	S	IDR, IPRAM	9	Modernização de infraestruturas críticas e da arquitetura informática dos serviços públicos na RAM	Redução ambição + Simplificação	Redução de ambição pelo facto de não ser possível o cumprimento do requisito relativo ao “projeto de ligação inteligente da AP” (Projeto SmartAP RAM Connect). Impacto financeiro de 3.0 M€. Simplificação através da passagem de marco a meta e ajustamento do seu nome e descritivo para reduzir carga administrativa.

Componente 19 – Administração pública digital

#	Medida	Inv. / Ref.	Target / Milest.	Subv. / Emp.	Benef.	PP	Descrição	Exercício simplificação	Obs.
19.18	C19-i06- RAA	I	M	S	DRPFE	9	Digitalização da administração pública regional da RAA	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do descritivo do marco para reduzir carga administrativa.
19.21	C19-i07	I	T	S	INA	10	Disponibilização de formação e de espaços de trabalho partilhados para funcionários da administração pública (96.400 participantes em formação)	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do descritivo da meta para reduzir carga administrativa.
19.26	C19-i01	I	T	S	AMA	10	431 novas Lojas de Cidadão e Espaços Cidadão em funcionamento	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo da meta para reduzir carga administrativa.
19.27	C19-i01	I	T	S	AMA	8	Aplicação para cidadãos	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do descritivo da meta para reduzir carga administrativa.
19.29	C19-i05- RAM	I	M	S	IDR, IPRAM	9	Solução de gestão centralizada de dados	Eliminação	Marco removido pelo facto de não ser possível a concretização do investimento dentro do período PRR. Impacto financeiro de cerca de 1.5 M€.
19.33	C19-r42	R	M	E	-	8	Entrada em funcionamento do novo SIADAP	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo do marco para reduzir carga administrativa.
19.34	C19-i08	I	M	S	AMA	8	Desenvolvimento do Portal dos Territórios Inteligentes.	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo do marco para reduzir carga administrativa.
19.35	C19-i08	I	M	S	AMA	10	Territórios Inteligentes: Plataformas de gestão urbana, gémeos digitais e painel de indicadores das políticas públicas	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do descritivo do marco para reduzir carga administrativa.

Componente 19 – Administração pública digital

#	Medida	Inv. / Ref.	Target / Milest.	Subv. / Emp.	Benef.	PP	Descrição	Exercício simplificação	Obs.
19.36	C19-i08	I	T	S	AMA	9	Formação sobre territórios inteligentes (650 trabalhadores)	Antecipação prazo + Simplificação	Antecipação do prazo do 9.º PP para o 8.º PP, pelo facto de se encontrar cumprido. Simplificação através da passagem de meta a marco e ajustamento do seu descritivo para reduzir carga administrativa.

Componente 20 – Escola digital

#	Medida	Inv. / Ref.	Target / Milest.	Subv. / Emp.	Benef.	PP	Descrição	Exercício simplificação	Obs.
20.1	C20-r37	R	T	S	-	9	Formação em competências digitais para professores e pessoal não docente na rede de ensino público	Eliminação	Eliminação da meta para simplificação.
20.4	C20-i01	I	T	S	IGeFE / AGSE	10	Melhoria da conectividade das escolas do ensino básico e secundário	Redução ambição + Eliminação	Redução de ambição com a eliminação do investimento referente aos requisitos: 1) Rede Alargada da Educação de 300 Gbps com uma ligação de, pelo menos, 1 Gbps; 2) Redes de área escolar local com, em média, 40 pontos de acesso à Internet sem fios. Impacto financeiro de cerca de 182.7 M€. Utilizando as linhas orientadores da CE (< 10% custos), esta meta foi eliminada.
20.8	C20-i01	I	T	S	DGE / EduQA	9	Recursos educativos digitais	Extensão prazo + Redução ambição + Simplificação	Extensão de prazo do 9.º PP para 10.º PP para conclusão da meta. Redução de ambição, passando para 77 disciplinas do ensino básico com recursos educativos digitais disponíveis. Impacto financeiro de cerca de 66.7 M€. Simplificação através do ajustamento do indicador e descritivo da meta para reduzir carga administrativa.
20.9	C20-i01	I	T	S	IAVE / EduQA	10	Testes e exames digitais nas escolas	Eliminação	Eliminação da meta utilizando as linhas orientadoras da CE (custos < 10%).
20.11	C20-i02-RAA	I	T	S	DRPFE	9	31.900 novos computadores portáteis e tablets para escolas na RAA	Eliminação	Fusão desta meta com Marco 20.12.

Componente 20 – Escola digital

#	Medida	Inv. / Ref.	Target / Milest.	Subv. / Emp.	Benef.	PP	Descrição	Exercício simplificação	Obs.
20.12	C20-i02- RAA	I	M	S	DRPFE	9	Equipamento digital e recursos educativos digitais das escolas na RAA	Simplificação	Simplificação através da passagem de marco a meta e ajustamento do seu nome e descritivo para reduzir carga administrativa, incorporando a meta 20.11.
20.13	C20-i02- RAA	I	T	S	DRPFE	9	+ 20 cursos em linha abertos a todos para pais e professores na RAA	Eliminação	Eliminação da meta utilizando as linhas orientadoras da CE (custos < 10%).
20.16	C20-i03- RAM	I	T	S	IDR, IPRAM	9	Manuais digitais para alunos no segundo e no terceiro ciclos e estudantes do ensino secundário na RAM	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo da meta para reduzir carga administrativa.
20.17	C20-i03- RAM	I	T	S	IDR, IPRAM	9	Formação em competências digitais para professores e pessoal não docente na RAM (6.500 formandos)	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo da meta para reduzir carga administrativa.
20.18	C20-i03- RAM	I	M	S	IDR, IPRAM	9	Entrega de equipamento científico e tecnológico às escolas na RAM	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo do marco para reduzir carga administrativa.

Componente 21 – REPowerEU

#	Medida	Inv. / Ref.	Target / Milest.	Subv. / Emp.	Benef.	PP	Descrição	Exercício simplificação	Obs.
21.1	C21-i01	I	T	S	IAPMEI	10	Apoio financeiro a + 500 projetos de descarbonização industrial	Antecipação prazo + Simplificação	Antecipação do prazo da meta do 10.º PP para o 8.º PP, pelo facto da mesma encontrar-se cumprida. Simplificação através do ajustamento do descritivo da meta para reduzir carga administrativa.
21.2	C21-i02	I	T	S	FA	9	Renovação para a eficiência energética em edifícios residenciais privados (6 588 000 m2)	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome, indicador e descritivo da meta para reduzir carga administrativa.
21.4	C21-i03	I	T	S	FA	10	Renovação para a eficiência energética em edifícios de serviços	Redução ambição + Simplificação	Redução de ambição de 1.060.000 m2 para 700.000 m2 de área total dos edifícios utilizados pelo setor dos serviços que devem ser objeto de renovações de eficiência energética. Impacto financeiro de cerca de 41.1 M€. Simplificação através do ajustamento do descritivo da meta para reduzir carga administrativa.
21.6	C21-i04- RAM	I	T	S	IDR, IPRAM	10	Renovação para a eficiência energética em edifícios da administração pública (105.000 m2)	Alteração de ambição	Alteração de ambição através da redução da área de Renovação para a eficiência energética em edifícios da administração pública de 105.000 m2 para 99.000 m2 e aumento da produção de energia renovável para autoconsumo de 400kw para 540kw, sem impacto financeiro.

Componente 21 – REPowerEU

#	Medida	Inv. / Ref.	Target / Milest.	Subv. / Emp.	Benef.	PP	Descrição	Exercício simplificação	Obs.
21.8	C21-r43	R	M	S	-	8	Lançamento do instrumento de financiamento para combater a pobreza energética	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo do marco para reduzir carga administrativa.
21.11	C21-r44	R	T	S	-	8	Lançamento de 50 Espaços Cidadão Energia	Simplificação	Simplificação através da passagem de meta a marco e ajustamento do seu nome e descritivo para reduzir carga administrativa.
21.13	C21-i05	I	T	S	IAPMEI	10	Conclusão de 5 projetos industriais no domínio das tecnologias estratégicas para a transição climática	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo da meta para reduzir carga administrativa.
21.15	C21-r45	R	T	S	-	9	Ações de formação em competências verdes (12.500 pessoas)	Antecipação prazo + Simplificação	Antecipação do prazo da meta do 9.º PP para o 8.º PP, pelo facto da mesma encontrar-se cumprida. Simplificação através da passagem de meta a marco e ajustamento do seu nome e descritivo para reduzir carga administrativa.
21.23	C21-r48	R	M	S	-	10	Adoção de um calendário de atribuição de nova capacidade em matéria de energias renováveis, com especial ênfase nas áreas resultantes do Programa Setorial «Go-To Areas renováveis»	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo do marco para reduzir carga administrativa.
21.25	C21-i06	I	T	S	FA	10	Capacidade adicional de produção de hidrogénio renovável e gases renováveis	Eliminação	Meta removida por alteração da medida associada ao sistema de incentivos.
21.27	C21-i07	I	M	S	IPMA, I.P. LNEG	10	Conclusão dos estudos técnicos sobre a energia eólica offshore	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo do marco para reduzir carga administrativa.

Componente 21 – REPowerEU

#	Medida	Inv. / Ref.	Target / Milest.	Subv. / Emp.	Benef.	PP	Descrição	Exercício simplificação	Obs.
21.29	C21-i08	I	T	S	FA	9	Instalação da capacidade de armazenamento de eletricidade (500 MW)	Eliminação	Meta removida por alteração da medida associada ao sistema de incentivos.
21.31	C21-i09	I	M	S	EMER	10	Entrada em funcionamento dos módulos de balcão único digital para o licenciamento e a monitorização de projetos de energias renováveis	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo do marco para reduzir carga administrativa.
21.32	C21-i10-RAA	I	T	S	DRPFE	9	Instalação da capacidade de armazenamento de eletricidade (8.75 MW)	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo da meta para reduzir carga administrativa.
21.33	C21-i11-RAM	I	T	S	IDR, IPRAM	10	Aumento da capacidade instalada em unidades de produção de energia renovável para autoconsumo e aumento da capacidade de armazenamento para autoconsumo instalada (5.25 MW)	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo da meta para reduzir carga administrativa.
21.34	C21-i11-RAM	I	T	S	IDR, IPRAM	10	Reforço da capacidade instalada de energias renováveis (11 MW)	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo da meta para reduzir carga administrativa.
21.36	C21-i12	I	T	S	FA	10	Aquisição de novos autocarros com nível nulo de emissões (elétricos ou a hidrogénio) utilizados para transporte público (+707 novos autocarros)	Simplificação	Simplificação através da passagem de meta a marco e ajustamento do seu nome e descritivo para reduzir carga administrativa.
21.37	C21-i13-RAM	I	T	S	IDR, IPRAM	10	Aquisição de 15 novos autocarros com nível nulo de emissões (elétricos ou a hidrogénio) utilizados para transporte público e serviços turísticos e aquisição de veículos elétricos que substituem veículos abatidos	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo da meta para reduzir carga administrativa.
21.38	C21-i14	I	M	S	TUB	8	Assinatura do contrato relativo à construção de uma linha de BRT em Braga	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo do marco para reduzir carga administrativa.

Componente 21 – REPowerEU

#	Medida	Inv. / Ref.	Target / Milest.	Subv. / Emp.	Benef.	PP	Descrição	Exercício simplificação	Obs.
21.39	C21-i14	I	T	S	TUB	10	Construção de uma linha de trânsito rápido de autocarros em Braga	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do descritivo da meta para reduzir carga administrativa.
21.43	C21-i16	I	M	S	CM Nazaré	10	Construção de um funicular	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do descritivo do marco para reduzir carga administrativa.
21.44	C21-r48	R	M	S	-	10	Requalificação do pessoal envolvido no licenciamento de projetos de energias renováveis através de formação	Simplificação	Simplificação através do ajustamento do nome e descritivo do marco para reduzir carga administrativa.
21.45	C21-i17	I	M	S	-	10	Sistema de incentivos: entrada em vigor do acordo de execução	Novo	Sistema de incentivos para suportar hidrogénio e gases renováveis. Esta medida substitui a medida C21-06.
21.46	C21-i17	I	T	S	-	10	Sistema de incentivos: assinatura de contratos com beneficiários finais	Novo	Sistema de incentivos para suportar hidrogénio e gases renováveis. Esta medida substitui a medida C21-06.
21.47	C21-i18	I	M	S	-	10	Sistema de incentivos: entrada em vigor do acordo de execução	Novo	Sistema de incentivos para suportar flexibilidade de rede. Esta medida substitui a medida C21-08.
21.48	C21-i18	I	T	S	-	10	Sistema de incentivos: assinatura de contratos com beneficiários finais	Novo	Sistema de incentivos para suportar flexibilidade de rede. Aumento de ambição – Impacto financeiro de 60.0 M€. Esta medida substitui a medida C21-08.
