

RELATÓRIO TRIMESTRAL

SETEMBRO 2025



Financiado pela
União Europeia
NextGenerationEU

RECUPERAR
PORTUGAL



Ficha Técnica

Título: Relatório Trimestral setembro 2025

Edição: 1ª edição, 2025

Propriedade: Estrutura de Missão Recuperar Portugal

RECUPERAR
PORTUGAL



CONTEÚDOS

- 1 O PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA
- 2 PROGRESSO GERAL A 30 DE SETEMBRO DE 2025
- 3 SÍNTESE DA IMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA
- 4 SÍNTESE DA IMPLEMENTAÇÃO POR DIMENSÃO ESTRUTURANTE
- 5 SÍNTESE DA IMPLEMENTAÇÃO POR COMPONENTE

ANEXOS

ANEXO I. LISTAGEM DE PROJETOS APROVADOS A BENEFICIÁRIOS DIRETOS

ANEXO II. LISTAGEM DE PROJETOS APROVADOS A BENEFICIÁRIOS FINAIS


1

O Plano de Recuperação e Resiliência

1. O Plano de Recuperação e Resiliência



Visão Global

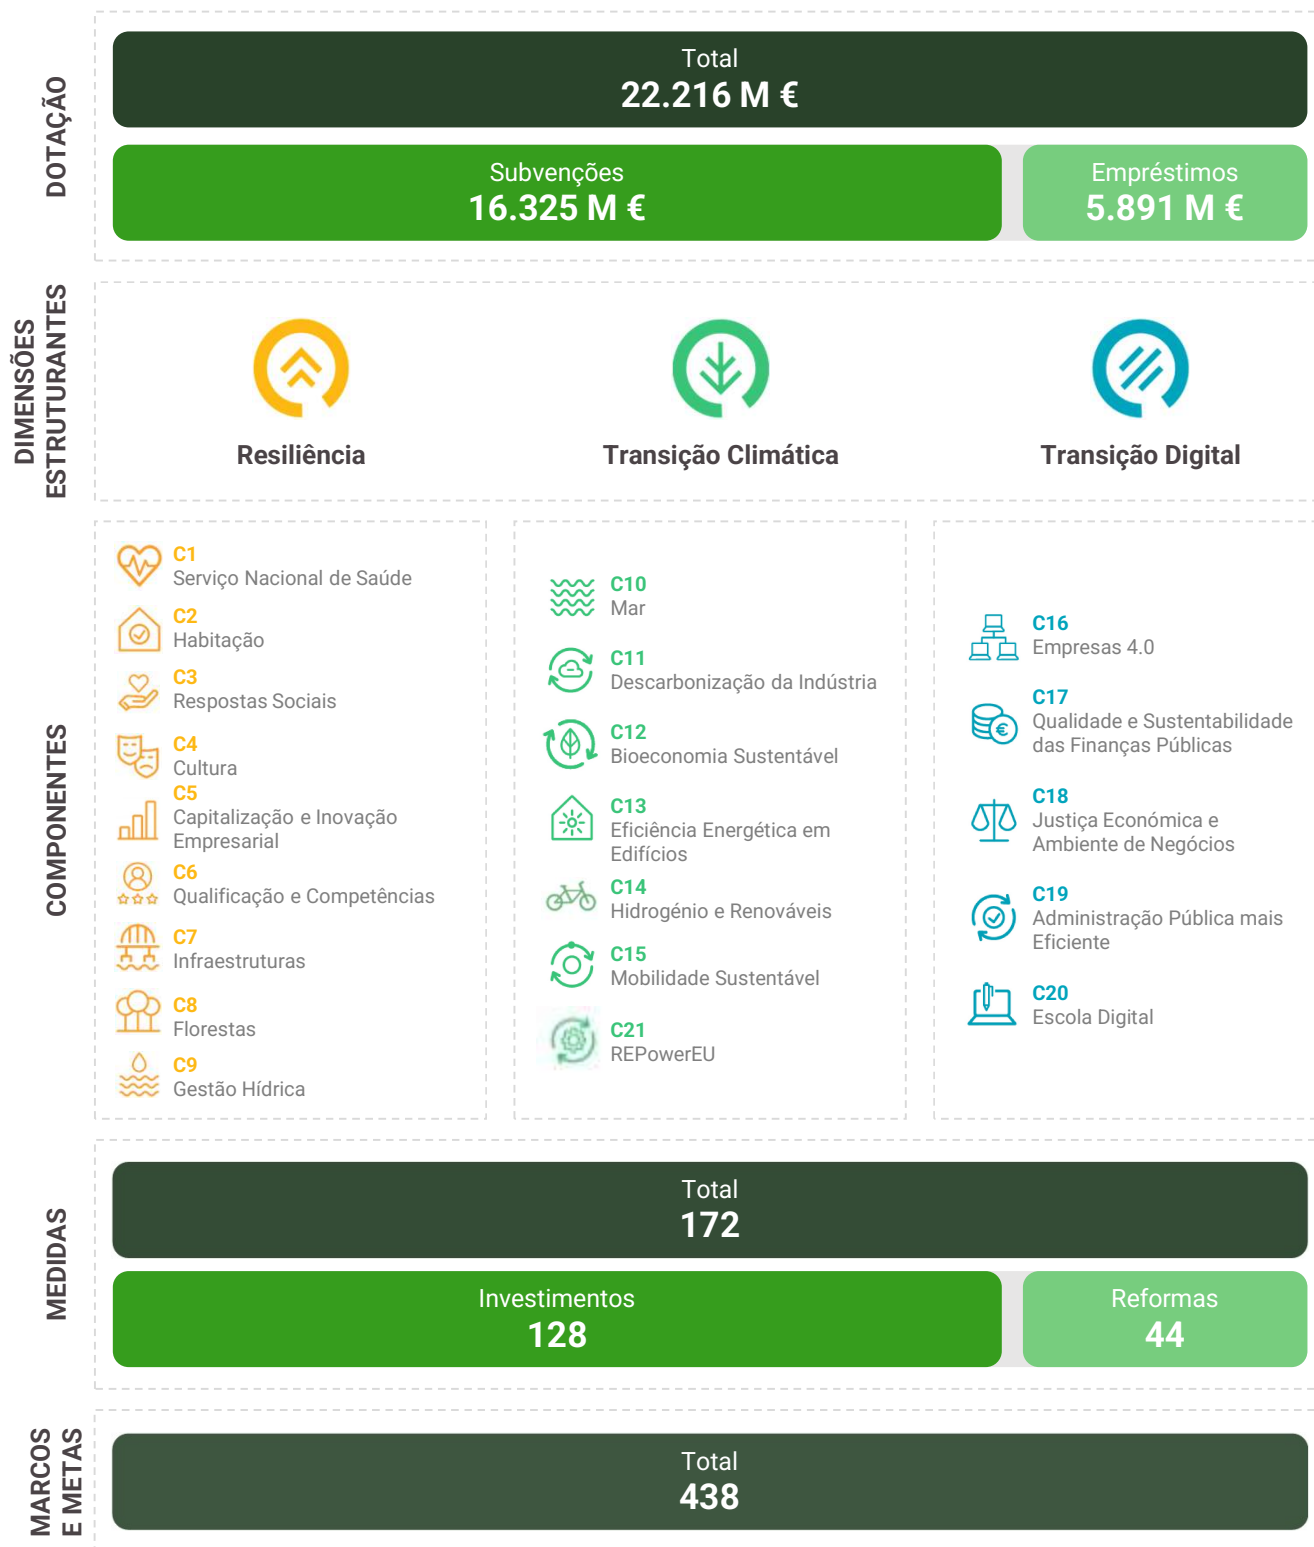

1. O Plano de Recuperação e Resiliência



Reprogramação



INICIAL		ATUALIZAÇÃO
RESILIÊNCIA		
1.383 M €	C1. Serviço Nacional de Saúde	2.108 M €
2.733 M €	C2. Habitação	2.827 M €
833 M €	C3. Respostas Sociais	1.124 M €
243 M €	C4. Cultura	346 M €
2.914 M €	C5. Capitalização e Inovação Empresarial	5.396 M €
1.324 M €	C6. Qualificações e Competências	1.958 M €
690 M €	C7. Infraestruturas	813 M €
615 M €	C8. Florestas	600 M €
390 M €	C9. Gestão Hídrica	236 M €
11.125 M €		15.407 M €
TRANSIÇÃO CLIMÁTICA		
252 M €	C10. Mar	388 M €
715 M €	C11. Descarbonização da Indústria	737 M €
145 M €	C12. Bioeconomia Sustentável	175 M €
610 M €	C13. Eficiência Energética em Edifícios	622 M €
370 M €	C14. Hidrogénio e Renováveis	415 M €
967 M €	C15. Mobilidade Sustentável	847 M €
n.a. ¹	C21. REPowerEU	951 M €
3.059 M €		4.134 M €
TRANSIÇÃO DIGITAL		
650 M €	C16. Empresas 4.0	682 M €
406 M €	C17. Qualidade e Sustent. Finanças Públicas	406 M €
267 M €	C18. Justiça Económica e Ambiente de Negócios	281 M €
578 M €	C19. Administração Pública Mais Eficiente	700 M €
559 M €	C20. Escola Digital	605 M €
2.460 M €		2.675 M €
16.644 M €		22.216 M €

¹ Esta componente não estava prevista no PRR inicial.

Estes valores poderão ser sujeitos a pequenos ajustes no âmbito da contratação entre a Estrutura de Missão "Recuperar Portugal" e os Beneficiários Diretos e Intermediários.

2

Progresso geral a 30 de setembro de 2025

2. Progresso geral a 30 de setembro de 2025



Dados a 30 de setembro de 2025

¹Valor contratualizado reflete investimentos decorrentes da reprogramação em fase de ajustamento

3

Síntese da implementação financeira

3. Síntese da implementação financeira

Durante o 3º trimestre de 2025, foram lançados 619 milhões de euros em Avisos e Anúncios. Durante o trimestre foram também aprovados 695 milhões de euros, pagos 1.081 milhões de euros a Beneficiários Diretos e Finais e realizados 1.653 milhões de euros.


Desta forma, até 30 de setembro de 2025, tinham sido lançados Avisos de Abertura de Candidaturas no total de 18.449 milhões de euros (83% da dotação do PRR) e Procedimentos de Contratação Pública no total de 4.525 milhões de euros (20% da dotação do PRR). O montante lançado em Avisos e Anúncios ascendia no final do trimestre a 22.974 milhões de euros, correspondendo a 103% da dotação do PRR e representando um aumento de 3 pontos percentuais face ao final do 2º trimestre de 2025 (esta variação é calculada tendo por base a dotação do PRR).

Já o montante de projetos aprovados a Beneficiários Diretos e Finais que totalizava, no final do 3º trimestre de 2025, 22.949 milhões de euros (103% da dotação do PRR), representa um aumento de 3 pontos percentuais face ao 2º trimestre de 2025 (novamente, trata-se da variação calculada com base na dotação).

Os montantes pagos a Beneficiários Diretos e Finais ascendiam a 9.153 milhões de euros, o correspondente a 41% da dotação do PRR, e representando um aumento de 5 pontos percentuais face ao 2º trimestre de 2025.

Já o valor realizado totalizava no final do 3º trimestre de 2025, 7.053 milhões de euros (32% da dotação do PRR), e representando um aumento de 7 pontos percentuais face ao período anterior.

Figura 1: Evolução da Implementação Financeira até ao 3º trimestre de 2025

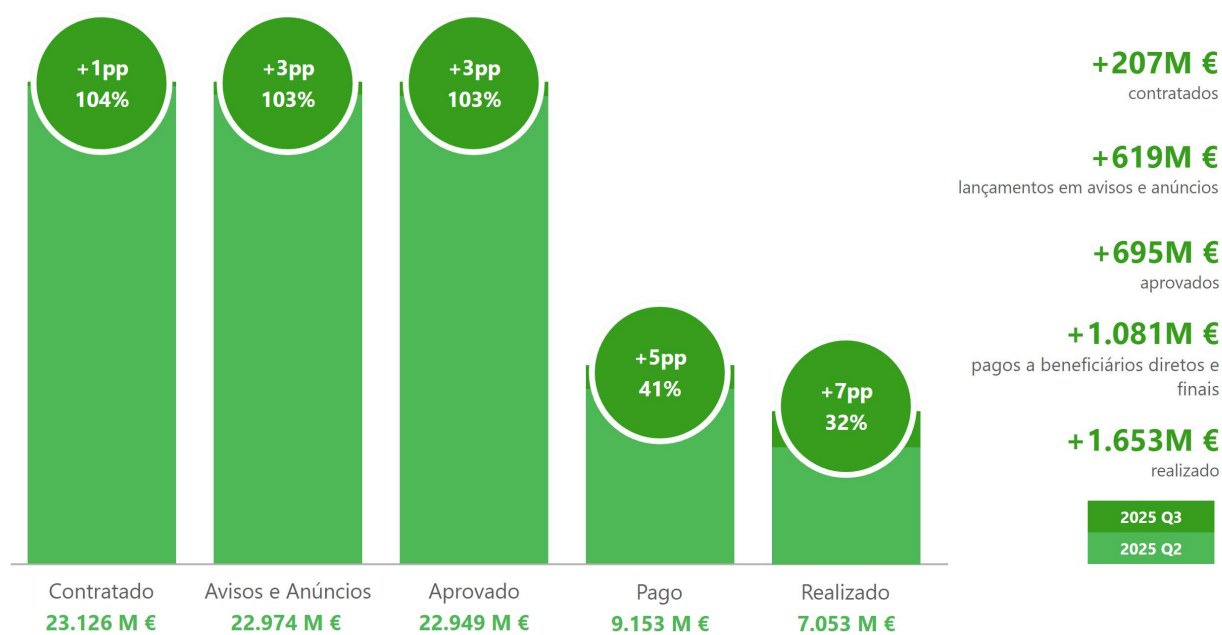

Os valores percentuais bem como as respetivas variações em pontos percentuais foram calculados tendo por base a dotação do PRR de 22.216 M € e estão arredondados à unidade.

3. Síntese da implementação financeira


A 30 de setembro de 2025, as três dimensões estruturantes do PRR - Resiliência, Transição Climática e Transição Digital - encontravam-se com os níveis de implementação financeira representados na figura 2.

Na dimensão Resiliência tinham sido lançados 15.192 milhões de euros em Avisos e Anúncios (99% da dotação da dimensão estruturante). O montante aprovado ascendia a 16.298 milhões de euros (106% da dotação da dimensão estruturante) e o montante pago a Beneficiários Diretos e Finais ascendia a 6.545 milhões de euros (42% da dotação da dimensão estruturante). Já o realizado ascendia a 4.887 milhões de euros (32% da dotação da dimensão estruturante).

Na dimensão Transição Climática, o montante lançado em Avisos e Anúncios atingiu os 5.106 milhões de euros no final do trimestre (124% da dotação da dimensão estruturante). O montante aprovado a Beneficiários Diretos e Finais ascendia a 4.043 milhões de euros (98% da dotação da dimensão estruturante), e o montante pago aos mesmos atingiu os 1.369 milhões de euros (33% da dotação da dimensão estruturante). O valor realizado encontra-se nos 1.235 milhões de euros (30% da dotação da dimensão estruturante).

Na dimensão Transição Digital, foram lançados até ao final do semestre 2.676 milhões de euros (100% da dotação da dimensão estruturante), tendo sido aprovados 2.609 milhões de euros (98% da dotação da dimensão estruturante), pagos a Beneficiários Diretos e Finais 1.240 milhões de euros (46% da dotação da dimensão estruturante) e realizados 931 milhões de euros (35% da dotação da dimensão estruturante).


Figura 2: Implementação Financeira por Dimensão Estruturante a 30.09.2025 (milhões de euros)

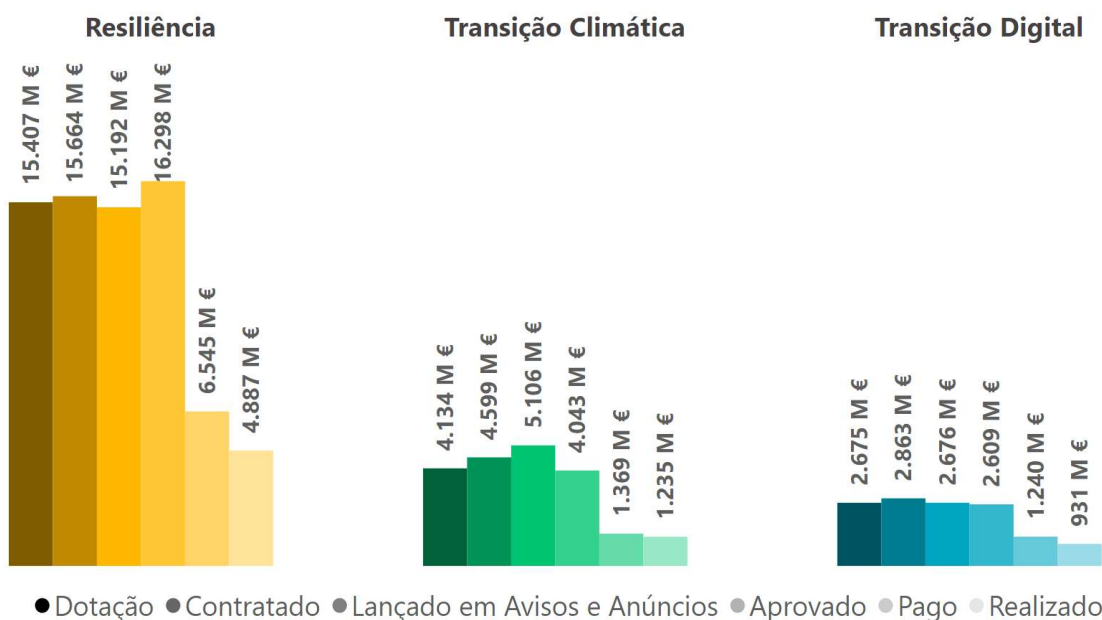

3. Síntese da implementação financeira

A figura 3 mostra os montantes contratados entre a EMRP e os Beneficiários Diretos e Intermédios, e os montantes aprovados, pagos e realizados por Beneficiários Diretos e Finais, em cada uma das 21 componentes do PRR, a 30 de setembro de 2025.

Figura 3: Implementação Financeira por Componente a 30.09.2025 (milhões de euros)

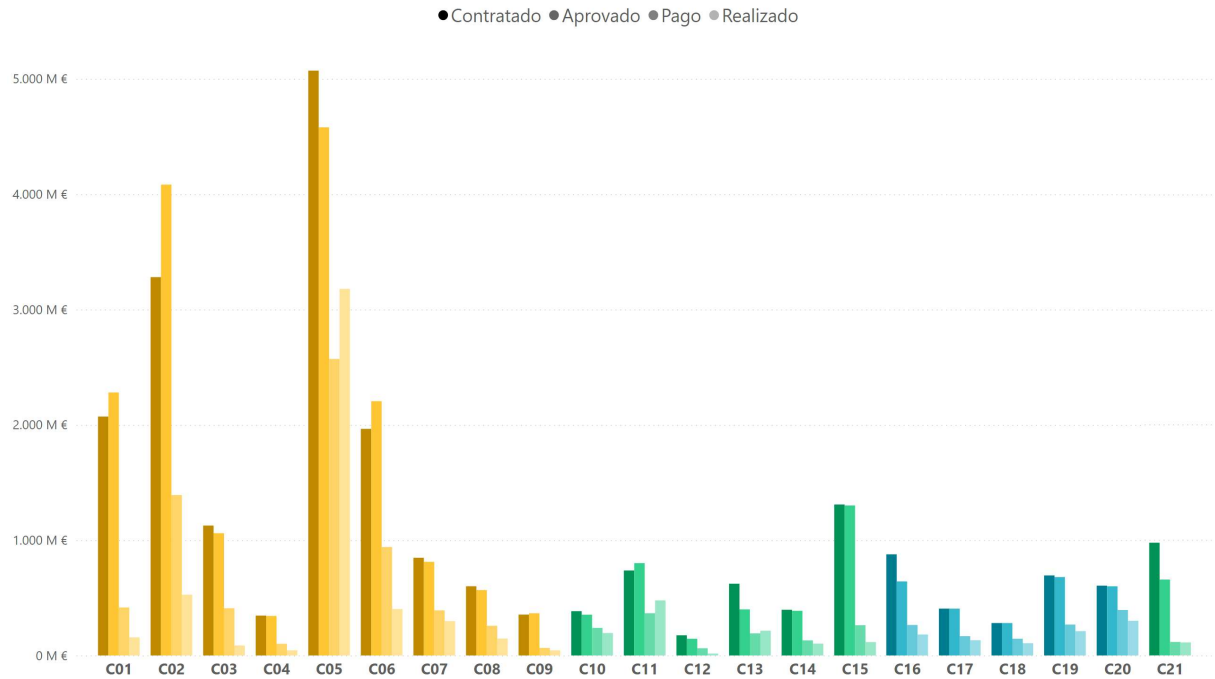

A tabela 1 apresenta a divisão previsional por tipo de Beneficiário Direto e Final da dotação lançada em avisos e procedimentos de contratação pública. Apresenta também os respetivos montantes aprovados, pagos e realizados por tipo de Beneficiário Direto ou Final.

Tabela 1: Implementação Financeira por tipologia de Beneficiário a 30.09.2025

	Concursos Públicos	Avisos			Beneficiários Diretos e Finais		
TIPO DE BENEFICIÁRIO	LANÇADOS (€) ¹	DOTAÇÃO (€) ²	CANDIDATURAS SUBMETIDAS	CANDIDATURAS APROVADAS	APROVADO (M€)	PAGO (M€)	REALIZADO (M€)
Famílias		1.800 M €	291.711	193.897	326 M €	266 M €	369 M €
Instituições da Economia Solidária e Social		1.319 M €	10.466	6.688	827 M €	313 M €	77 M €
Empresas		6.003 M €	76.369	45.438	6.408 M €	3.262 M €	3.833 M €
Instituições do Sistema Científico e Tecnológico		901 M €	1.528	838	660 M €	232 M €	133 M €
Instituições de Ensino Superior		964 M €	2.545	367	844 M €	353 M €	175 M €
Escolas	361 M €	585 M €	1.826	1.194	1.038 M €	607 M €	301 M €
Autarquias e Áreas Metropolitanas	12 M €	1.936 M €	8.186	5.506	4.435 M €	1.289 M €	392 M €
Entidades Públicas	2.280 M €	3.180 M €	3.442	2.809	5.370 M €	1.910 M €	1.137 M €
Empresas Públicas	1.872 M €	1.761 M €	475	377	3.042 M €	922 M €	635 M €
Total	4.525 M €	18.449 M €	396.548	257.114	22.949 M €	9.153 M €	7.053 M €

¹ Procedimentos de Contratação Pública lançados por Beneficiários Diretos.
² Dotação sujeita a alterações no âmbito da contratação em curso entre a Recuperar Portugal e os Beneficiários Intermediários e Diretos.

3. Síntese da implementação financeira

A distribuição dos valores aprovados e pagos a Beneficiários Diretos e a Beneficiários Finais, em cada uma das regiões NUTS III de Portugal e nos projetos de cobertura nacional, é apresentada na tabela 2, bem como a sua distribuição relativa por habitante. A 30 de setembro de 2025, tinha sido aprovado um montante equivalente a 2.219 euros por habitante no território nacional, pago um montante equivalente a 885 euros e realizado 682 euros por habitante.

Tabela 2: Implementação Financeira por região NUTS III e *per capita*, a 30.09.2025

NUT III	Beneficiários Diretos e Finais			Por habitante		
	APROVADO (M€)	PAGO (M€)	REALIZADO (M€)	APROVADO (€/HABITANTE)	PAGO (€/HABITANTE)	REALIZADO (€/HABITANTE)
Projetos Nacionais	3.869 M €	1.789 M €	1.076 M €	374 €	173 €	104 €
Alto Minho	345 M €	132 M €	105 M €	1.492 €	573 €	454 €
Cávado	650 M €	266 M €	208 M €	1.559 €	640 €	499 €
Ave	628 M €	281 M €	230 M €	1.500 €	672 €	550 €
Área Metropolitana do Porto	3.300 M €	1.420 M €	1.362 M €	1.901 €	818 €	784 €
Alto Tâmega	96 M €	36 M €	19 M €	1.142 €	432 €	221 €
Tâmega e Sousa	504 M €	236 M €	162 M €	1.233 €	578 €	396 €
Douro	356 M €	116 M €	72 M €	1.934 €	629 €	392 €
Terras de Trás-os-Montes	194 M €	78 M €	46 M €	1.806 €	730 €	425 €
Região de Aveiro	838 M €	354 M €	407 M €	2.282 €	963 €	1.109 €
Região de Coimbra	911 M €	332 M €	304 M €	2.085 €	761 €	696 €
Região de Leiria	511 M €	223 M €	230 M €	1.783 €	776 €	801 €
Viseu Dão Lafões	457 M €	166 M €	139 M €	1.807 €	655 €	548 €
Beira Baixa	126 M €	46 M €	45 M €	1.557 €	574 €	561 €
Beiras e Serra da Estrela	335 M €	111 M €	73 M €	1.589 €	527 €	346 €
Oeste	314 M €	126 M €	117 M €	864 €	346 €	321 €
Médio Tejo	343 M €	131 M €	121 M €	1.502 €	574 €	530 €
Lezíria do Tejo	271 M €	104 M €	88 M €	1.150 €	442 €	375 €
Área Metropolitana de Lisboa	5.467 M €	2.021 M €	1.418 M €	1.905 €	704 €	494 €
Alentejo Litoral	240 M €	96 M €	70 M €	2.492 €	996 €	729 €
Baixo Alentejo	279 M €	97 M €	92 M €	2.427 €	845 €	802 €
Alto Alentejo	228 M €	73 M €	38 M €	2.173 €	692 €	366 €
Alentejo Central	250 M €	81 M €	63 M €	1.639 €	529 €	413 €
Algarve	673 M €	211 M €	131 M €	1.439 €	451 €	281 €
Região Autónoma dos Açores	909 M €	379 M €	249 M €	3.845 €	1.604 €	1.051 €
Região Autónoma da Madeira	856 M €	248 M €	188 M €	3.415 €	991 €	750 €
Total	22.949 M €	9.153 M €	7.053 M €	2.219 €	885 €	682 €

3. Síntese da implementação financeira

FLUXOS DE TESOURARIA

A 3 de agosto de 2021, Portugal recebeu o adiantamento de 13% dos fundos do PRR, nos termos do disposto no artigo 13º do Regulamento (EU) 2021/241 do Parlamento Europeu e do Conselho e no seguimento da assinatura dos acordos de financiamento e de empréstimos. O pré-financiamento correspondeu a um valor total de 2.159 milhões de euros, sendo 1.808 milhões de euros relativos a subvenções e 351 milhões de euros relativos a empréstimos.

O desembolso dos fundos do PRR contratados com a Comissão Europeia depende do processo de avaliação do cumprimento de marcos e metas, estando prevista a submissão de 10 pedidos de pagamento até 2026, dos quais 7 foram já submetidos.

O primeiro Pedido de Pagamento foi submetido a 25 de janeiro de 2022, no total de 1.336 milhões de euros, dos quais 636 milhões de euros respeitantes a subvenções e 700 milhões de euros de empréstimos, que, deduzidos do correspondente valor do pré-financiamento de 13%, se traduziu no pagamento líquido, a 9 de maio de 2022, de 1.162 milhões de euros (553 milhões de euros de subvenções, e 609 milhões de euros de empréstimos).

O segundo Pedido de Pagamento foi formalizado a 31 de dezembro de 2022, no total de 2.092 milhões de euros, tendo recebido avaliação positiva da Comissão Europeia a 16 de dezembro. Após a dedução respetiva do adiantamento, este Pedido de Pagamento traduziu-se no recebimento líquido de 1.820 milhões de euros, dos quais 1.711 milhões de euros relativos a subvenções e 109 milhões de euros relativos a empréstimos. Com o desembolso do 2.º Pedido de Pagamento, que viria a ser realizado a 8 de fevereiro de 2023, Portugal tinha recebido 5.141 milhões de euros, correspondente a cerca de 31% da dotação orçamental global do PRR inicialmente contratada com a Comissão Europeia.

Os terceiro e quarto Pedidos de Pagamento foram formalizados a 4 de outubro de 2023, no total de 3.562 milhões de euros, dos quais 2.947 milhões de euros respeitantes a subvenções e 615 milhões de euros de empréstimos, que, deduzidos do correspondente valor do pré-financiamento de 13%, e do valor suspenso, se traduziu no recebimento líquido, a 28 de dezembro de 2023, de 2.460 milhões de euros, dos quais 1.875 milhões de euros respeitantes a subvenções e 585 milhões de euros de empréstimos. O pedido de levantamento da suspensão recebeu uma avaliação preliminar positiva da Comissão a 24 de junho, resultando no desembolso do valor suspenso de 714 milhões, no início de agosto.

O quinto Pedido de Pagamento foi formalizado a 5 de julho de 2024, no total de 3.191 milhões de euros, dos quais 1.878 milhões de euros respeitantes a subvenções e 1.313 milhões de euros de empréstimos, que deduzidos do correspondente valor de pré-financiamento se traduz no valor líquido de 2.903 milhões de euros, 1.653 de euros em subvenções e 1.250 milhões de euros em empréstimos. A avaliação preliminar positiva foi aprovada pela Comissão a 26 de novembro, e o desembolso do valor líquido ocorreu a 23 de dezembro de 2024.

3. Síntese da implementação financeira


FLUXOS DE TESOURARIA

O sexto Pedido de Pagamento foi formalizado a 14 de novembro de 2024, no total de 1.868 milhões de euros, dos quais 1.502 milhões de euros respeitantes a subvenções e 366 milhões de euros de empréstimos, que deduzidos do correspondente valor de pré-financiamento se traduzia inicialmente no valor líquido de 1.671 milhões de euros, 1.322 milhões de euros em subvenções e 349 milhões de euros em empréstimos. No dia 8 de agosto ocorreu o desembolso de 1.337 milhões de euros, 851 milhões de euros em subvenções e 485 milhões de euros em empréstimos, valor mais baixo face previsto devido à atualização do PRR submetida em fevereiro de 2025.

O sétimo Pedido de Pagamento foi formalizado a 26 de junho de 2025, no total de 1.209 milhões de euros, respeitantes a subvenções, que deduzidos do correspondente valor de pré-financiamento se traduz no valor líquido de 1.064 milhões de euros.


3. Síntese da implementação financeira

Figura 4: Cronograma de Pedidos de Pagamento e Desembolsos

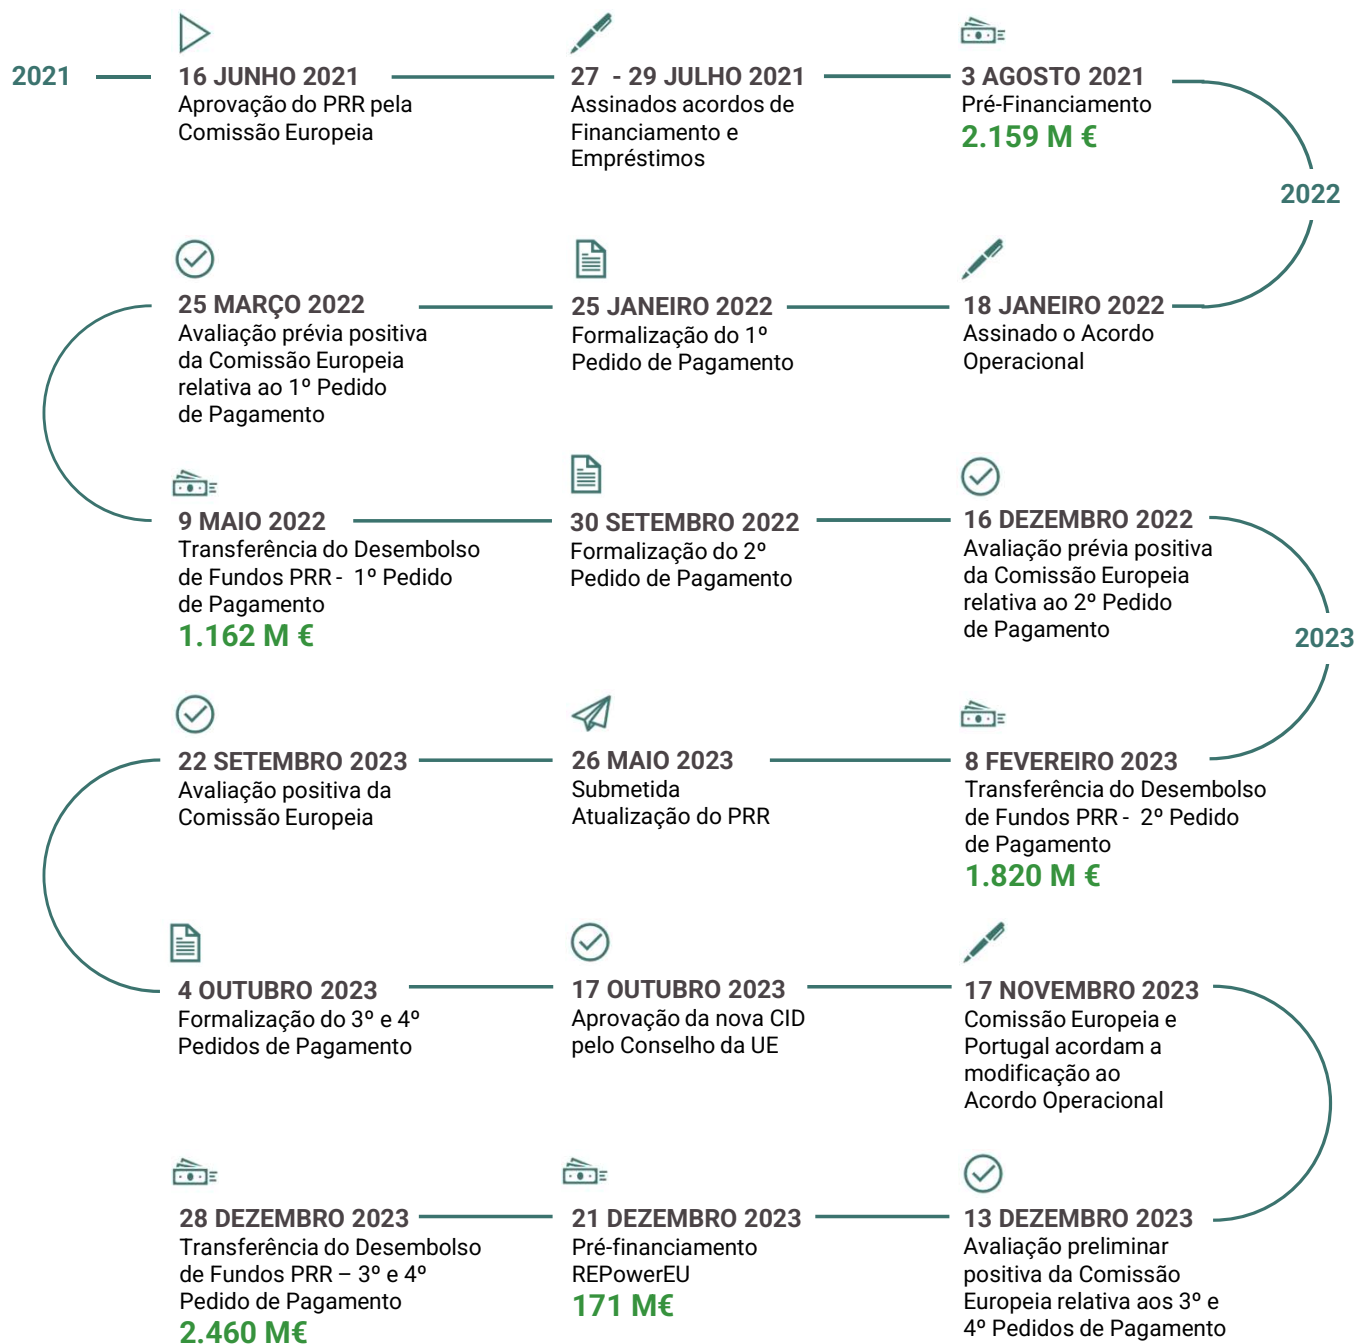

3. Síntese da implementação financeira

Figura 4: (Cont.) Cronograma de Pedidos de Pagamento e Desembolsos

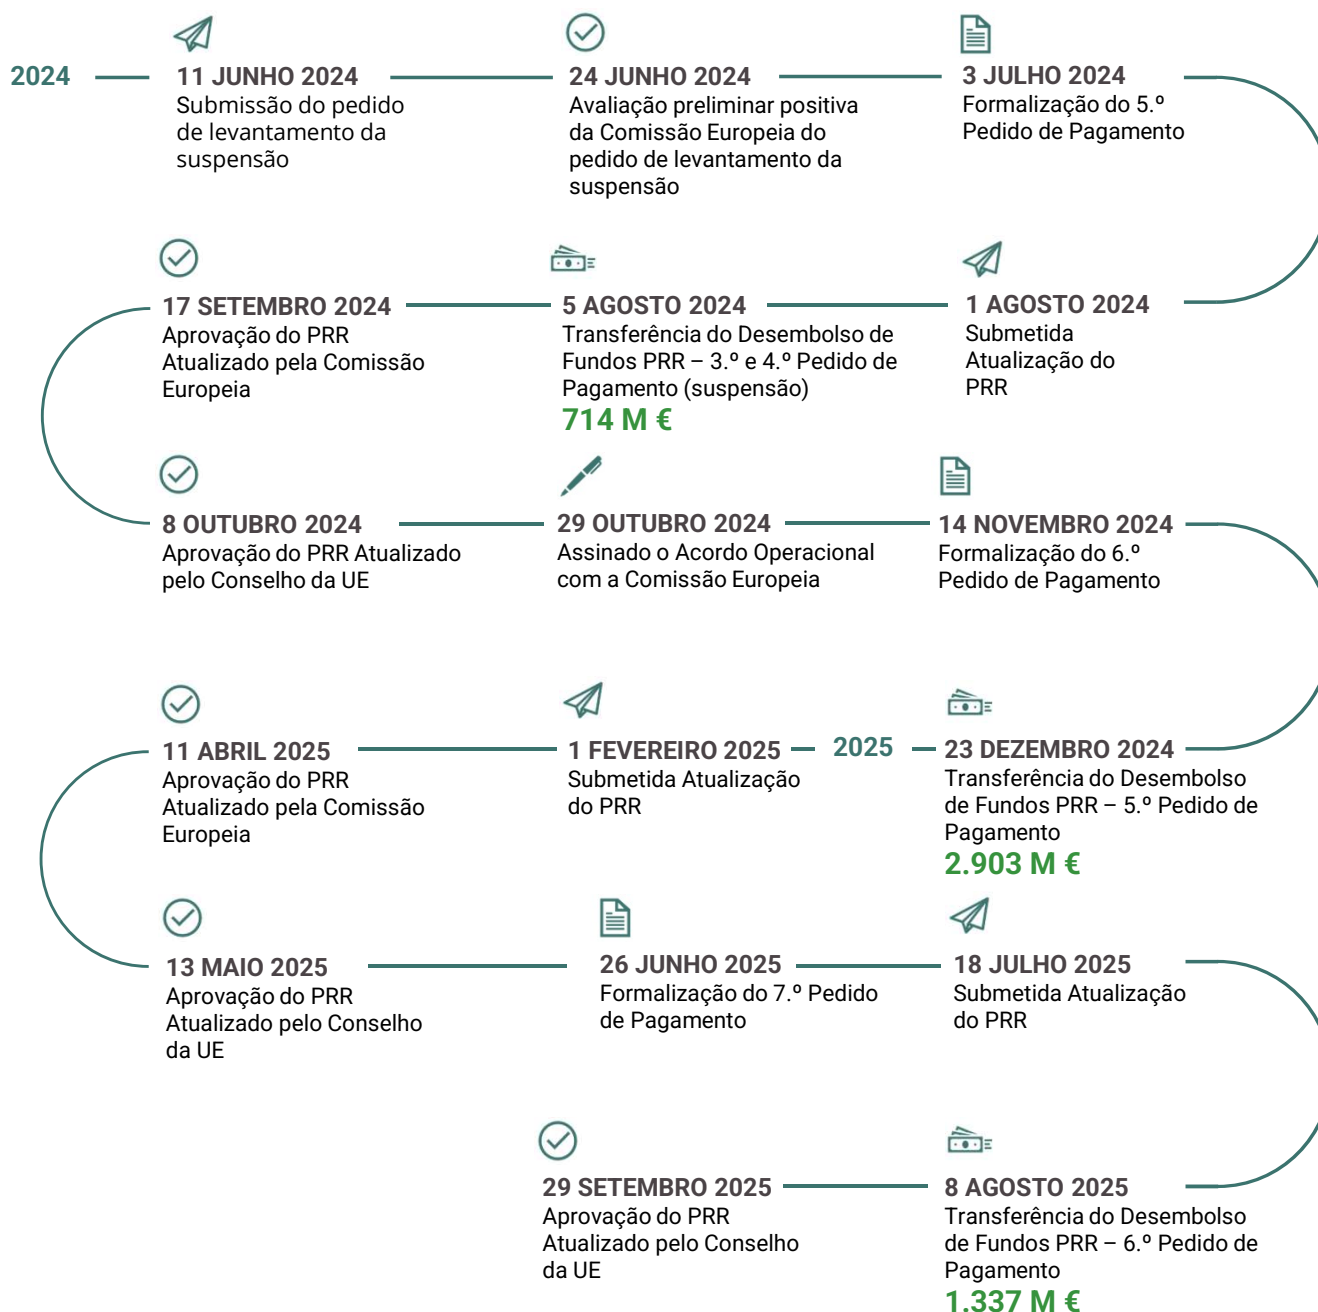


3. Síntese da implementação financeira

A figura 5 representa a distribuição dos valores recebidos da Comissão Europeia pelos Beneficiários Diretos, Intermediários e Finais ao longo da execução do PRR até ao final do 3º trimestre de 2025. De acordo com o Decreto-Lei n.º 29-B/2021, de 4 de maio, a Recuperar Portugal emite ordens de pagamento e a AD&C processa os pagamentos a Beneficiários Diretos e Intermediários. Os Beneficiários Intermediários, por sua vez, fazem pagamentos aos Beneficiários Finais, após seleção e contratação com os mesmos.

A 30 de setembro de 2025, tinham sido pagos 2.218 milhões de euros a Beneficiários Diretos. O montante total transferido a Beneficiários Intermediários ascendia a 8.698 milhões de euros, dos quais 6.935 milhões de euros foram já pagos a Beneficiários Finais e 1.763 milhões de euros encontram-se em trânsito.

Figura 5: Fluxos de Tesouraria do PRR a 30.09.2025

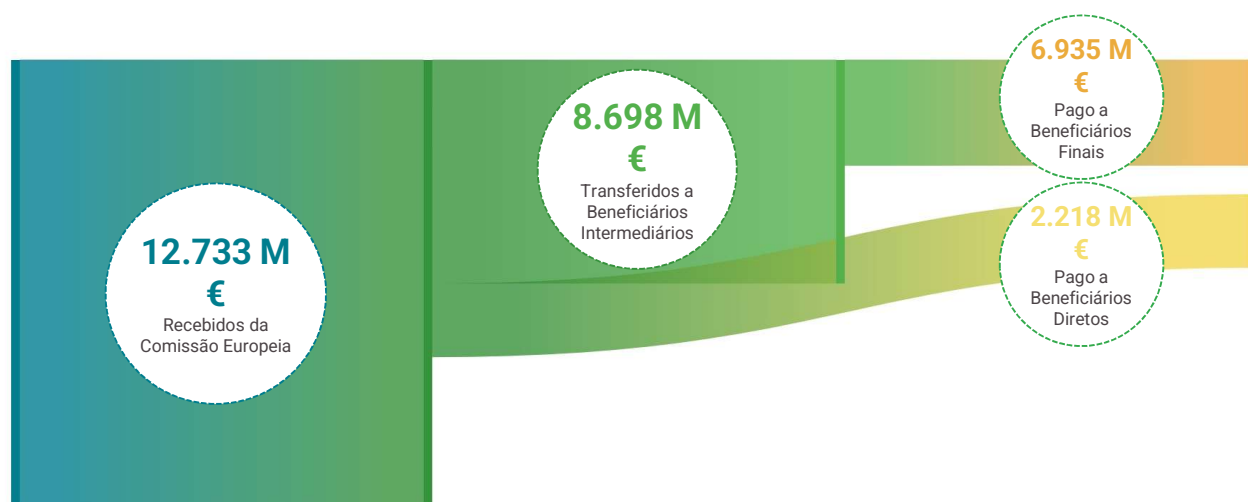

4

Síntese da Implementação por Dimensão Estruturante

4. Síntese da Implementação por Dimensão Estruturante



I - Resiliência


15.407 M €


Dotação orçamental

A dimensão da Resiliência visa reforçar a resiliência social, económica e territorial do país através de 9 componentes estratégicas, incluindo intervenções na saúde, habitação, respostas sociais, cultura, investimento empresarial, competências e qualificações, infraestruturas, florestas e gestão da água. Esta dimensão representa a maior parte do investimento total do PRR para a promoção de uma recuperação transformadora, duradoura, justa, sustentável e inclusiva.

Síntese da Implementação da Dimensão I – Resiliência a 30.09.2025



Evolução da Implementação Financeira até ao 3º trimestre de 2025

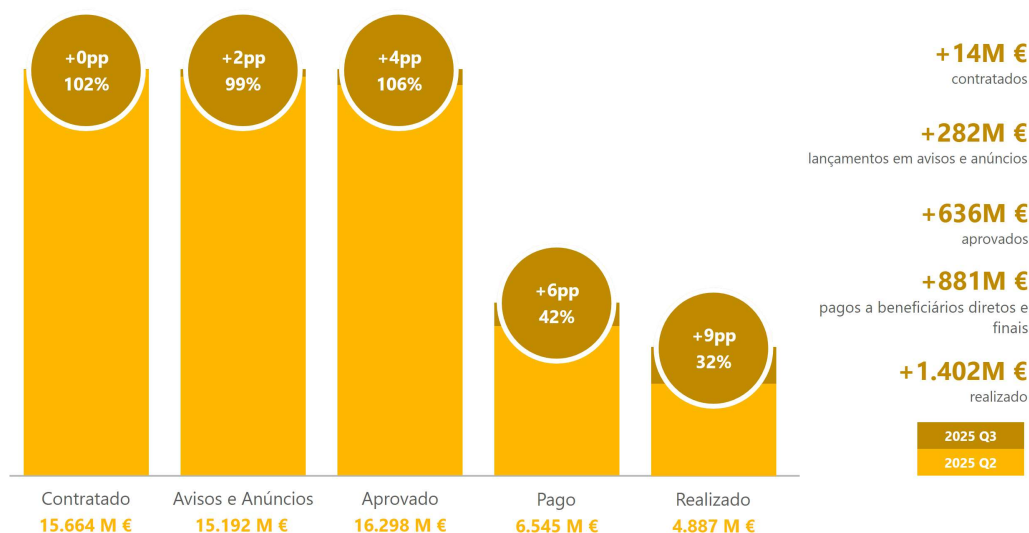

Os valores percentuais bem como as respetivas variações em pontos percentuais foram calculados tendo por base a dotação do PRR de 22.216 M €.

4. Síntese da Implementação por Dimensão Estruturante




II - Transição Climática


4.134 M €


Dotação orçamental

A Transição Climática compreende 7 componentes estratégicos, incluindo intervenções em áreas como o mar, mobilidade sustentável, descarbonização da indústria, bioeconomia, eficiência energética em edifícios, e energias renováveis. Constitui um compromisso para o cumprimento das metas climáticas que permitirá a Portugal atingir a neutralidade carbónica até 2050, apresentando ao país oportunidades significativas para os fatores competitivos do futuro.

Síntese da Implementação da Dimensão II – Transição Climática a 30.09.2025

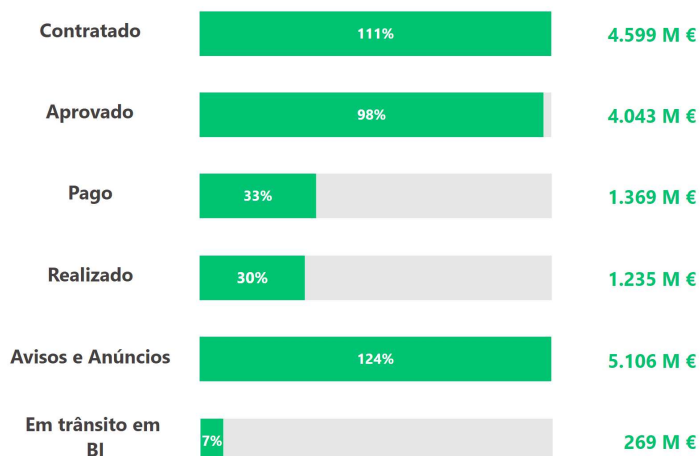

Evolução da Implementação Financeira até ao 3º trimestre de 2025

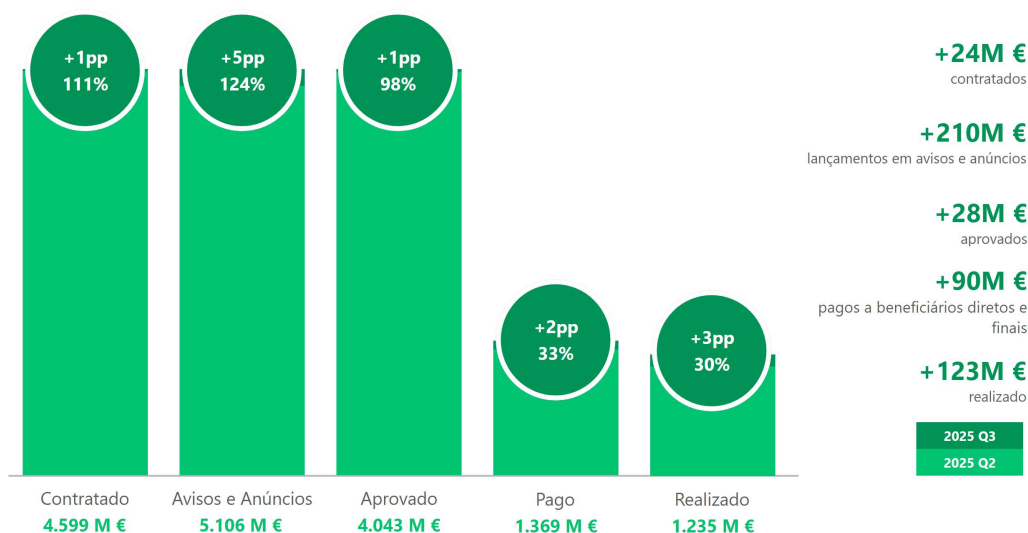

Os valores percentuais bem como as respetivas variações em pontos percentuais foram calculados tendo por base a dotação do PRR de 22.216 M €.

¹ PREENCHIMENTO EMRP.

4. Síntese da Implementação por Dimensão Estruturante




III - Transição Digital


2.675 M €


Dotação orçamental

A Transição Digital descreve 5 componentes para acelerar a transição de Portugal para uma sociedade mais digital, incluindo a capacitação e inclusão digital das pessoas através da educação, formação em competências digitais e promoção da literacia digital, transformação digital do setor empresarial e digitalização do Estado.

Síntese da Implementação da Dimensão III – Transição Digital a 30.09.2025

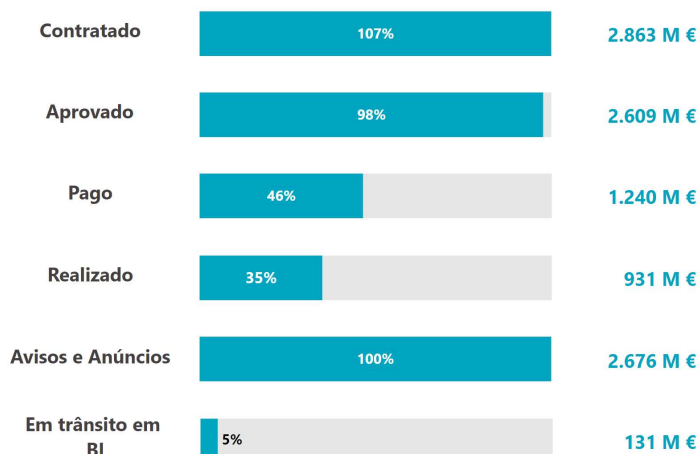

Evolução da Implementação Financeira até ao 3º trimestre de 2025

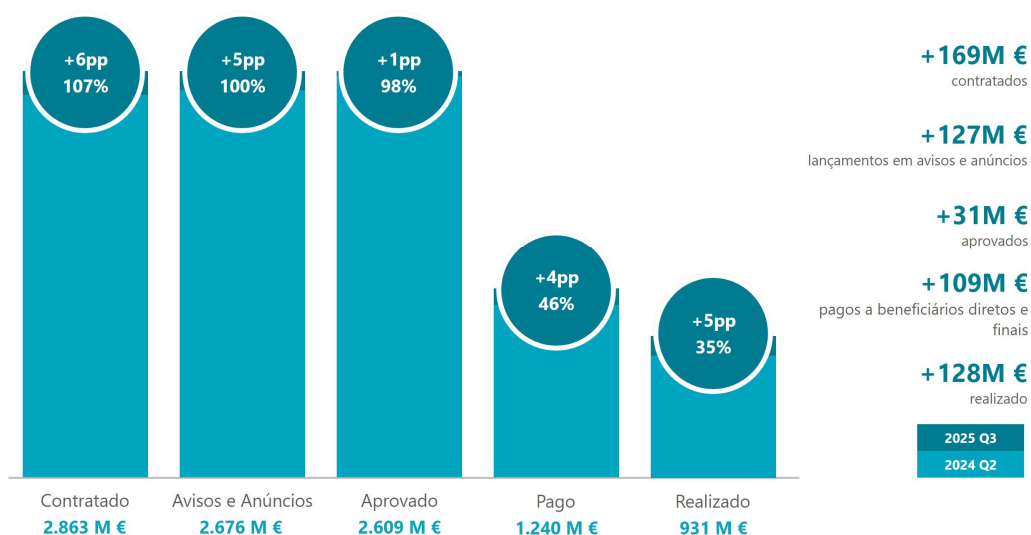

Os valores percentuais bem como as respetivas variações em pontos percentuais foram calculados tendo por base a dotação do PRR de 22.216 M €.

5

Síntese da Implementação por Componente


5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C01 Serviço Nacional de Saúde

2.108 M €
Dotação orçamental

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 30.09.2025

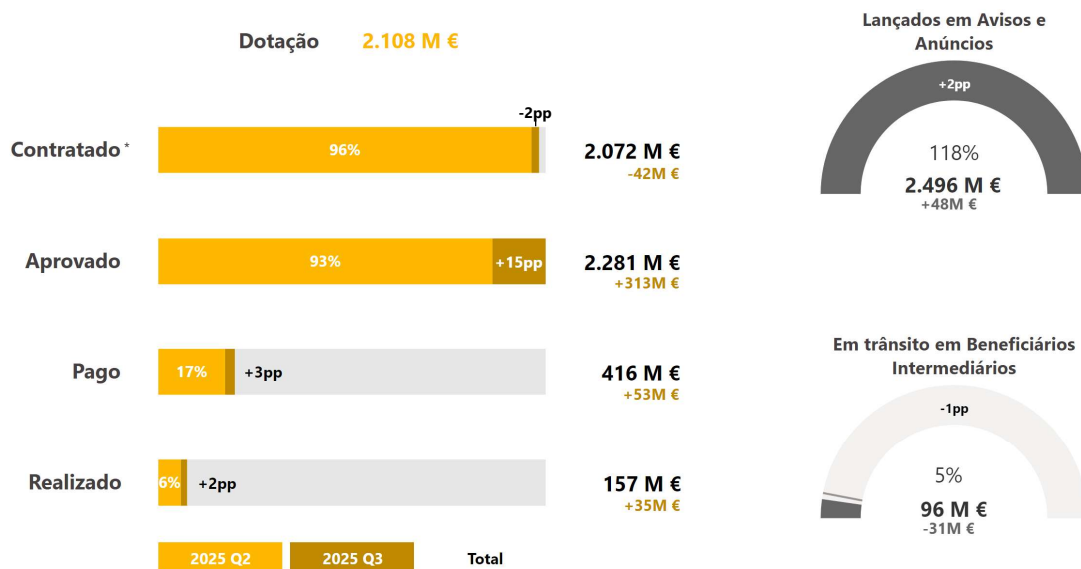

Reformas

CÓDIGO	REFORMA	ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO A 30.09.2025
C01-r01	Reforma dos cuidados de saúde primários	Concretizada
C01-r02	Reforma no domínio da saúde mental	Concretizada
C01-r03	Conclusão da reforma do modelo de governação dos hospitais públicos	Em fase avançada de implementação

* Ajuste da dotação no âmbito da reprogramação aprovada pela Comissão Europeia

5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C01 Serviço Nacional de Saúde

2.108 M €
Dotação orçamental

Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 30.09.2025	PAGO A 30.09.2025	REALIZADO A 30.09.2025
C01-i01	Cuidados de Saúde Primários com mais respostas Responsável: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE I.P.	676 M €	94%	18%	5%
C01-i02	Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e Rede Nacional de Cuidados Paliativos Responsável: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE I.P.	235 M €	201%	27%	0%
C01-i03	Conclusão da Reforma da Saúde Mental e implementação da Estratégia para as Demências Responsável: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE I.P.	88 M €	72%	22%	3%
C01-i04	Construção do Hospital de Lisboa Oriental e Equipamento para Hospitais em Lisboa e Vale do Tejo Responsável: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE I.P.	322 M €	95%	9%	0%
C01-i05.01-RAM	Fortalecimento do Serviço Regional de Saúde da Região Autónoma da Madeira - Expansão, Desenvolvimento e Melhoria da Rede de Cuidados Continuados Integrados Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM	61 M €	143%	17%	0%
C01-i05.02-RAM	Fortalecimento do Serviço Regional de Saúde da Região Autónoma da Madeira - Reforço das respostas na área da saúde mental e das demências associadas ao envelhecimento Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM	39 M €	101%	32%	22%
C01-i06	Transição Digital na Saúde Responsável: SPMS - SERVIÇOS PARTILHADOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, E.P.E.	300 M €	100%	36%	28%
C01-i07.01-RAM	Digitalização da Saúde na RAM-IASAUDE Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM	4 M €	100%	19%	7%
C01-i07.02-RAM	Digitalização da Saúde na RAM-SESARAM Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM	11 M €	100%	52%	45%
C01-i08-RAA	Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores Responsável: DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FUNDOS ESTRUTURAIS	30 M €	100%	59%	47%
C01-i09	Sistema Universal de Apoio à Vida Ativa Responsável: INSTITUTO PORTUGUÊS DO DESPORTO E JUVENTUDE, I.P.	10 M €	100%	59%	46%
C01-i10	Programa de Modernização Tecnológica do SNS Responsável: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE I.P.	197 M €	112%	13%	2%
C01-i11-RAA	Modernização e requalificação do SRS - Serviço Regional de Saúde, incluído a Rede de Cuidados Continuados e Paliativos Responsável: DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FUNDOS ESTRUTURAIS	36 M €			
C01-i12	Construção do Hospital de Lisboa Oriental Responsável: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE I.P.	100 M €	100%		0%


5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C02 Habitação

2.827 M €
Dotação orçamental

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 30.09.2025

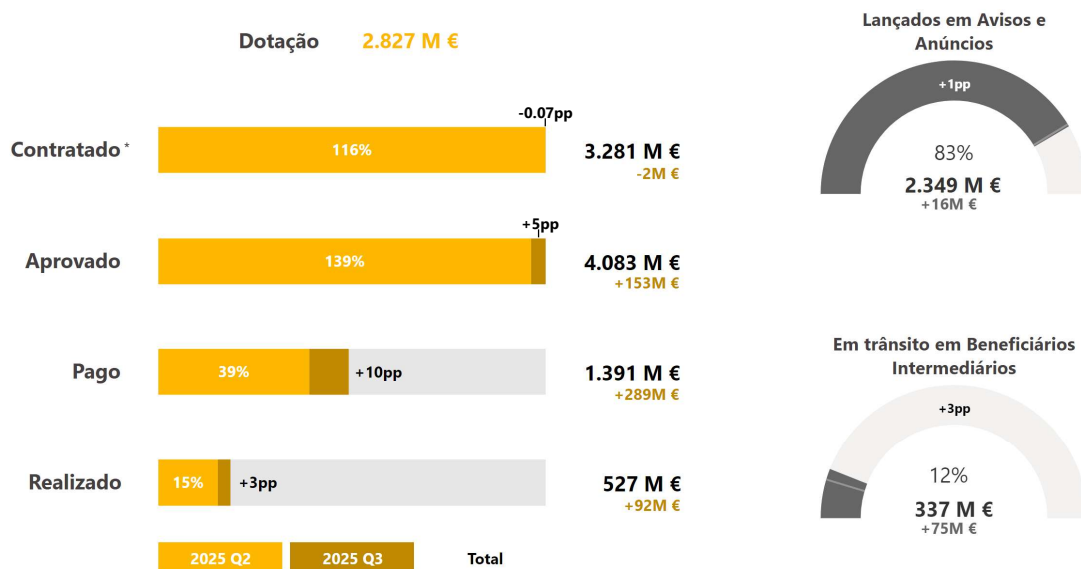

Reformas

CÓDIGO	REFORMA	ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO A 30.09.2025
C02-r04	Plano Nacional de Alojamento Urgente e Temporário	Concretizada

* Ajuste da dotação no âmbito da reprogramação aprovada pela Comissão Europeia

5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C02 Habitação

2.827 M €
Dotação orçamental

Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 30.09.2025	PAGO A 30.09.2025	REALIZADO A 30.09.2025
C02-i01	Programa de apoio ao acesso à habitação Responsável: INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, I.P.	1.094 M €	198%	71%	25%
C02-i02	Bolsa nacional de alojamento urgente e temporário Responsável: INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, I.P.	201 M €	69%	24%	12%
C02-i02.02	Alojamento Urgente e Temporário - Exército de Portugal Responsável: ESTADO MAIOR DO EXERCITO	24 M €	100%	41%	1%
C02-i02.03	Alojamento Urgente e Temporário - Forças de Segurança Pública Responsável: POLICIA DE SEGURANÇA PUBLICA	30 M €	100%	25%	0%
C02-i03-RAM	Reforço da oferta de habitação apoiada na Região Autónoma da Madeira Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM	136 M €	100%	28%	26%
C02-i04-RAA	Aumentar as condições habitacionais do parque habitacional da Região Autónoma dos Açores Responsável: DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FUNDOS ESTRUTURAIS	33 M €	133%	53%	37%
C02-i05	Parque público de habitação a custos acessíveis Responsável: INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, I.P.	463 M €	177%	48%	23%
C02-i06	Alojamento Estudantil a custos acessíveis Responsável: AGÊNCIA NACIONAL PARA A GESTÃO DO PROGRAMA ERASMUS+ EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	516 M €	100%	42%	14%
C02-i07-RAA	Infraestruturas para autoconstrução jovem Responsável: DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FUNDOS ESTRUTURAIS	4 M €	100%	28%	10%
C02-i08-RAA	Reinforcement of the social housing stock Responsável: DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FUNDOS ESTRUTURAIS	13 M €	148%	45%	26%
C02-i09	Support Programme for Access to Housing - Renovations Responsável: INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, I.P.	313 M €	61%	14%	1%


5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C03 Respostas Sociais

1.124 M €
Dotação orçamental

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 30.09.2025

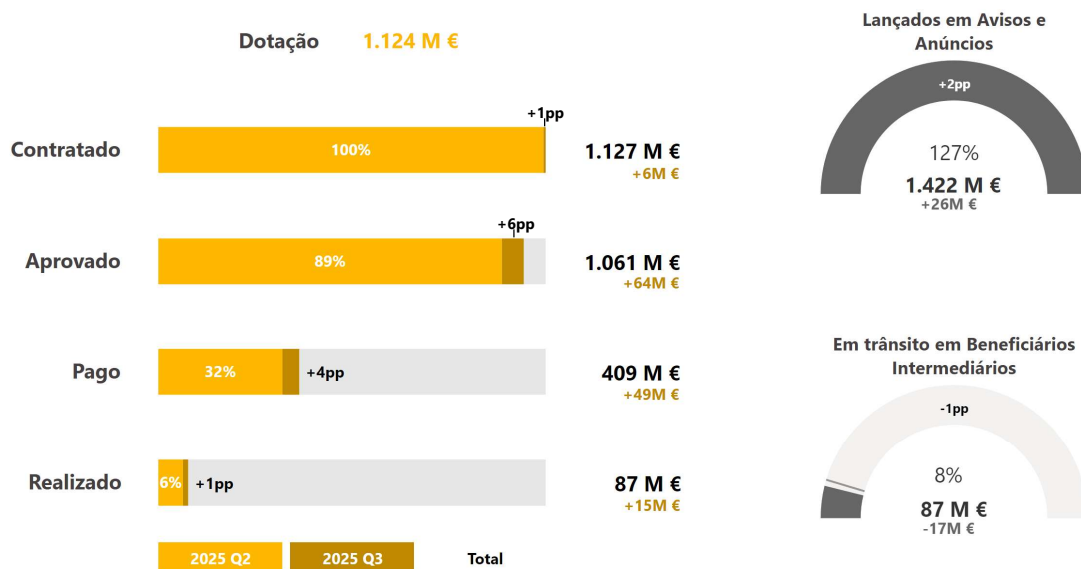

Reformas

CÓDIGO	REFORMA	ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO A 30.09.2025
C03-r05	Reforma da provisão de equipamentos e respostas sociais	Concretizada
C03-r06	Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência 2021-2025	Concretizada
C03-r07	Contratualização de programas integrados de apoio às comunidades desfavorecidas nas áreas metropolitanas	Concretizada
C03-r08	Estratégia Nacional de Combate à Pobreza	Concretizada
C03-r38	Simplificação e eficácia do sistema de segurança social	Em fase de implementação

5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C03 Respostas Sociais

1.124 M €
Dotação orçamental

Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 30.09.2025	PAGO A 30.09.2025	REALIZADO A 30.09.2025
C03-i01	Nova Geração de Equipamentos e Respostas Sociais Responsável: INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	669 M €	90%	42%	4%
C03-i02	Acessibilidades 360º Responsável: INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇÃO, I.P.	59 M €	76%	24%	6%
C03-i03-RAM	Fortalecimento das respostas sociais na Região Autónoma da Madeira (RAM) Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM	95 M €	114%	30%	8%
C03-i04-RAA	Implementar a Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social - Redes de Apoio Social (RAA) Responsável: DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FUNDOS ESTRUTURAIS	36 M €	112%	64%	58%
C03-i05	Plataforma +Acesso Responsável: INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇÃO, I.P.	3 M €	100%	45%	36%
C03-i06.01	Programa Bairros Saudáveis Responsável: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE I.P.	7 M €	98%	94%	94%
C03-i06.02	Operações Integradas em Comunidades Desfavorecidas na Área Metropolitana de Lisboa Responsável: ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA	122 M €	100%	21%	1%
C03-i06.03	Operações Integradas em Comunidades Desfavorecidas na Área Metropolitana do Porto Responsável: ÁREA METROPOLITANA DO PORTO	122 M €	100%	23%	17%
C03-i07-RAA	Requalificar e Alargar a Rede de Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas - Construção Responsável: DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FUNDOS ESTRUTURAIS	12 M €	92%	25%	12%


5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C04 Cultura

346 M €
Dotação orçamental

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 30.09.2025

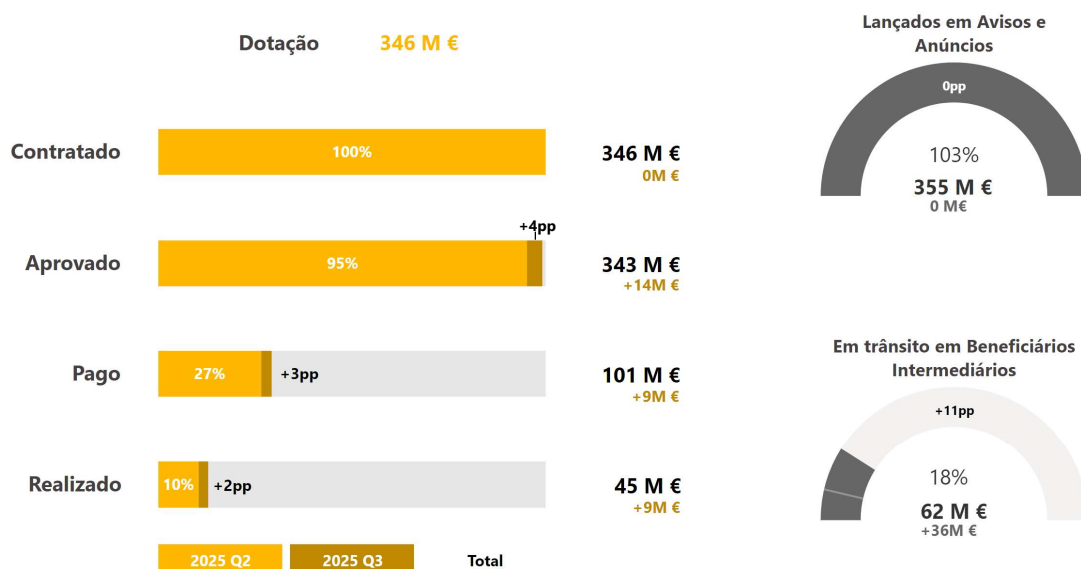

Reformas

Não existem reformas associadas a esta componente.

Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 30.09.2025	PAGO A 30.09.2025	REALIZADO A 30.09.2025
C04-i01	Redes Culturais e Transição Digital Responsável: GABINETE DE ESTRATÉGIA, PLANEAMENTO E AVALIAÇÃO CULTURAIS	102 M €	81%	35%	15%
C04-i02	Património Cultural Responsável: FUNDO DE SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO CULTURAL	243 M €	107%	27%	12%


5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C05 Capitalização e Inovação Empresarial

5.396 M €
Dotação orçamental

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 30.09.2025

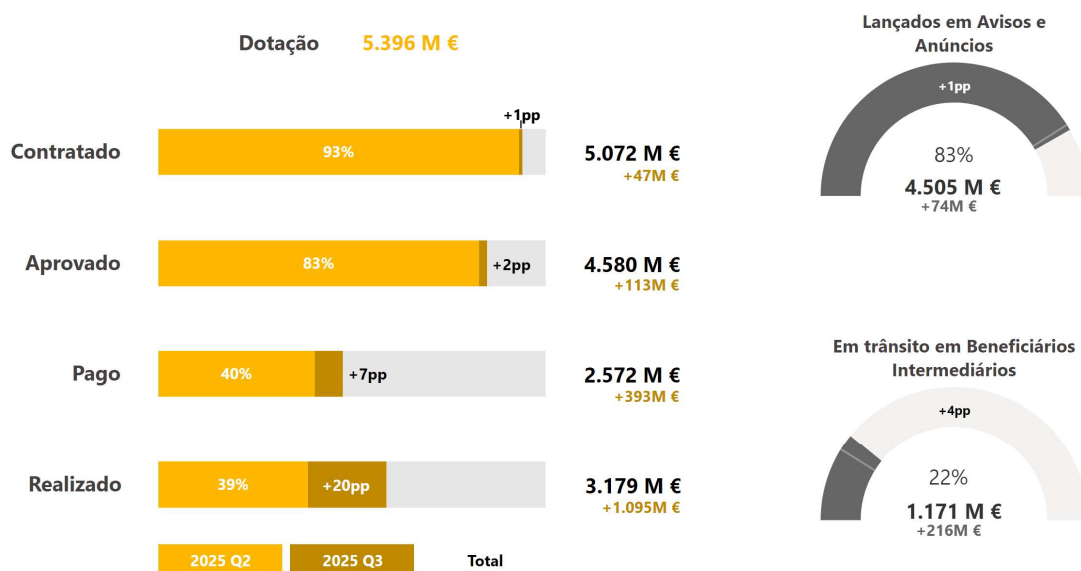

Reformas

CÓDIGO	REFORMA	ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO A 30.09.2025
C05-r09	Promoção da Investigação, Desenvolvimento e Inovação (I&D&I) e do investimento inovador nas empresas	Concretizada
C05-r10	Criação e desenvolvimento do Banco Português de Fomento	Concretizada
C05-r11	Alargamento e consolidação da Rede de Instituições de Interface	Concretizada
C05-r12	Agenda de investigação e inovação para a sustentabilidade da agricultura, alimentação e agroindústria	Concretizada
C05-r13	Desenvolvimento do mercado de capitais e promoção da capitalização das empresas não-financeiras	Concretizada

5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C05 Capitalização e Inovação Empresarial

5.396 M €
Dotação orçamental

Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 30.09.2025	PAGO A 30.09.2025	REALIZADO A 30.09.2025
C05-i01.01	Agendas/Alianças mobilizadoras para a Inovação Empresarial Responsável: IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P.	558 M €	84%	45%	53%
C05-i01.02	Agendas/Alianças Verdes para a Inovação Empresarial Responsável: IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P.	372 M €	91%	44%	71%
C05-i02	Missão Interface - renovação da rede de suporte C&T e orientação para o tecido produtivo Responsável: ANI - AGÊNCIA NACIONAL DE INOVAÇÃO, S.A.	186 M €	102%	67%	56%
C05-i03	Agenda de investigação e inovação para a sustentabilidade da agricultura, alimentação e agroindústria Responsável: INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS (IFAP, I.P.)	93 M €	100%	48%	31%
C05-i04-RAA	Recapitalizar o Sistema Empresarial dos Açores Responsável: DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FUNDOS ESTRUTURAIS	95 M €	140%	39%	34%
C05-i05-RAA	Recuperação Económica da Agricultura dos Açores Responsável: DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FUNDOS ESTRUTURAIS	34 M €	148%	32%	20%
C05-i06.01	Capitalização de empresas e resiliência financeira/Banco Português de Fomento/IAPMEI Responsável: BANCO PORTUGUÊS DE FOMENTO, S.A.	850 M €	110%	79%	97%
C05-i06.02	Capitalização de empresas e resiliência financeira/Banco Português de Fomento Responsável: BANCO PORTUGUÊS DE FOMENTO, S.A.	250 M €	100%	100%	0%
C05-i07-RAM	Instrumentos de capitalização para empresas da Madeira Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM	4 M €	100%	13%	0%
C05-i08.01	Ciência Mais Digital Responsável: FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA	70 M €	100%	44%	35%
C05-i08.02	Ciência Mais Digital Responsável: AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.	25 M €	23%	0%	0%
C05-i09	Reforço: Agendas/Alianças Mobilizadoras para a Inovação Empresarial Responsável: IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P.	319 M €	81%	45%	94%
C05-i10	Reforço: Agendas/Alianças Verdes para a Inovação Empresarial Responsável: IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P.	320 M €	93%	52%	93%
C05-i11	Reforço: Agendas/Alianças Mobilizadoras para a Inovação Empresarial (Empréstimos) Responsável: IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P.	772 M €	99%	57%	90%
C05-i12	Reforço: Agendas/Alianças Verdes para a Inovação Empresarial (Empréstimos) Responsável: IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P.	533 M €	116%	44%	56%
C05-i13	Unidades de Investigação Científica Responsável: FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA	110 M €	100%	0%	0%
C05-i14.01	Inovação Empresarial Responsável: BANCO PORTUGUÊS DE FOMENTO, S.A.	322 M €			0%
C05-i14.02	Inovação Empresarial Responsável: STARTUP PORTUGAL - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A PROMOÇÃO DO EMPREENDEDORISMO - SPAPPE	2 M €			
C05-i15-RAA	Recapitalizar Sistema Empresarial dos Açores (Fundo) Responsável: DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FUNDOS ESTRUTURAIS	30 M €			0%
C05-i16	InvestEU Member State Compartment Responsável: BANCO PORTUGUÊS DE FOMENTO, S.A.	450 M €			0%


5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C06 Qualificação e Competências

1.958 M €
Dotação orçamental

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 30.09.2025

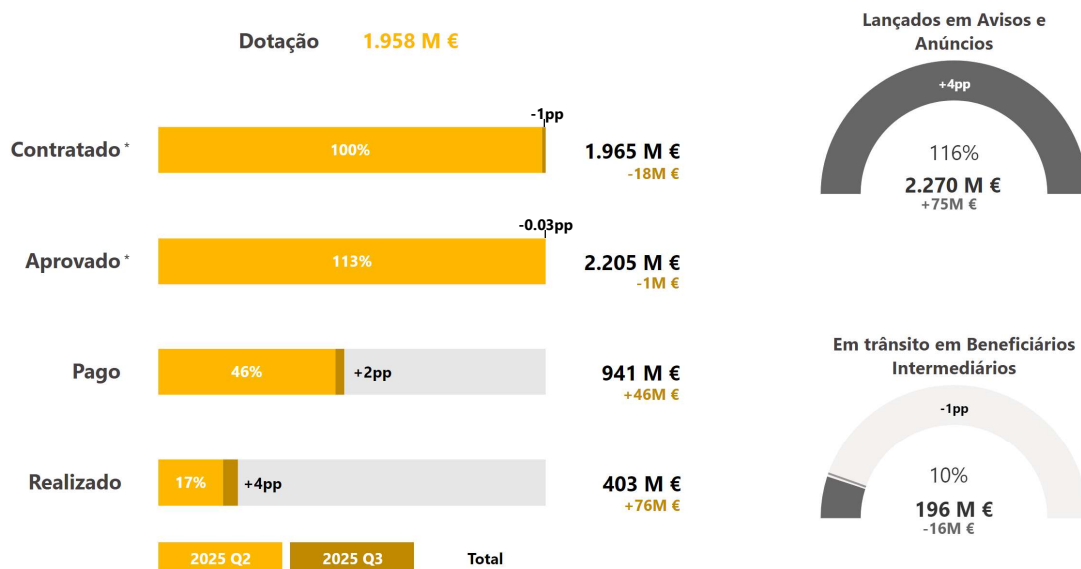

Reformas

CÓDIGO	REFORMA	ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO A 30.09.2025
C06-r14	Reforma do ensino e formação profissionais	Em fase de implementação
C06-r15	Reforma da cooperação entre ensino superior e administração pública e empresas	Concretizada
C06-r16	Redução das restrições nas profissões altamente regulamentadas	Concretizada
C06-r17	Agenda de promoção do trabalho digno	Concretizada
C06-r18	Combate às desigualdades entre mulheres e homens	Em fase de implementação

* Ajuste da dotação no âmbito da reprogramação aprovada pela Comissão Europeia

5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C06 Qualificação e Competências

1.958 M €
Dotação orçamental

Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 30.09.2025	PAGO A 30.09.2025	REALIZADO A 30.09.2025
C06-i01.01	Instalação e/ou modernização dos Centros Tecnológicos Especializados: Responsável: INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO, I.P.	480 M €	100%	51%	5%
C06-i01.02	Modernização da oferta e dos estabelecimentos de ensino e da formação profissional - Modernização da Formação Profissional Responsável: INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P.	230 M €	100%	29%	22%
C06-i01.03	Modernização das instituições de ensino e formação profissionais - Instalação e/ou modernização dos Centros Tecnológicos Especializados - Turismo Responsável: TURISMO DE PORTUGAL I.P.	20 M €	100%	19%	8%
C06-i02	Compromisso Emprego Sustentável Responsável: INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P.	230 M €	153%	94%	54%
C06-i03.01	Incentivo Adultos - Projetos Locais Promotores de Qualificações de Nível B1/B2/B3 Responsável: AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO E O ENSINO PROFISSIONAL, I.P.	40 M €	97%	19%	8%
C06-i03.02	Incentivo Adultos - Acelerador Qualifica Responsável: AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO E O ENSINO PROFISSIONAL, I.P.	55 M €	67%	65%	65%
C06-i03.03	Impulso Adultos Responsável: DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR	138 M €	100%	41%	37%
C06-i04.01	Impulso Jovens STEAM Responsável: DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR	131 M €	100%	54%	49%
C06-i04.02	Impulso Jovens STEAM - Rede Ciência Viva Responsável: CIÊNCIA VIVA - AGÊNCIA NACIONAL PARA A CULTURA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	9 M €	92%	65%	3%
C06-i05-RAA	Qualificação de adultos e aprendizagem ao longo da vida na RAA Responsável: DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FUNDOS ESTRUTURAIS	22 M €	150%	54%	39%
C06-i06	Ciência Mais Capacitação Responsável: FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA	45 M €	20%	9%	9%
C06-i07	Impulso Mais Digital - Reforma e Modernização das Ciências Agrárias Responsável: DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR	105 M €	100%	33%	4%
C06-i08-RAM	Polo Científico e Tecnológico da Madeira - Ampliação do Edifício CITMA Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM		0%	0%	0%
C06-i09.01	Escolas novas ou renovadas - CCDR Norte Responsável: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE, I. P. (CCDR NORTE, I. P.)	125 M €	136%	33%	2%
C06-i09.02	Escolas novas ou renovadas - CCDR Centro Responsável: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO, I.P. (CCDR CENTRO I.P.)	150 M €	140%	37%	1%
C06-i09.03	Escolas novas ou renovadas - CCDR LVT Responsável: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO, I.P. (CCDR LISBOA E VALE DO TEJO, I.P.)	125 M €	138%	55%	21%
C06-i09.04	Escolas novas ou renovadas - CCDR Alentejo Responsável: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, I. P. (CCDR ALENTEJO, I. P.)	20 M €	118%	41%	10%
C06-i09.05	Escolas novas ou renovadas - CCDR Algarve Responsável: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE, I.P. (CCDR ALGARVE, I.P.)	30 M €	95%	30%	2%
C06-i09.06	Escolas novas ou renovadas -Exército de Portugal Responsável: ESTADO MAIOR DO EXERCITO	4 M €	100%	40%	0%


5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C07 Infraestruturas

813 M €
Dotação orçamental

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 30.09.2025

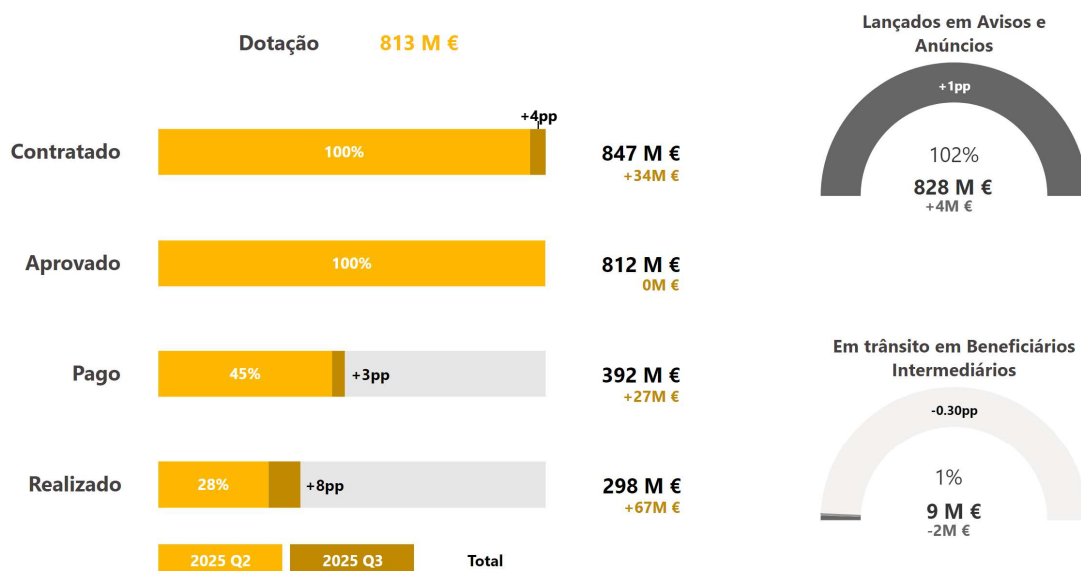

Reformas

Não existem reformas associadas a esta componente.

5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C07 Infraestruturas

813 M €
Dotação orçamental

Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 30.09.2025	PAGO A 30.09.2025	REALIZADO A 30.09.2025
C07-i02.01	Missing links e Aumento capacidade da Rede - EN14, EN4, IC35, IP2, EN125, EN211, EN344, IC2, IP8 (A26), Baião/Ponte Ermida, IP8 (EN121), IP8 (EN259) Responsável: INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.	320 M	100%	64%	54%
C07-i02.02	Missing links e Aumento capacidade da Rede - Eixo Rodoviário Aveiro – Águeda Responsável: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO, I.P. (CCDR CENTRO I.P.)	47 M	100%	13%	0%
C07-i03.01	Ligações transfronteiriças - Ponte internacional sobre o Rio Sever Responsável: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, I. P. (CCDR ALENTEJO, I. P.)	11 M	100%	7%	4%
C07-i03.02	Ligações transfronteiriças - Ponte Alcoutim – Salunçar del Guadiana (ES) Responsável: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE, I.P. (CCDR ALGARVE, I.P.)	11 M	100%	9%	5%
C07-i03.03	Ligações transfronteiriças - EN103. Vinhais / Bragança (variantes) Responsável: INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.	37 M	100%	39%	24%
C07-i03.04	Ligações transfronteiriças - Ligação de Bragança a Puebla de Sanabria (ES) Responsável: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE, I. P. (CCDR NORTE, I. P.)	19 M	100%	10%	0%
C07-i04.01	Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) – Acessibilidades Rodoviárias Responsável: INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.	106 M	100%	77%	70%
C07-i04.02	Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) – Acessibilidades Rodoviárias - EN10-4. Setúbal/ Mitrena e Ligação da A8 à Área Empresarial das Palhagueiras em Torres Vedras Responsável: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO, I.P. (CCDR LISBOA E VALE DO TEJO, I.P.)	11 M	120%	30%	40%
C07-i04.03	Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) – Acessibilidades Rodoviárias : Ligação do Parque Empresarial do Casarão ao IC2 Responsável: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO, I.P. (CCDR CENTRO I.P.)	7 M	100%	14%	1%
C07-i04.04	Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) – Acessibilidades Rodoviárias Responsável: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE, I. P. (CCDR NORTE, I. P.)	42 M	93%	20%	6%
C07-i04.05	Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) – Acessibilidades Rodoviárias - Rotunda na EN246 para acesso à zona industrial de Portalegre Responsável: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, I. P. (CCDR ALENTEJO, I. P.)	234 K	100%	96%	194%
C07-i05-RAA	Circuitos Logísticos - Rede Viária Regional dos Açores Responsável: DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FUNDOS ESTRUTURAIS	92 M	100%	52%	34%
C07-i06.01	Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) Responsável: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE, I. P. (CCDR NORTE, I. P.)	31 M			0%
C07-i06.02	Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) Responsável: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO, I.P. (CCDR CENTRO I.P.)	32 M			0%
C07-i06.03	Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) Responsável: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO, I.P. (CCDR LISBOA E VALE DO TEJO, I.P.)	13 M			0%
C07-i06.04	Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) Responsável: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, I. P. (CCDR ALENTEJO, I. P.)	30 M			0%
C07-i06.05	Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) Responsável: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE, I.P. (CCDR ALGARVE, I.P.)	4 M			0%


5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C08 Florestas

600 M €
Dotação orçamental

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 30.09.2025

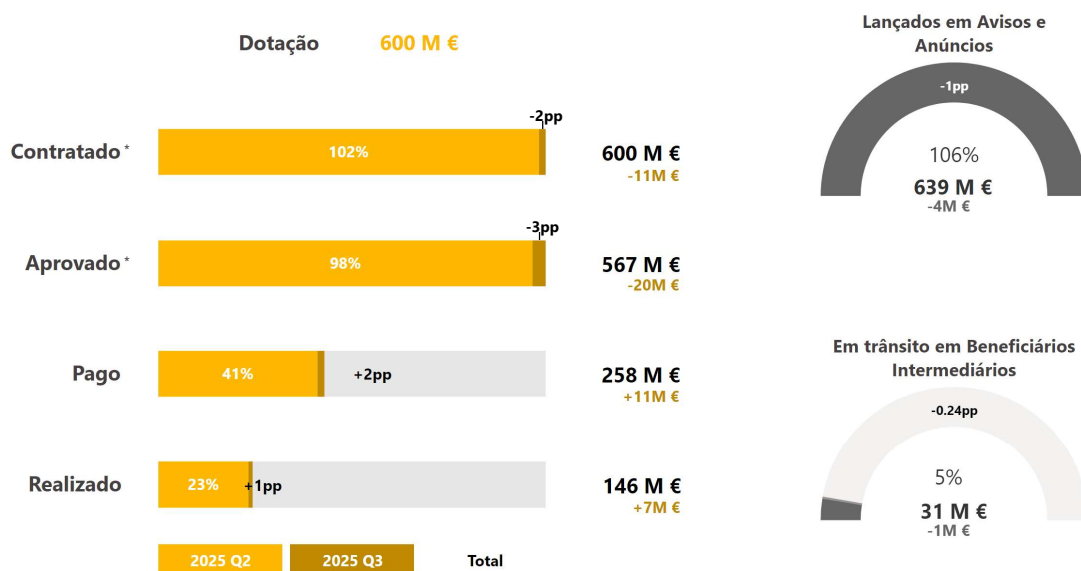

Reformas

CÓDIGO	REFORMA	ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO A 30.09.2025
C08-r19	Transformação da paisagem dos territórios de floresta vulneráveis	Concretizada
C08-r20	Reorganização do sistema de cadastro da propriedade rústica e do Sistema de Monitorização de Ocupação do Solo	Concretizada
C08-r21	Prevenção e combate de fogos rurais	Concretizada

* Ajuste da dotação no âmbito da reprogramação aprovada pela Comissão Europeia

5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C08 Florestas

600 M €
Dotação orçamental

Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 30.09.2025	PAGO A 30.09.2025	REALIZADO A 30.09.2025
C08-i01.01	Transformação da Paisagem dos Territórios de Floresta Vulneráveis - "Áreas integradas de gestão da paisagem (AIGP) e Condomínios de Aldeia" Responsável: FUNDO AMBIENTAL	195 M	101%	23%	1%
C08-i01.02	Transformação da Paisagem dos Territórios de Floresta Vulneráveis: Programas de Reordenamento e Gestão da Paisagem Responsável: DIREÇÃO-GERAL DO TERRITÓRIO	3 M	100%	61%	48%
C08-i01.03	Transformação da Paisagem dos Territórios de Floresta Vulneráveis - Emparcelar para Ordenar Responsável: INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS (IFAP, I.P.)	10 M	2%	0%	2%
C08-i01.04	Transformação da paisagem dos territórios de floresta vulneráveis Responsável: INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.	53 M	100%	13%	0%
C08-i02.01	Cadastro da Propriedade Rústica e Sistema de Monitorização da Ocupação do Solo: SMOS Responsável: DIREÇÃO-GERAL DO TERRITÓRIO	28 M	100%	65%	34%
C08-i02.02	Cadastro da Propriedade Rústica e Sistema de Monitorização da Ocupação do Solo: Inventário Florestal Nacional Responsável: INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.	3 M	100%	23%	12%
C08-i02.03	Cadastro da Propriedade Rústica e Sistema de Monitorização da Ocupação do Solo: Sistema Nacional de Cadastro Predial Responsável: SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA JUSTIÇA	31 M	100%	99%	63%
C08-i02.04	Cadastro da Propriedade Rústica e Sistema de Monitorização da Ocupação do Solo: Sistema Nacional de Cadastro Predial – Dimensão Local Região Norte Responsável: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE, I. P. (CCDR NORTE, I. P.)	5 M	99%	1%	0%
C08-i02.05	Cadastro da Propriedade Rústica e Sistema de Monitorização da Ocupação do Solo: Sistema Nacional de Cadastro Predial – Dimensão Local Região Centro Responsável: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO, I.P. (CCDR CENTRO I.P.)	5 M	100%	10%	3%
C08-i03	Faixas de gestão de combustível - Rede Primária Responsável: INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.	105 M	100%	23%	10%
C08-i04.01	Meios de prevenção e combate a incêndios rurais – Subinvestimento Meios aéreos Responsável: ESTADO MAIOR DA FORÇA AEREA	70 M	100%	99%	61%
C08-i04.02	Meios de prevenção e combate a incêndios rurais – Subinvestimento Meios terrestres Responsável: INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.	16 M	100%	98%	96%
C08-i04.03	Meios de prevenção e combate a incêndios rurais: Rede de radares Responsável: INSTITUTO PORTUGUÊS DO MAR E DA ATMOSFERA, I.P.	3 M	100%	100%	99%
C08-i05.01	Programa MAIS Floresta: Reforma do sistema de prevenção e combate de incêndios Responsável: SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	40 M	100%	91%	93%
C08-i05.02	Programa MAIS Floresta: Reforço de atuação das organizações de produtores florestais (OPF) e dos Centros de Competências no setor florestal Responsável: FUNDO AMBIENTAL	10 M	84%	45%	38%
C08-i05.03	Programa MAIS Floresta: Reforma do sistema de prevenção e combate de incêndios Responsável: FUNDO AMBIENTAL	14 M			0%
C08-i05.04	Programa MAIS Floresta: sanidade vegetal e animal Responsável: INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, I.P.	10 M			0%


5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C09 Gestão Hídrica

236 M €
Dotação orçamental

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 30.09.2025

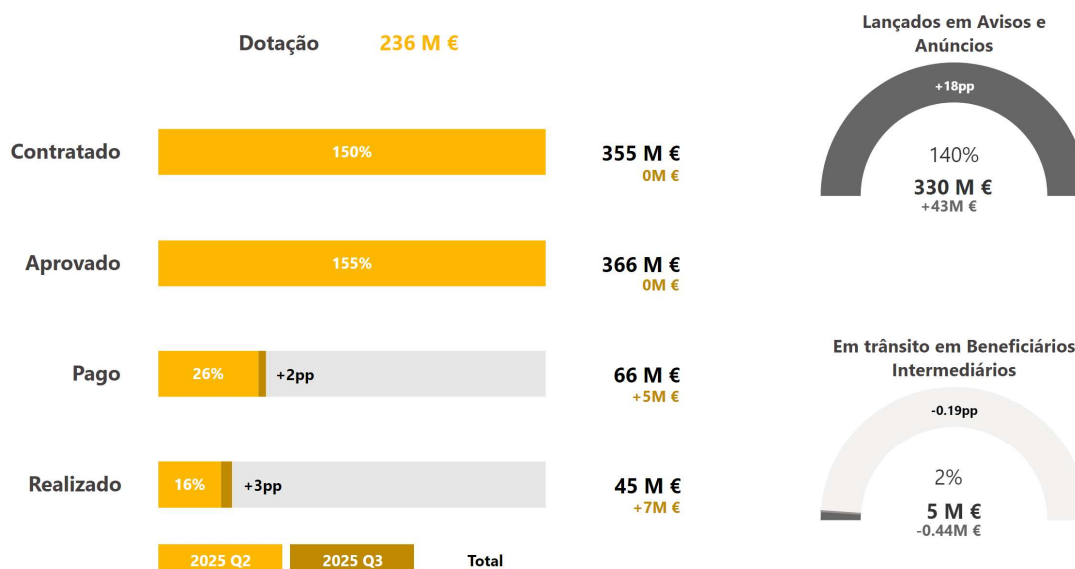

Reformas

Não existem reformas associadas a esta componente.

Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 30.09.2025	PAGO A 30.09.2025	REALIZADO A 30.09.2025
C09-i01.01	Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve: SM1 – Reduzir perdas de água no setor urbano Responsável: CI - AMAL - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE	44 M €	137%	47%	48%
C09-i01.02	Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve: SM2 – Reduzir perdas de água e aumentar a eficiência no setor agrícola Responsável: FUNDO AMBIENTAL	19 M €	73%	10%	1%
C09-i01.03	Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve: SM3 – Reforçar a governança dos recursos hídricos Responsável: AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.	6 M €	100%	37%	27%
C09-i01.04	Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve: SM4 – Promover a utilização de Água Residual Tratada, SM5 – Aumentar a capacidade disponível e resiliência das albufeiras/sistemas de adução em alta existentes e reforçar com novas origens de água e SM Responsável: ÁGUAS DO ALGARVE S.A.	51 M €	330%	42%	23%
C09-i03-RAM	Plano de eficiência e reforço hídrico dos sistemas de abastecimento e regadio da RAM Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM	82 M €	100%	24%	12%
C09-i05	Parque fotovoltaico de Alqueva Responsável: EDIA - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA S.A.	35 M €	100%		0%

*Ajuste de investimentos decorrentes da reprogramação

5. Síntese da Implementação por Componente




COMPONENTE C10

Mar

388 M €

Dotação orçamental

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 30.09.2025

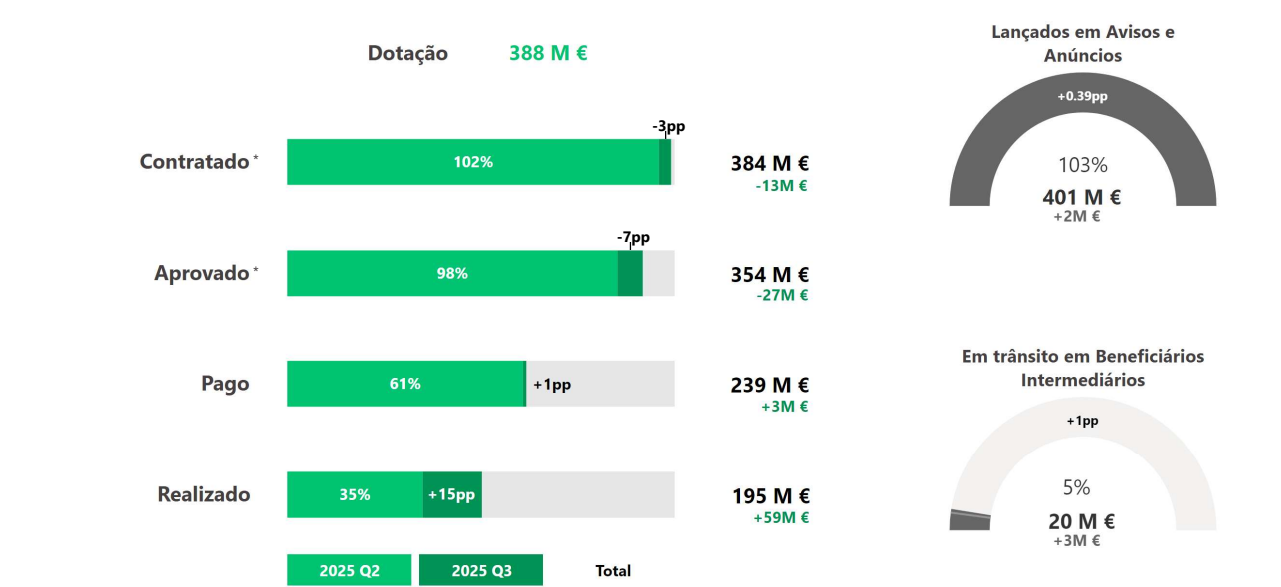

Reformas

CÓDIGO	REFORMA	ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO A 30.09.2025
C10-r23	Reforma do Ecossistema de Infraestruturas de Suporte à Economia Azul	Concretizada

Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 30.09.2025	PAGO A 30.09.2025	REALIZADO A 30.09.2025
C10-i01	Hub Azul, Rede de Infraestruturas para a Economia Azul Responsável: FUNDO AZUL	86 M €	81%	36%	22%
C10-i02	Transição Verde e Digital e Segurança nas Pescas Responsável: INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS (IFAP, I.P.)	25 M €	94%	51%	33%
C10-i03.01	Pilar I - Plataforma Naval Multifuncional e Pilar II - Centro de Operações Responsável: MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL-MARINHA	148 M €	100%	99%	79%
C10-i03.02	Centro de Operações de Defesa do Atlântico e Plataforma Naval - Pilar III - Academia do Arsenal do Alfeite (Academia 4.0) Responsável: ARSENAL DO ALFEITE, S.A.	2 M €	100%	92%	90%
C10-i04-RAA	Desenvolvimento do "Cluster do Mar dos Açores" Responsável: DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FUNDOS ESTRUTURAIS	52 M €	93%	63%	31%
C10-i05-RAA	Transição energética, digitalização e redução do impacto ambiental no setor da Pesca e da Aquicultura Responsável: DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FUNDOS ESTRUTURAIS	5 M €	100%	13%	0%
C10-i06-RAM	Transição energética, digitalização e redução do impacto ambiental no setor da Pesca e da Aquicultura Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM	20 M €	100%	13%	0%
C10-i07	Green Shipping Responsável: IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P.	50 M €	74%	23%	21%

* Ajuste da dotação no âmbito da reprogramação aprovada pela Comissão Europeia


5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C11
Descarbonização da Indústria

737 M €
Dotação orçamental

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 30.09.2025

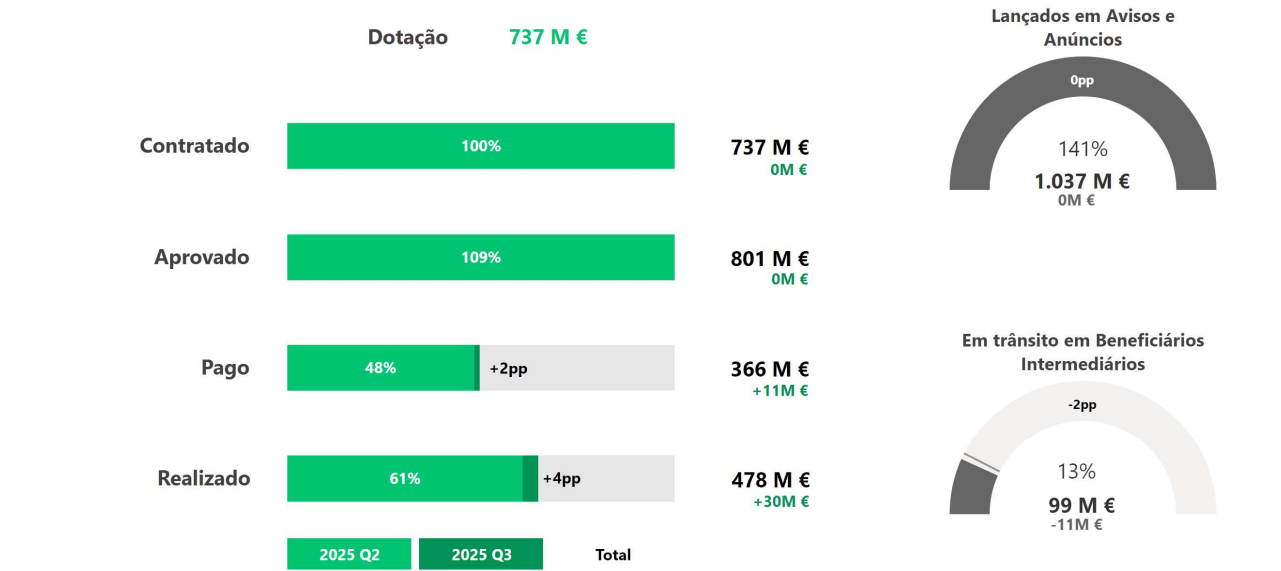

Reformas

Não existem reformas associadas a esta componente.

Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 30.09.2025	PAGO A 30.09.2025	REALIZADO A 30.09.2025
C11-i01	Descarbonização da Indústria Responsável: IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P.	737 M €	109%	50%	65%

5. Síntese da Implementação por Componente




COMPONENTE C12

Bioeconomia Sustentável

175 M €

Dotação orçamental

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 30.09.2025

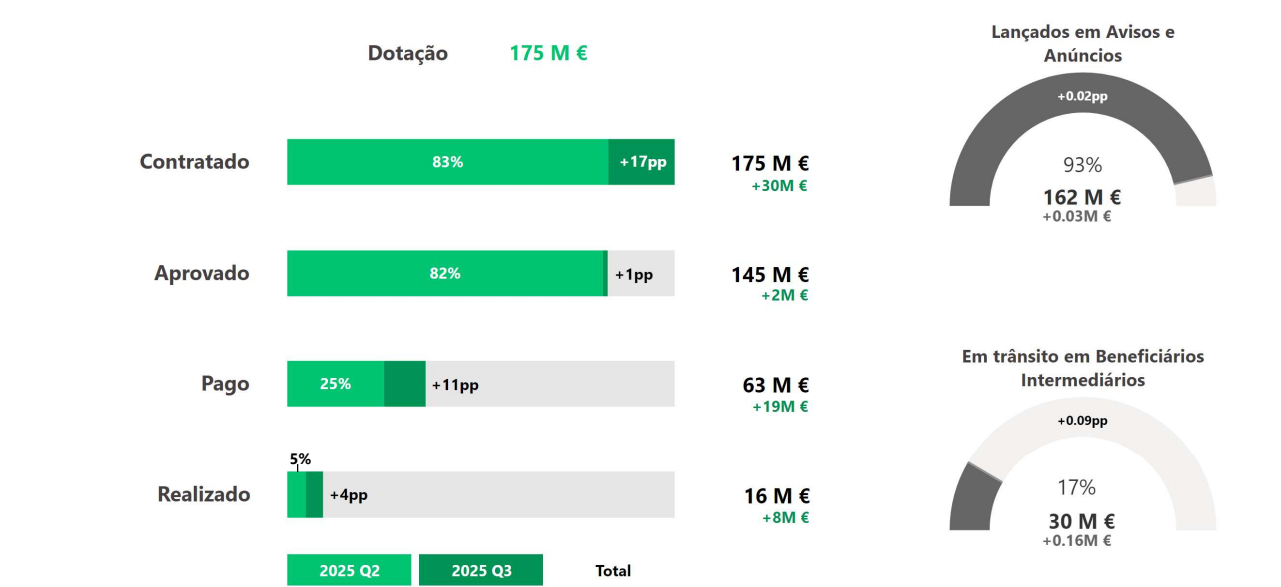

Reformas

CÓDIGO	REFORMA	ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO A 30.09.2025
C12-r25	Bioeconomia sustentável	Concretizada
C12-r39	Promover a economia circular e uma gestão mais eficiente dos resíduos	Em fase avançada de implementação

Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 30.09.2025	PAGO A 30.09.2025	REALIZADO A 30.09.2025
C12-i01.01	Bioeconomia: Projetos Integrados (Têxtil e Vestuário, Calçado e Resina Natural) e Beneficiação de Povoamentos de Pinheiro Bravo com Potencial para a Resinagem Responsável: FUNDO AMBIENTAL	140 M €	100%	41%	8%
C12-i01.02	Bioeconomia - Gestão Florestal e Apoio à Resinagem Responsável: INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.	5 M €	99%	95%	83%
C12-i02	Reciclagem e valorização de resíduos Responsável: FUNDO AMBIENTAL	30 M €			

5. Síntese da Implementação por Componente




COMPONENTE C13

Eficiência Energética em Edifícios

622 M €

Dotação orçamental

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 30.09.2025

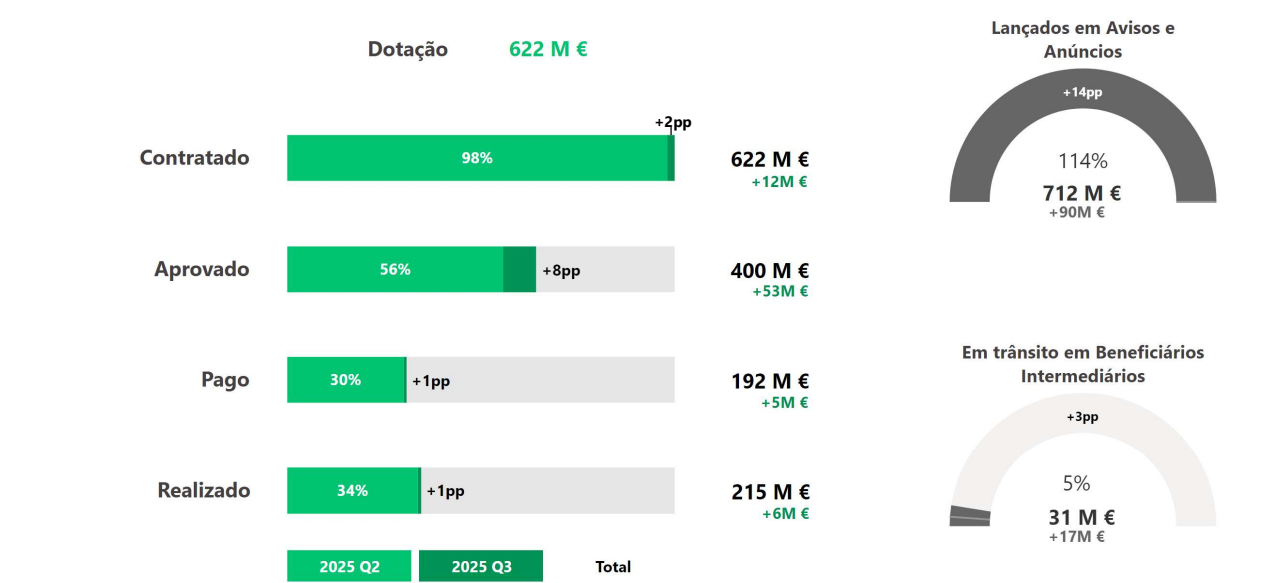

Reformas

Não existem reformas associadas a esta componente.

Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 30.09.2025	PAGO A 30.09.2025	REALIZADO A 30.09.2025
C13-i01	Eficiência energética em edifícios residenciais Responsável: FUNDO AMBIENTAL	312 M	49%	5%	6%
C13-i02	Eficiência energética em edifícios da administração pública central Responsável: FUNDO AMBIENTAL	220 M	92%	22%	0%
C13-i02.01	Eficiência energética em edifícios da administração pública central - IGFEJ Responsável: INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA E EQUIPAMENTOS DA JUSTIÇA, I.P.	14 M	100%		0%
C13-i02.02	Eficiência energética em edifícios da administração pública central - INMLCF Responsável: INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL E CIÊNCIAS FORENSES, I.P.	282 K	100%	13%	0%
C13-i02.03	Eficiência energética em edifícios da administração pública central - IRN Responsável: INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO, I.P.	455 K	100%	13%	0%
C13-i02.04	Eficiência energética em edifícios da administração pública central - PJ Responsável: POLICIA JUDICIARIA	4 M	100%	13%	0%
C13-i02.05	Eficiência energética em edifícios da administração pública central - DGAJ Responsável: DIRECÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA	1 M	100%	13%	0%
C13-i02.06	Eficiência energética em edifícios da administração pública central - DGRSP Responsável: DIRECÇÃO-GERAL DE REINSERÇÃO E SERVIÇOS PRISIONAIS	404 K	100%	13%	0%
C13-i03	Eficiência energética em edifícios de serviços Responsável: FUNDO AMBIENTAL	70 M	36%	5%	6%

*Projetos transferidos para a C21


5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C14
Hidrogénio e Renováveis

415 M €
Dotação orçamental

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 30.09.2025

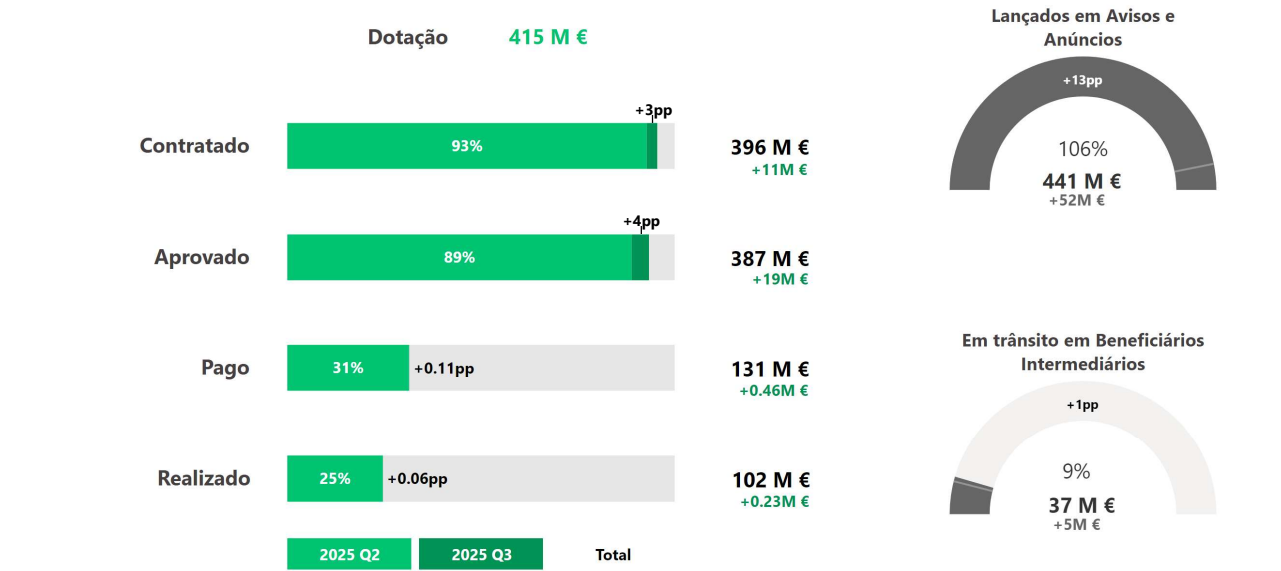

Reformas

CÓDIGO	REFORMA	ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO A 30.09.2025
C14-r29	Estratégia Nacional para o Hidrogénio (EN-H2)	Concretizada

Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 30.09.2025	PAGO A 30.09.2025	REALIZADO A 30.09.2025
C14-i01	Hidrogénio e gases renováveis Responsável: FUNDO AMBIENTAL	185 M €	91%	4%	0%
C14-i02-RAM	Potenciação da eletricidade renovável no Arquipélago da Madeira Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM	95 M €	88%	65%	62%
C14-i03-RAA	Transição Energética nos Açores Responsável: DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FUNDOS ESTRUTURAIS	135 M €	100%	46%	32%

*


5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C15
Mobilidade Sustentável

847 M €
Dotação orçamental

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 30.09.2025

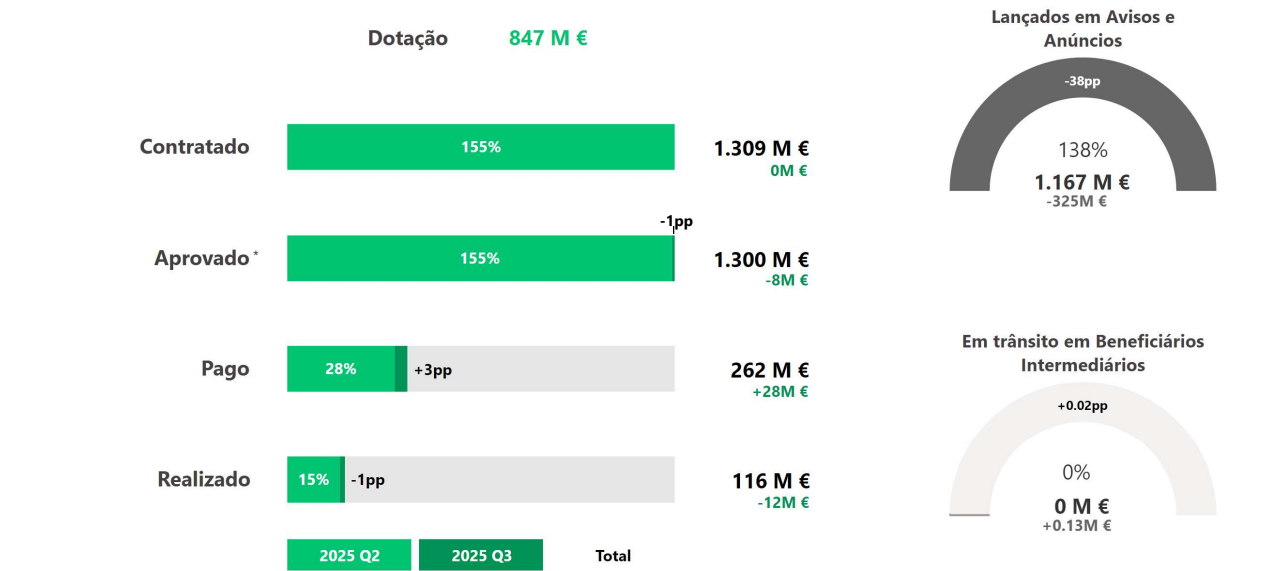

Reformas		
CÓDIGO	REFORMA	ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO A 30.09.2025
C15-r30	Reforma do ecossistema de transportes	Concretizada

Investimentos					
CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 30.09.2025	PAGO A 30.09.2025	REALIZADO A 30.09.2025
C15-i01	Expansão da Rede de Metro de Lisboa - Linha Vermelha até Alcântara Responsável: METROPOLITANO DE LISBOA, E.P.E.	285 M	125%	14%	6%
C15-i03	Metro Ligeiro de Superfície Odivelas-Loures Responsável: METROPOLITANO DE LISBOA, E.P.E.		0%	0%	0%
C15-i04	Linha BRT Boavista - Império Responsável: METRO DO PORTO S.A.	66 M	100%	57%	31%
C15-i05	Descarbonização dos Transportes Públicos Responsável: FUNDO AMBIENTAL	48 M	82%	65%	60%
C15-i06	Digitalização do Transporte Ferroviário Responsável: INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.	95 M	100%	15%	2%
C15-i08	Expansão da Rede de Metro do Porto - Casa da Música-Santo Ovídio Responsável: METRO DO PORTO S.A.	352 M	100%	31%	8%


5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C21
REPower EU

951 M €
Dotação orçamental

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 30.09.2025

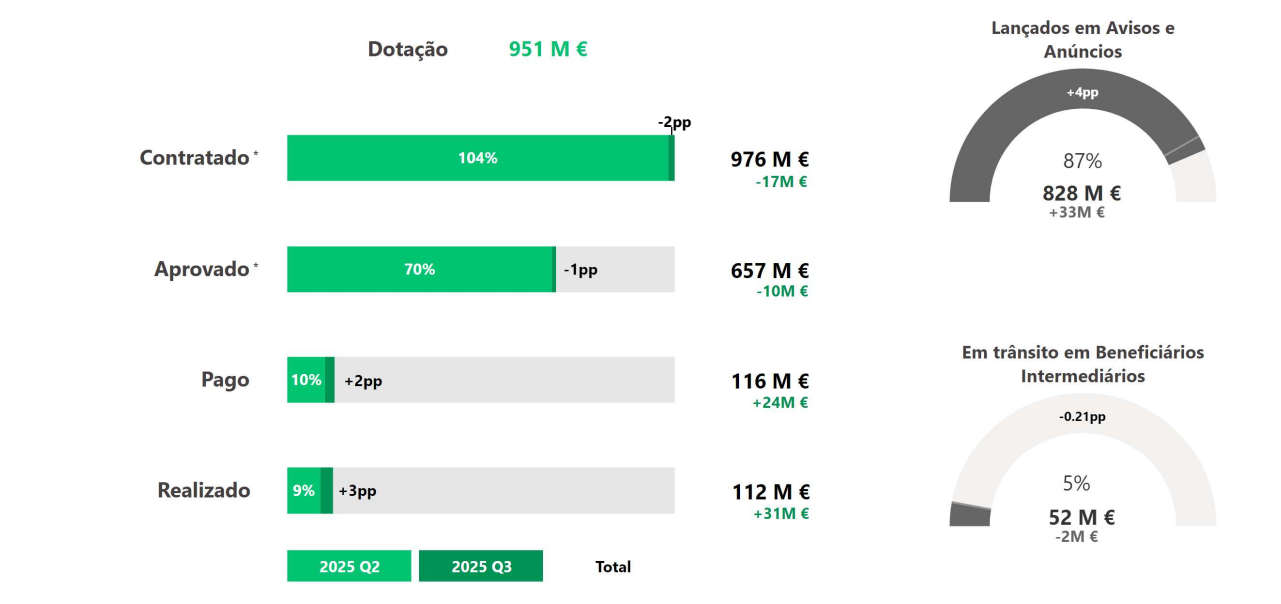

Reformas		
CÓDIGO	REFORMA	ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO A 30.09.2025
C21-r43	Observatório Nacional da Pobreza Energética	Em fase de implementação
C21-r44	Criação de balcões únicos para os cidadãos em matéria de eficiência energética (Espaços Cidadão Energia)	Em fase de implementação
C21-r45	Competências verdes	Em fase de implementação
C21-r46	Quadro regulamentar para o hidrogénio renovável	Concretizada
C21-r47	Primeiro leilão para a compra de biometano sustentável e plano de ação para o biometano	Concretizada
C21-r48	Simplificação do quadro jurídico e regulamentar aplicável aos projetos de energias renováveis	Em fase avançada de implementação

* Ajuste da dotação no âmbito da reprogramação aprovada pela Comissão Europeia

5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C21 REPower EU

951 M €
Dotação orçamental

Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 30.09.2025	PAGO A 30.09.2025	REALIZADO A 30.09.2025
C21-i01	Medida reforçada: Descarbonização da Indústria Responsável: IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P.	100 M	0%	0%	0%
C21-i02	Medida reforçada: Eficiência energética em edifícios residenciais Responsável: FUNDO AMBIENTAL	120 M	47%	46%	71%
C21-i03	Medida reforçada: Eficiência energética em edifícios de serviços Responsável: FUNDO AMBIENTAL	80 M	1%		0%
C21-i04-RAM	Eficiência energética em edifícios públicos da Madeira Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM	14 M	100%	0%	1%
C21-i05	Apoio ao Desenvolvimento da Indústria Verde Responsável: IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P.	50 M	35%	8%	0%
C21-i06	Medida reforçada: Hidrogénio e Gases Renováveis Responsável: FUNDO AMBIENTAL	70 M	100%	0%	0%
C21-i07.01	Estudos técnicos para potencial energético offshore Responsável: INSTITUTO PORTUGUÊS DO MAR E DA ATMOSFERA, I.P.	42 M	100%	45%	26%
C21-i07.02	Estudos técnicos para potencial energético offshore Responsável: LNEG - LABORATÓRIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA I.P.	8 M	100%	59%	19%
C21-i08	Flexibilidade da Rede e Armazenamento Responsável: FUNDO AMBIENTAL	100 M	96%	4%	0%
C21-i09	One-Stop-Shop para o Licenciamento e Acompanhamento de Projetos de Energias Renováveis Responsável: EMER 2030 - ESTRUTURA DE MISSÃO PARA O LICENCIAMENTO DE PROJETOS DE ENERGIAS RENOVÁVEIS 2030	16 M	100%	8%	0%
C21-i10-RAA	Sistema de Incentivos à aquisição e instalação de sistemas de armazenamento de energias renováveis nos Açores Responsável: DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FUNDOS ESTRUTURAIS	6 M	100%	48%	50%
C21-i11.01-RAM	Sistema de Incentivos à produção e Armazenamento de Energia Proveniente de Fontes Renováveis Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM	6 M	100%	13%	26%
C21-i11.02-RAM	Reforço da produção de eletricidade renovável na Ilha do Porto Santo Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM	19 M	71%	9%	14%
C21-i12	Medida reforçada: Descarbonização dos Transportes Públicos Responsável: FUNDO AMBIENTAL	227 M	95%	2%	0%
C21-i13-RAM	Descarbonização dos Transportes Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM	8 M	141%	18%	15%
C21-i14	Sistema de BRT Braga Responsável: TUB - TRANSPORTES URBANOS DE BRAGA, E.M.	76 M	100%	17%	0%
C21-i16	Funicular da Nazaré Responsável: MUNICÍPIO DA NAZARE	10 M	100%	36%	26%


5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C16
Empresas 4.0

682 M €
Dotação orçamental

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 30.09.2025

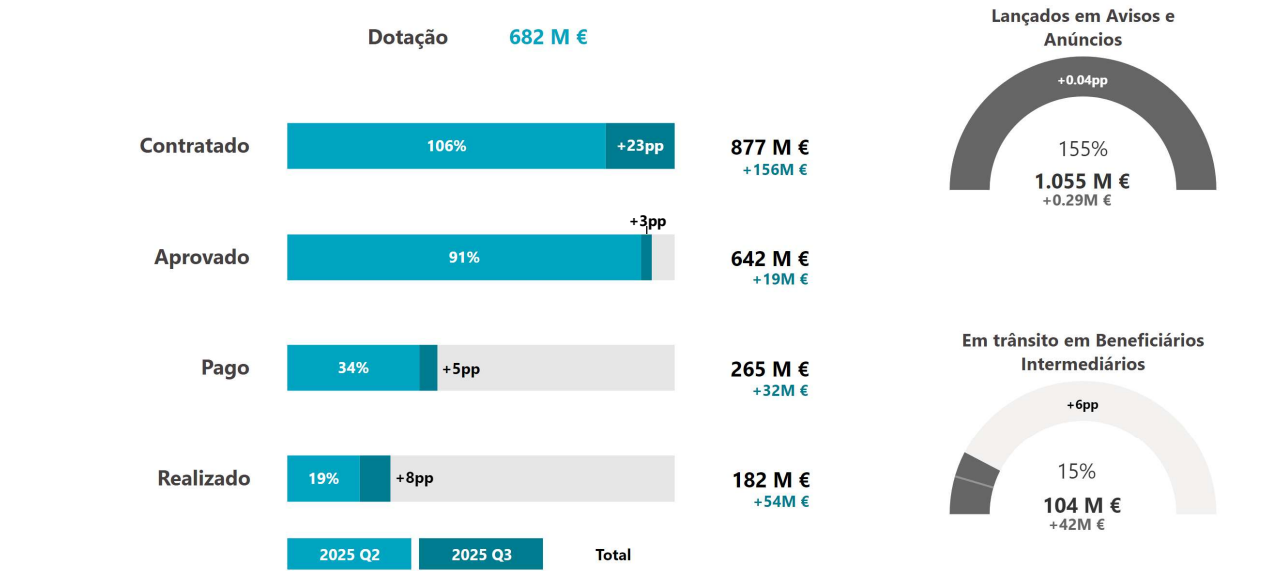

Reformas

CÓDIGO	REFORMA	ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO A 30.09.2025
C16-r31	Transição digital do ambiente empresarial	Concretizada

Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 30.09.2025	PAGO A 30.09.2025	REALIZADO A 30.09.2025
C16-i01.01	Capacitação Digital das Empresas Responsável: INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P.	94 M			
C16-i01.02	Capacitação Digital das Empresas Responsável: AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.	4 M			
C16-i02	Transição Digital das Empresas Responsável: IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P.	384 M	82%	36%	23%
C16-i02.02	Transição Digital das Empresas Responsável: AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.	23 M	0%	0%	0%
C16-i03.01	Catalisação da Transição Digital das Empresas Responsável: IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P.	56 M			0%
C16-i03.02	Catalisação da Transição Digital das Empresas Responsável: ANI - AGÊNCIA NACIONAL DE INOVAÇÃO, S.A.	5 M			0%
C16-i04	Indústria 4.0 Responsável: IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P.	90 M	63%	30%	31%
C16-i05-RAA	Capacitação e Transformação Digital das Empresas dos Açores Responsável: DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FUNDOS ESTRUTURAIS	22 M	170%	52%	4%
C16-i06-RAM	Empresas 4.0 Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM	6 M	152%	13%	0%

*Ajuste de investimentos decorrentes da reprogramação

5. Síntese da Implementação por Componente




COMPONENTE C17

Qualidade e Sustentab. das Finanças Públicas

406 M €

Dotação orçamental




Síntese da Implementação Financeira da Componente a 30.09.2025

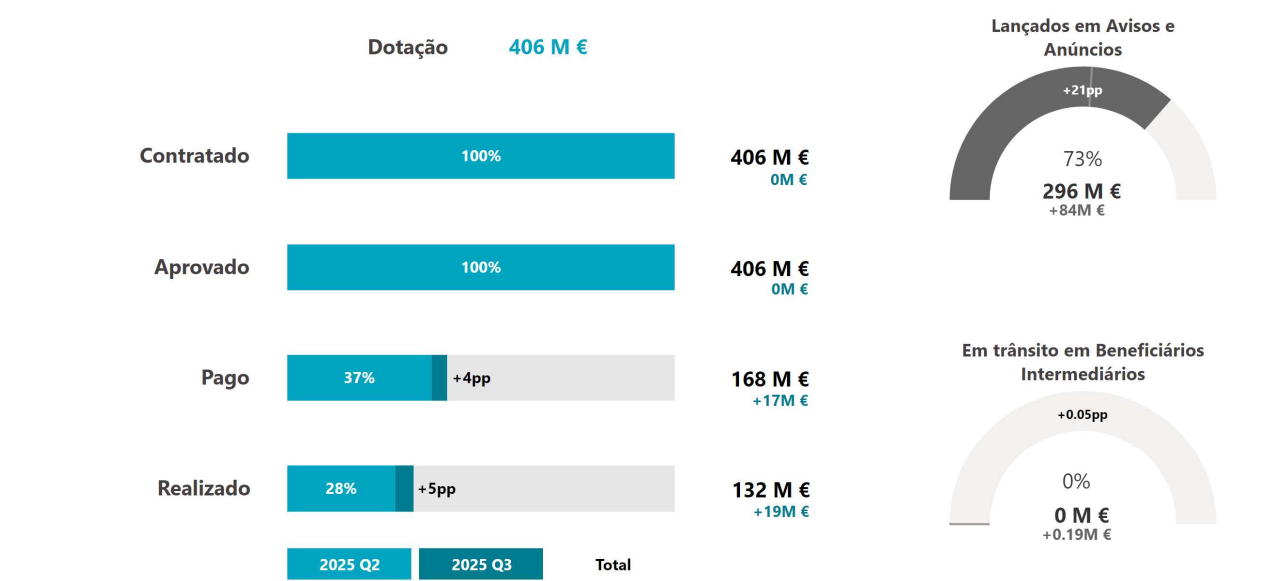

Reformas

CÓDIGO	REFORMA	ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO A 30.09.2025
C17-r32	Modernização e simplificação da gestão financeira pública	 Em fase avançada de implementação
C17-r40	Simplificação do sistema fiscal	 Em fase de implementação

Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 30.09.2025	PAGO A 30.09.2025	REALIZADO A 30.09.2025
C17-i01.01	Sistemas de informação de Gestão Financeira Pública Responsável: ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, I.P.	161 M €			
C17-i01.02	Sistemas de informação de Gestão Financeira Pública/ SIGPIP Responsável: ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, I.P.	2 M €			
C17-i02	Modernização da infraestrutura do sistema de informação patrimonial da Autoridade Tributária Responsável: AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	43 M €			
C17-i03.01	Transição digital da Segurança Social Responsável: INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	19 M €			
C17-i03.02	Transição digital da Segurança Social Responsável: INSTITUTO DE INFORMÁTICA, I.P.	182 M €			


5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C18
Justiça Económica e Ambiente de Negócios

281 M €
Dotação orçamental

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 30.09.2025

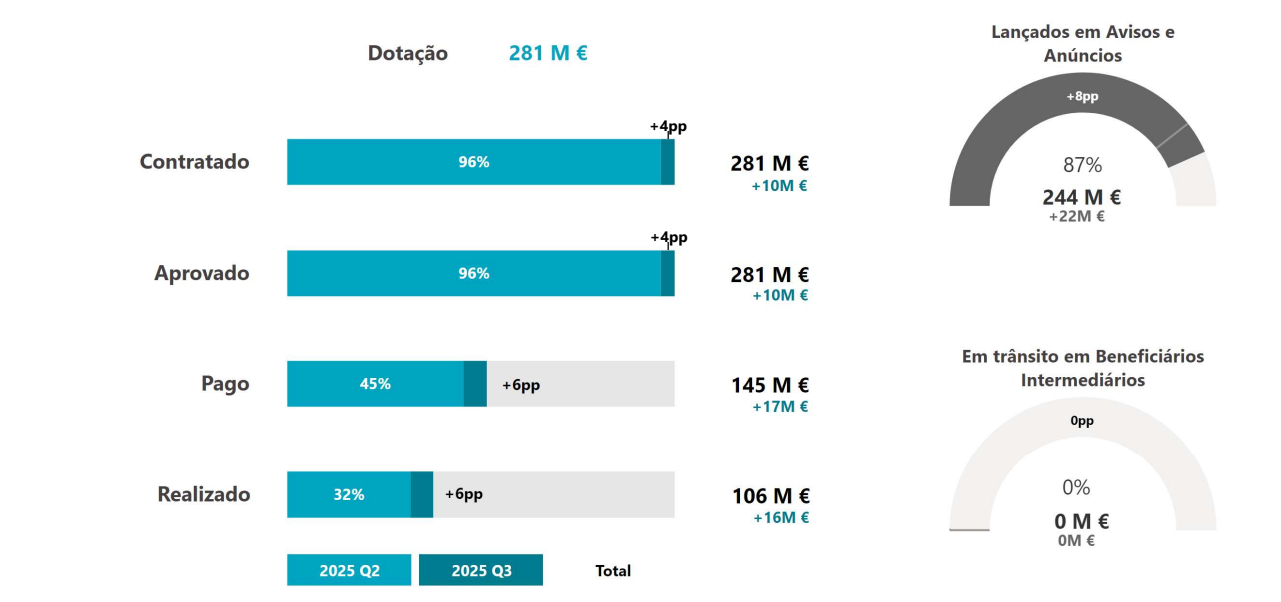

Reformas		
CÓDIGO	REFORMA	ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO A 30.09.2025
C18-r33	Justiça económica e ambiente empresarial	Em fase avançada de implementação

5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C18 Justiça Económica e Ambiente de Negócios

281 M €
Dotação orçamental

Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 30.09.2025	PAGO A 30.09.2025	REALIZADO A 30.09.2025
C18-i01.01	TD C18-i01.01: Justiça económica e ambiente de negócios/IGFEJ Responsável: INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA E EQUIPAMENTOS DA JUSTIÇA, I.P.	152 M	100%	44%	36%
C18-i01.02	Justiça Económica e Ambiente de Negócios/IRN Responsável: INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO, I.P.	43 M	100%	49%	42%
C18-i01.03	TD C18-i01.03: Justiça económica e ambiente de negócios/DGPJ Responsável: DIRECÇÃO-GERAL DA POLÍTICA DE JUSTIÇA	15 M	100%	47%	35%
C18-i01.04	Justiça Económica e Ambiente de Negócios/DGAJ Responsável: DIRECÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA	12 M	100%	97%	50%
C18-i01.05	Justiça Económica e Ambiente de Negócios/PJ Responsável: POLICIA JUDICIARIA	32 M	100%	59%	31%
C18-i01.06	TD C18-i01.06: Justiça económica e ambiente de negócios/SGMJ Responsável: SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA JUSTIÇA	6 M	100%	57%	4%
C18-i01.07	TD C18-i01.07: Justiça económica e ambiente de negócios/INMLCF Responsável: INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL E CIÊNCIAS FORENSES, I.P.	13 M	100%	79%	47%
C18-i01.08	TD C18-i01.08: Justiça económica e ambiente de negócios/INPI Responsável: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	2 M	100%	68%	12%
C18-i01.09	TD C18-i01.09: Justiça económica e ambiente de negócios/CAAJ Responsável: COMISSÃO PARA O ACOMPANHAMENTO DOS AUXILIARES DA JUSTIÇA	2 M	100%	66%	47%
C18-i01.10	TD C18-i01.10: Justiça económica e ambiente de negócios/PGR Responsável: PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA	3 M	100%	71%	23%
C18-i01.11	Justiça Económica e Ambiente de Negócios/CSM Responsável: CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA	2 M	100%	60%	23%
C18-i01.12	Justiça Económica e Ambiente de Negócios/STA Responsável: CONSELHO SUPERIOR DOS TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS E FISCAIS	950 K	100%	55%	23%
C18-i01.13	Justiça Económica e Ambiente de Negócios / MENAC Responsável: MECANISMO NACIONAL ANTICORRUPÇÃO (MENAC)	496 K	100%	26%	0%


5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C19 Administração Pública mais Eficiente

700 M €
Dotação orçamental

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 30.09.2025

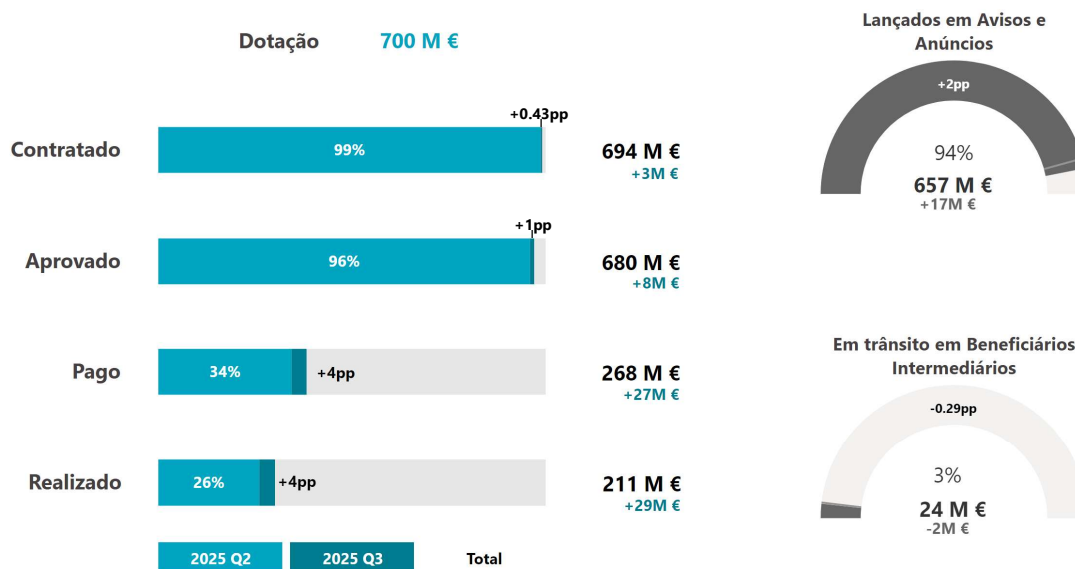

Reformas

CÓDIGO	REFORMA	ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO A 30.09.2025
C19-r34	Serviços públicos digitais, simples, inclusivos e seguros para os cidadãos e para as empresas	Concretizada
C19-r35	Reforma funcional e orgânica da administração pública	Concretizada
C19-r36	Administração pública capacitada para a criação de valor público	Concretizada
C19-r41	Acesso aos serviços públicos: harmonizar e consolidar o acesso presencial e em linha	Concretizada
C19-r42	Novo sistema de avaliação para capacitar e rejuvenescer o pessoal da administração pública	Em fase avançada de implementação

5. Síntese da Implementação por Componente

COMPONENTE C19

Administração Pública mais Eficiente

700 M €

Dotação orçamental

Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 30.09.2025	PAGO A 30.09.2025	REALIZADO A 30.09.2025
C19-i01.01	Reformulação do atendimento dos serviços público e consulares Responsável: AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.	160 M	96%	43%	35%
C19-i01.02	Reformulação do atendimento dos serviços público e consulares - SGMNE Responsável: SECRETARIA GERAL DO MINISTERIO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS	51 M	100%	75%	64%
C19-i02.01	Serviços Eletrónicos sustentáveis, baseados na interoperabilidade e utilização dos dados para um aumento de transparência e eficiência Responsável: AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.	73 M	92%	43%	38%
C19-i02.02	Serviços Eletrónicos sustentáveis/INE Responsável: INSTITUTO NACIONAL DE ESTATISTICA	5 M	100%	60%	32%
C19-i03	Reforço do quadro geral de cibersegurança Responsável: GABINETE NACIONAL DE SEGURANÇA (GNS)	51 M	102%	21%	11%
C19-i04.01	Transição Digital na Rede Informática do Governo (RING)/CEGER Responsável: CENTRO DE GESTÃO DA REDE INFORMÁTICA DO GOVERNO - CEGER	23 M	57%	38%	26%
C19-i04.02	Infraestruturas críticas digitais eficientes, seguras e partilhadas/SGMAI Responsável: SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	69 M	100%	56%	46%
C19-i04.03	Infraestruturas críticas digitais eficientes, seguras e partilhadas Responsável: AGÊNCIA PARA A INTEGRAÇÃO, MIGRAÇÕES E ASILO, I.P.	4 M	100%	38%	29%
C19-i04.04	Infraestruturas críticas digitais eficientes, seguras e partilhadas Responsável: SECRETARIA GERAL DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS	4 M	100%	99%	86%
C19-i04.05	Sistema de alerta para eventos extremos Responsável: INSTITUTO PORTUGUÊS DO MAR E DA ATMOSFERA, I.P.	5 M	100%	13%	0%
C19-i05.01-RAM	Transição Digital da Administração Pública da RAM - DRI Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM	77 M	100%	14%	7%
C19-i05.02-RAM	Transição Digital da Administração Pública da RAM-DRAPMA Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM	4 M	200%	61%	1%
C19-i06-RAA	Transição Digital da Administração Pública dos Açores Responsável: DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FUNDOS ESTRUTURAIS	31 M	100%	54%	41%
C19-i07.01	Capacitação da Administração Pública - INA Responsável: INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, I.P. (INA, I.P.)	30 M	95%	28%	15%
C19-i07.02	C19 – i07.02 – Capacitação da Administração Pública – Entidade responsável pela implementação da reforma TD-r35 Responsável: SECRETARIA GERAL DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS	36 K	6389%	831%	78%
C19-i07.03	Capacitação da Administração Pública - Formação Lojas do Cidadão/ Espaços Cidadão Responsável: AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.	1 M	100%	51%	43%
C19-i07.04	Capacitação da Administração Pública - PlanAPP Responsável: CENTRO DE COMPETÊNCIAS DE PLANEAMENTO, DE POLÍTICAS E DE PROSPETIVA DA ADMINISTRAÇÃO (PLANAPP)	12 M	100%	37%	31%
C19-i07.05	TD C19-i07.05 - Capacitação da Administração Pública - Programa de Estágios e Promoção do Teletrabalho Responsável: DIRECÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E DO EMPREGO PÚBLICO	31 M	98%	58%	56%
C19-i08	Territórios Inteligentes - AMA Responsável: AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.	72 M	95%	4%	0%


5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C20 Escola Digital

605 M €
Dotação orçamental

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 30.09.2025

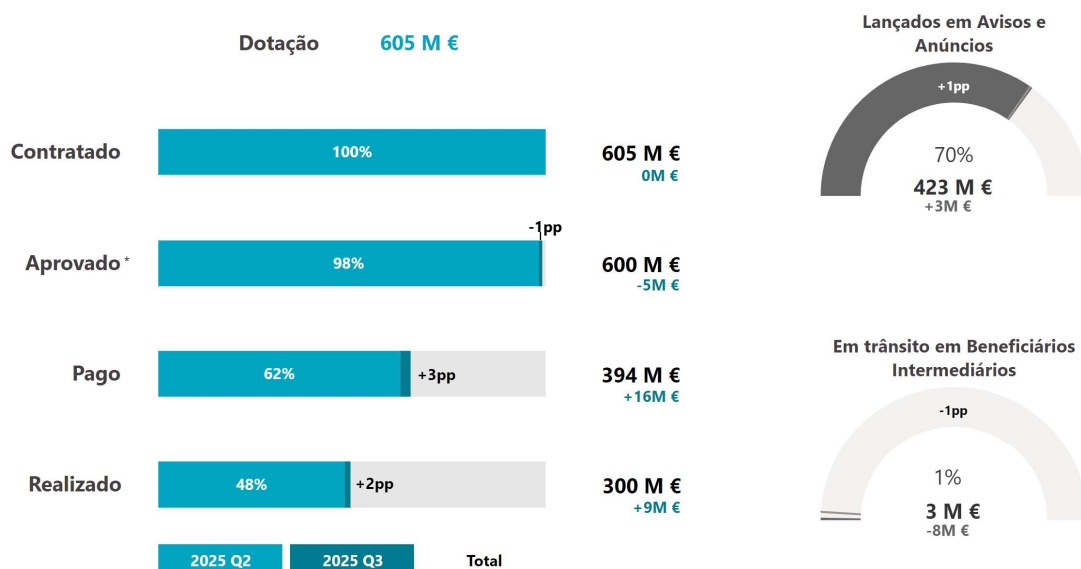

Reformas

CÓDIGO	REFORMA	ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO A 30.09.2025
C20-r37	Reforma para a educação digital	Em fase de implementação

Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 30.09.2025	PAGO A 30.09.2025	REALIZADO A 30.09.2025
C20-i01.01	Transição digital na Educação Responsável: DIRECÇÃO-GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	6 M €	100%	178%	88%
C20-i01.02	Transição digital na Educação Responsável: SECRETARIA-GERAL DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA	228 M €	100%	100%	98%
C20-i01.03	Transição digital na Educação Responsável: DIRECÇÃO-GERAL DA EDUCAÇÃO	82 M €	100%	40%	4%
C20-i01.04	Transição digital na Educação Responsável: INSTITUTO DE AVALIAÇÃO EDUCATIVA, I.P.	12 M €	100%	45%	22%
C20-i01.05	Transição digital na Educação Responsável: INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO, I.P.	217 M €	98%	37%	17%
C20-i02-RAA	Educação digital (Açores) Responsável: DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FUNDOS ESTRUTURAIS	38 M €	100%	72%	55%
C20-i03-RAM	Programa de aceleração da digitalização da Educação na RAM Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM	22 M €	100%	43%	33%

* Ajuste da dotação no âmbito da reprogramação aprovada pela Comissão Europeia

Anexos

ANEXOS

ANEXO I

Listagem de Projetos Aprovados a Beneficiários Diretos

ANEXO I - Listagem de Projetos Aprovados a Beneficiários Diretos

A listagem dos projetos aprovados a 30 de setembro de 2025 consta de documento autónomo.

ANEXOS

ANEXO II

Listagem de Projetos Aprovados a Beneficiários Finais

ANEXO II - Listagem de Projetos Aprovados a Beneficiários Finais

A listagem dos projetos aprovados a 30 de setembro de 2025 consta de documento autónomo.

