

RELATÓRIO TRIMESTRAL

DEZEMBRO 2024



PRR
Plano de Recuperação
e Resiliência



Financiado pela
União Europeia
NextGenerationEU

RECUPERAR
PORTUGAL

Ficha Técnica

Título: Relatório Trimestral dezembro 2024

Edição: 1ª edição, 2024

Propriedade: Estrutura de Missão Recuperar Portugal

RECUPERAR
PORTUGAL

CONTEÚDOS

- 1 O PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA
- 2 PROGRESSO GERAL A 31 DE DEZEMBRO DE 2024
- 3 SÍNTESE DA IMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA
- 4 SÍNTESE DA IMPLEMENTAÇÃO POR DIMENSÃO ESTRUTURANTE
- 5 SÍNTESE DA IMPLEMENTAÇÃO POR COMPONENTE

ANEXOS

ANEXO I. LISTAGEM DE PROJETOS APROVADOS A BENEFICIÁRIOS DIRETOS

ANEXO II. LISTAGEM DE PROJETOS APROVADOS A BENEFICIÁRIOS FINAIS


1

O Plano de Recuperação e Resiliência

1. O Plano de Recuperação e Resiliência



Visão Global

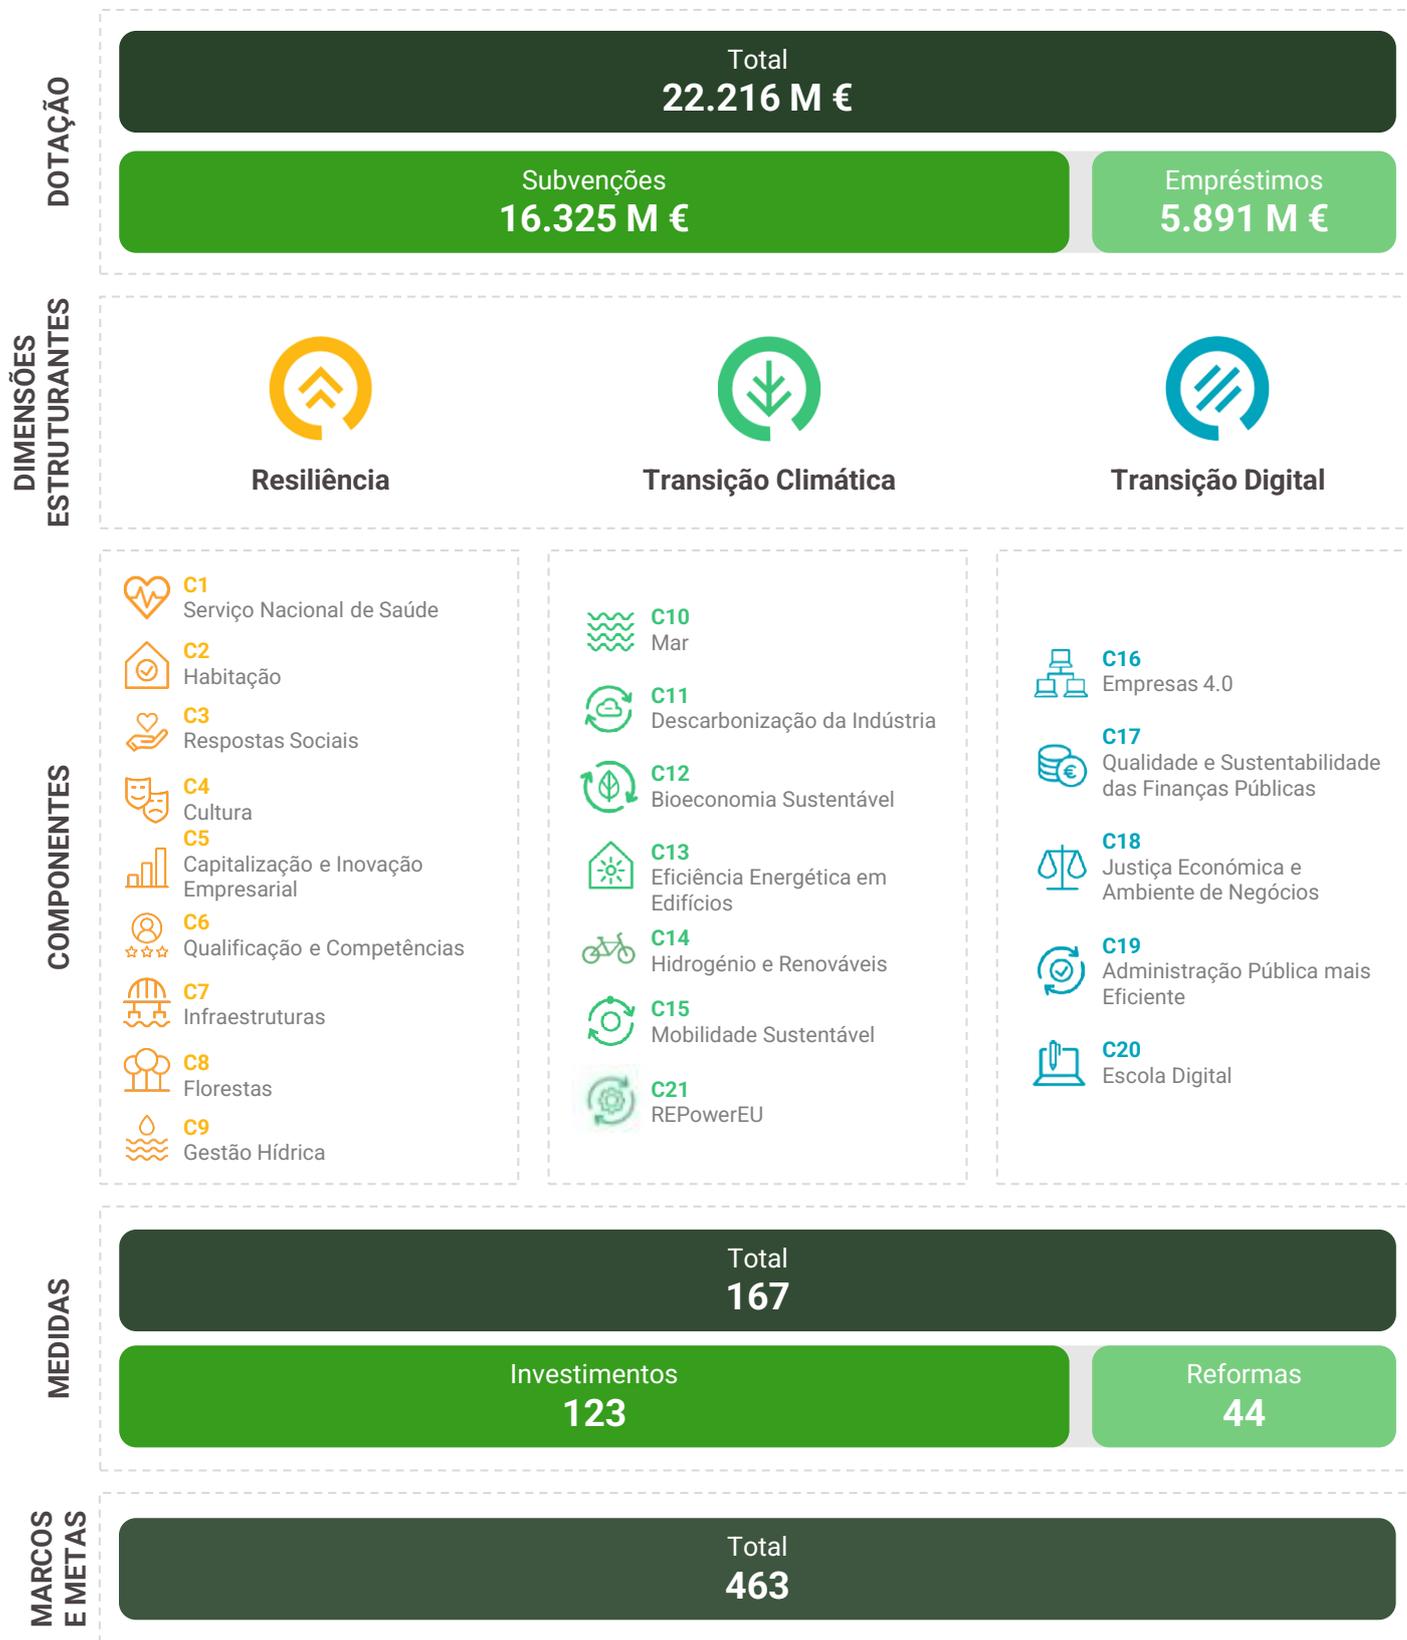

1. O Plano de Recuperação e Resiliência



Reprogramação



INICIAL		ATUALIZAÇÃO	
RESILIÊNCIA			
1.383 M €	C1. Serviço Nacional de Saúde	1.739 M €	
2.733 M €	C2. Habitação	3.229 M €	
833 M €	C3. Respostas Sociais	1.043 M €	
243 M €	C4. Cultura	319 M €	
2.914 M €	C5. Capitalização e Inovação Empresarial	4.915 M €	
1.324 M €	C6. Qualificações e Competências	1.979 M €	
690 M €	C7. Infraestruturas	813 M €	
615 M €	C8. Florestas	615 M €	
390 M €	C9. Gestão Hídrica	461 M €	
11.125 M €		15.113 M €	
TRANSIÇÃO CLIMÁTICA			
252 M €	C10. Mar	393 M €	
715 M €	C11. Descarbonização da Indústria	737 M €	
145 M €	C12. Bioeconomia Sustentável	145 M €	
610 M €	C13. Eficiência Energética em Edifícios	610 M €	
370 M €	C14. Hidrogénio e Renováveis	385 M €	
967 M €	C15. Mobilidade Sustentável	1.262 M €	
n.a. ¹	C21. REPowerEU	855 M €	
3.059 M €		4.388 M €	
TRANSIÇÃO DIGITAL			
650 M €	C16. Empresas 4.0	763 M €	
406 M €	C17. Qualidade e Sustent. Finanças Públicas	406 M €	
267 M €	C18. Justiça Económica e Ambiente de Negócios	267 M €	
578 M €	C19. Administração Pública Mais Eficiente	675 M €	
559 M €	C20. Escola Digital	605 M €	
2.460 M €		2.716 M €	
16.644 M €		22.216 M €	

¹ Esta componente não estava prevista no PRR inicial.

Estes valores poderão ser sujeitos a pequenos ajustes no âmbito da contratação entre a Estrutura de Missão "Recuperar Portugal" e os Beneficiários Diretos e Intermediários.

2

Progresso geral a 31 de dezembro de 2024

2. Progresso geral a 31 de dezembro de 2024



Dados a 31 de dezembro de 2024

3

Síntese da implementação financeira

3. Síntese da implementação financeira

Em 2023, foi submetida e aprovada a reprogramação do PRR, passando este a ter uma dotação de 22.216 milhões de euros.


Durante o 4º trimestre de 2024, foram lançados 1.434 milhões de euros em Avisos e Anúncios. Durante o trimestre foram também aprovados 630 milhões de euros e pagos 909 milhões de euros a Beneficiários Diretos e Finais.

Desta forma, até 31 de dezembro de 2024, tinham sido lançados Avisos de Abertura de Candidaturas no total de 17.255 milhões de euros (78% da dotação do PRR) e Procedimentos de Contratação Pública no total de 3.954 milhões de euros (18% da dotação do PRR). O montante lançado em Avisos e Anúncios ascendia no final do trimestre a 21.208 milhões de euros, correspondendo a 95% da dotação do PRR e representando um aumento de 6 pontos percentuais face ao final do 3º trimestre (esta variação é calculada tendo por base a dotação do PRR).

Já o montante de projetos aprovados a Beneficiários Diretos e Finais que totalizava, no final do 4º trimestre de 2024, 20.388 milhões de euros (92% da dotação do PRR), representa um aumento de 3 pontos percentuais face ao 3º trimestre de 2024 (novamente, trata-se da variação calculada com base na dotação).

Os montantes pagos a Beneficiários Diretos e Finais ascendiam a 6.273 milhões de euros, o correspondente a 28% da dotação do PRR, e representando um aumento de 4 pontos percentuais face ao 3º trimestre de 2024.

Figura 1: Evolução da Implementação Financeira até ao 4º trimestre de 2024

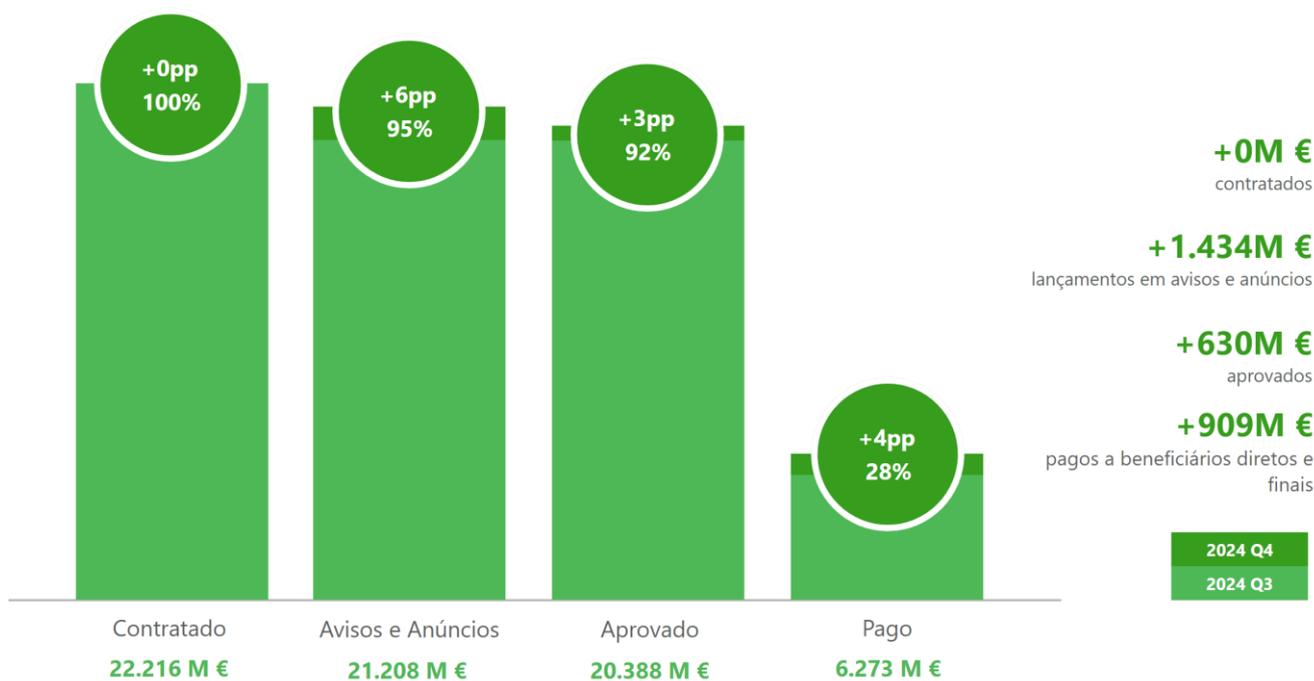

Os valores percentuais bem como as respetivas variações em pontos percentuais foram calculados tendo por base a dotação do PRR de 22.216 M € e estão arredondados à unidade.

3. Síntese da implementação financeira


A 31 de dezembro de 2024, as três dimensões estruturantes do PRR - Resiliência, Transição Climática e Transição Digital - encontravam-se com os níveis de implementação financeira representados na figura 2.

Na dimensão Resiliência tinham sido lançados 14.049 milhões de euros em Avisos e Anúncios (93% da dotação da dimensão estruturante). O montante aprovado ascendia a 14.391 milhões de euros (95% da dotação da dimensão estruturante) e o montante pago a Beneficiários Diretos e Finais ascendia a 4.377 milhões de euros (29% da dotação da dimensão estruturante).

Na dimensão Transição Climática, o montante lançado em Avisos e Anúncios atingiu os 4.804 milhões de euros no final do trimestre (109% da dotação da dimensão estruturante). O montante aprovado a Beneficiários Diretos e Finais ascendia a 3.479 milhões de euros (79% da dotação da dimensão estruturante), e o montante pago aos mesmos atingiu os 967 milhões de euros (22% da dotação da dimensão estruturante).

Na dimensão Transição Digital, foram lançados até ao final do semestre 2.355 milhões de euros (87% da dotação da dimensão estruturante), tendo sido aprovados 2.519 milhões de euros (93% da dotação da dimensão estruturante) e pagos a Beneficiários Diretos e Finais 929 milhões de euros (34% da dotação da dimensão estruturante).


Figura 2: Implementação Financeira por Dimensão Estruturante a 31.12.2024 (milhões de euros)

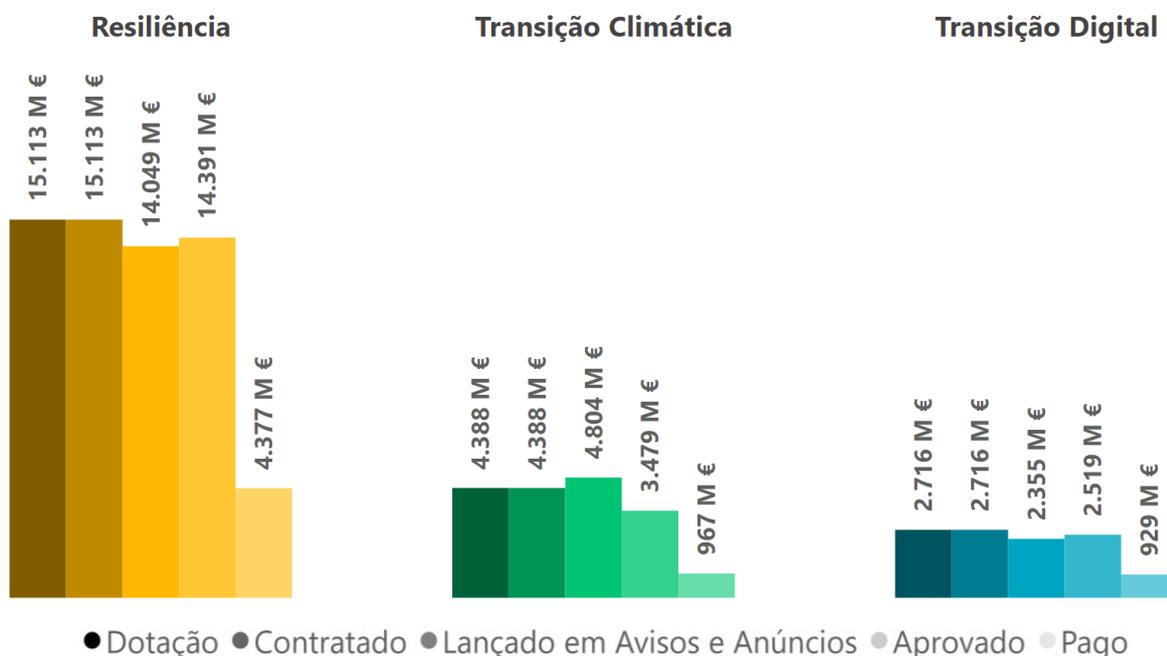

3. Síntese da implementação financeira

A figura 3 mostra os montantes contratados entre a EMRP e os Beneficiários Diretos e Intermédios, e os montantes aprovados e pagos a Beneficiários Diretos e Finais, em cada uma das 21 componentes do PRR, a 31 de dezembro de 2024.

Figura 3: Implementação Financeira por Componente a 31.12.2024 (milhões de euros)

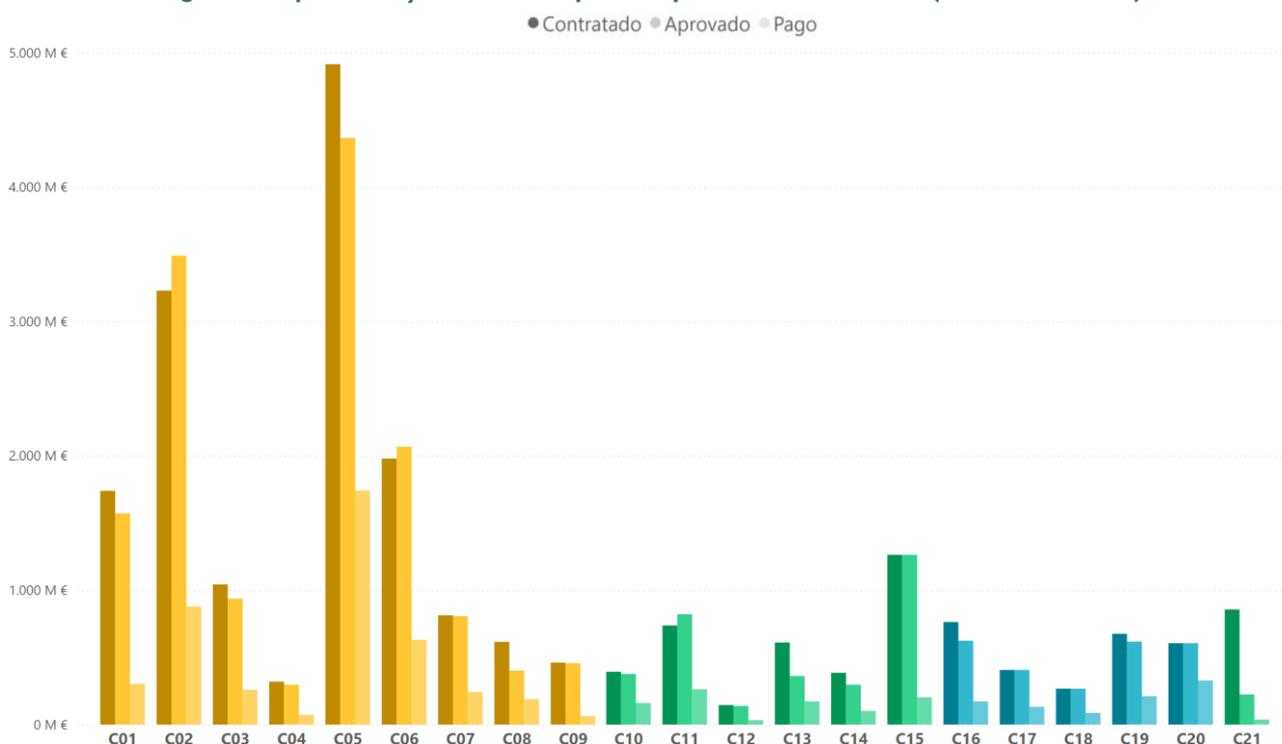

A tabela 1 apresenta a divisão previsional por tipo de Beneficiário Direto e Final da dotação lançada em avisos e procedimentos de contratação pública. Apresenta também os respetivos montantes aprovados e pagos por tipo de Beneficiário Direto ou Final.

Tabela 1: Implementação Financeira por tipologia de Beneficiário a 31.12.2024

TIPO DE BENEFICIÁRIO	Concursos Públicos		Avisos		Beneficiários Diretos e Finais	
	LANÇADOS (€) ¹	DOTAÇÃO (€) ²	CANDIDATURAS SUBMETIDAS	CANDIDATURAS APROVADAS	APROVADO (M€)	PAGO (M€)
Famílias		1.762 M €	269.760	152.483	241 M €	198 M €
Instituições da Economia Solidária e Social		1.229 M €	8.310	5.142	559 M €	181 M €
Empresas		5.674 M €	57.720	41.133	5.819 M €	2.216 M €
Instituições do Sistema Científico e Tecnológico		741 M €	1.023	279	405 M €	141 M €
Instituições de Ensino Superior		953 M €	2.532	350	804 M €	252 M €
Escolas	343 M €	590 M €	1.775	1.181	1.026 M €	448 M €
Autarquias e Áreas Metropolitanas	83 M €	1.927 M €	6.592	4.001	3.808 M €	754 M €
Entidades Públicas	1.425 M €	2.856 M €	2.101	1.635	4.835 M €	1.431 M €
Empresas Públicas	2.102 M €	1.522 M €	310	257	2.891 M €	650 M €
Total	3.954 M €	17.255 M €	350.123	206.461	20.388 M €	6.273 M €

¹ Procedimentos de Contratação Pública lançados por Beneficiários Diretos.

² Dotação sujeita a alterações no âmbito da contratação em curso entre a Recuperar Portugal e os Beneficiários Intermédios e Diretos.

3. Síntese da implementação financeira

A distribuição dos valores aprovados e pagos a Beneficiários Diretos e a Beneficiários Finais, em cada uma das regiões NUTS III de Portugal e nos projetos de cobertura nacional, é apresentada na tabela 2, bem como a sua distribuição relativa por habitante. A 31 de dezembro de 2024, tinha sido aprovado um montante equivalente a 1.971 euros por habitante no território nacional, e pago um montante equivalente a 607 euros por habitante.

Tabela 2: Implementação Financeira por região NUTS III e per capita, a 31.12.2024

NUT III	Beneficiários Diretos e Finais		Por habitante	
	APROVADO (M€)	PAGO (€)	APROVADO (€/HABITANTE)	PAGO (€/HABITANTE)
Projetos Nacionais	3.621 M €	1.384 M €	350 €	134 €
Alto Minho	249 M €	79 M €	1.076 €	341 €
Cávado	606 M €	184 M €	1.454 €	441 €
Ave	526 M €	188 M €	1.258 €	449 €
Área Metropolitana do Porto	2.888 M €	893 M €	1.663 €	514 €
Alto Tâmega	76 M €	21 M €	900 €	247 €
Tâmega e Sousa	421 M €	138 M €	1.029 €	338 €
Douro	287 M €	70 M €	1.561 €	380 €
Terras de Trás-os-Montes	158 M €	47 M €	1.473 €	436 €
Região de Aveiro	765 M €	244 M €	2.082 €	664 €
Região de Coimbra	719 M €	198 M €	1.646 €	453 €
Região de Leiria	409 M €	149 M €	1.427 €	518 €
Viseu Dão Lafões	335 M €	111 M €	1.326 €	438 €
Beira Baixa	108 M €	30 M €	1.332 €	368 €
Beiras e Serra da Estrela	244 M €	75 M €	1.158 €	355 €
Oeste	250 M €	84 M €	689 €	230 €
Médio Tejo	250 M €	87 M €	1.095 €	379 €
Lezíria do Tejo	217 M €	66 M €	920 €	278 €
Área Metropolitana de Lisboa	5.064 M €	1.380 M €	1.764 €	481 €
Alentejo Litoral	216 M €	59 M €	2.236 €	612 €
Baixo Alentejo	257 M €	70 M €	2.241 €	609 €
Alto Alentejo	307 M €	59 M €	2.928 €	562 €
Alentejo Central	185 M €	59 M €	1.217 €	385 €
Algarve	572 M €	131 M €	1.225 €	281 €
Região Autónoma dos Açores	877 M €	285 M €	3.709 €	1.204 €
Região Autónoma da Madeira	780 M €	186 M €	3.112 €	743 €
Total	20.388 M €	6.273 M €	1.971 €	607 €

3. Síntese da implementação financeira

FLUXOS DE TESOURARIA

A 3 de agosto de 2021, Portugal recebeu o adiantamento de 13% dos fundos do PRR, nos termos do disposto no artigo 13º do Regulamento (EU) 2021/241 do Parlamento Europeu e do Conselho e no seguimento da assinatura dos acordos de financiamento e de empréstimos. O pré-financiamento correspondeu a um valor total de 2.159 milhões de euros, sendo 1.808 milhões de euros relativos a subvenções e 351 milhões de euros relativos a empréstimos.

O desembolso dos fundos do PRR contratados com a Comissão Europeia depende do processo de avaliação do cumprimento de marcos e metas, estando prevista a submissão de 10 pedidos de pagamento até 2026, dos quais 4 foram já submetidos.

O primeiro Pedido de Pagamento foi submetido a 25 de janeiro de 2022, no total de 1.336 milhões de euros, dos quais 636 milhões de euros respeitantes a subvenções e 700 milhões de euros de empréstimos, que, deduzidos do correspondente valor do pré-financiamento de 13%, se traduziu no pagamento líquido, a 9 de maio de 2022, de 1.162 milhões de euros (553 milhões de euros de subvenções, e 609 milhões de euros de empréstimos).

O segundo Pedido de Pagamento foi formalizado a 31 de dezembro de 2022, no total de 2.092 milhões de euros, tendo recebido avaliação positiva da Comissão Europeia a 16 de dezembro. Após a dedução respetiva do adiantamento, este Pedido de Pagamento traduziu-se no recebimento líquido de 1.820 milhões de euros, dos quais 1.711 milhões de euros relativos a subvenções e 109 milhões de euros relativos a empréstimos. Com o desembolso do 2.º Pedido de Pagamento, que viria a ser realizado a 8 de fevereiro de 2023, Portugal já recebeu 5.141 milhões de euros, correspondente a cerca de 31% da dotação orçamental global do PRR inicialmente contratada com a Comissão Europeia.


Os terceiro e quarto Pedidos de Pagamento foram formalizados a 4 de outubro de 2023, no total de 3.562 milhões de euros, dos quais 2.947 milhões de euros respeitantes a subvenções e 615 milhões de euros de empréstimos, que, deduzidos do correspondente valor do pré-financiamento de 13%, e do valor suspenso, se traduziu no recebimento líquido, a 28 de dezembro de 2023, de 2.460 milhões de euros, dos quais 1.875 milhões de euros respeitantes a subvenções e 585 milhões de euros de empréstimos. O pedido de levantamento da suspensão recebeu uma avaliação preliminar positiva da Comissão a 24 de junho, resultando no desembolso do valor suspenso de 714 milhões, no início de agosto.

O quinto Pedido de Pagamento foi formalizado a 3 de julho de 2024, no total de 3.191 milhões de euros, dos quais 1.878 milhões de euros respeitantes a subvenções e 1.313 milhões de euros de empréstimos, que deduzidos do correspondente valor de pré-financiamento se traduz no valor líquido de 2.903 milhões de euros, 1.653 de euros em subvenções e 1.250 milhões de euros em empréstimos. A avaliação preliminar positiva foi aprovada pela Comissão, a 26 de novembro 2024, resultando no desembolso do valor suspenso de 2.903 M€, no final de dezembro.

O sexto Pedido de Pagamento foi formalizado a 14 de novembro de 2024, no total de 1.868 milhões de euros, dos quais 1.502 milhões de euros respeitantes a subvenções e 366 milhões de euros de empréstimos, que deduzidos do correspondente valor de pré-financiamento se traduz no valor líquido de 1.671 milhões de euros, 1.322 milhões de euros em subvenções e 349 milhões de euros em empréstimos.

3. Síntese da implementação financeira

Figura 4: Cronograma de Pedidos de Pagamento e Desembolsos

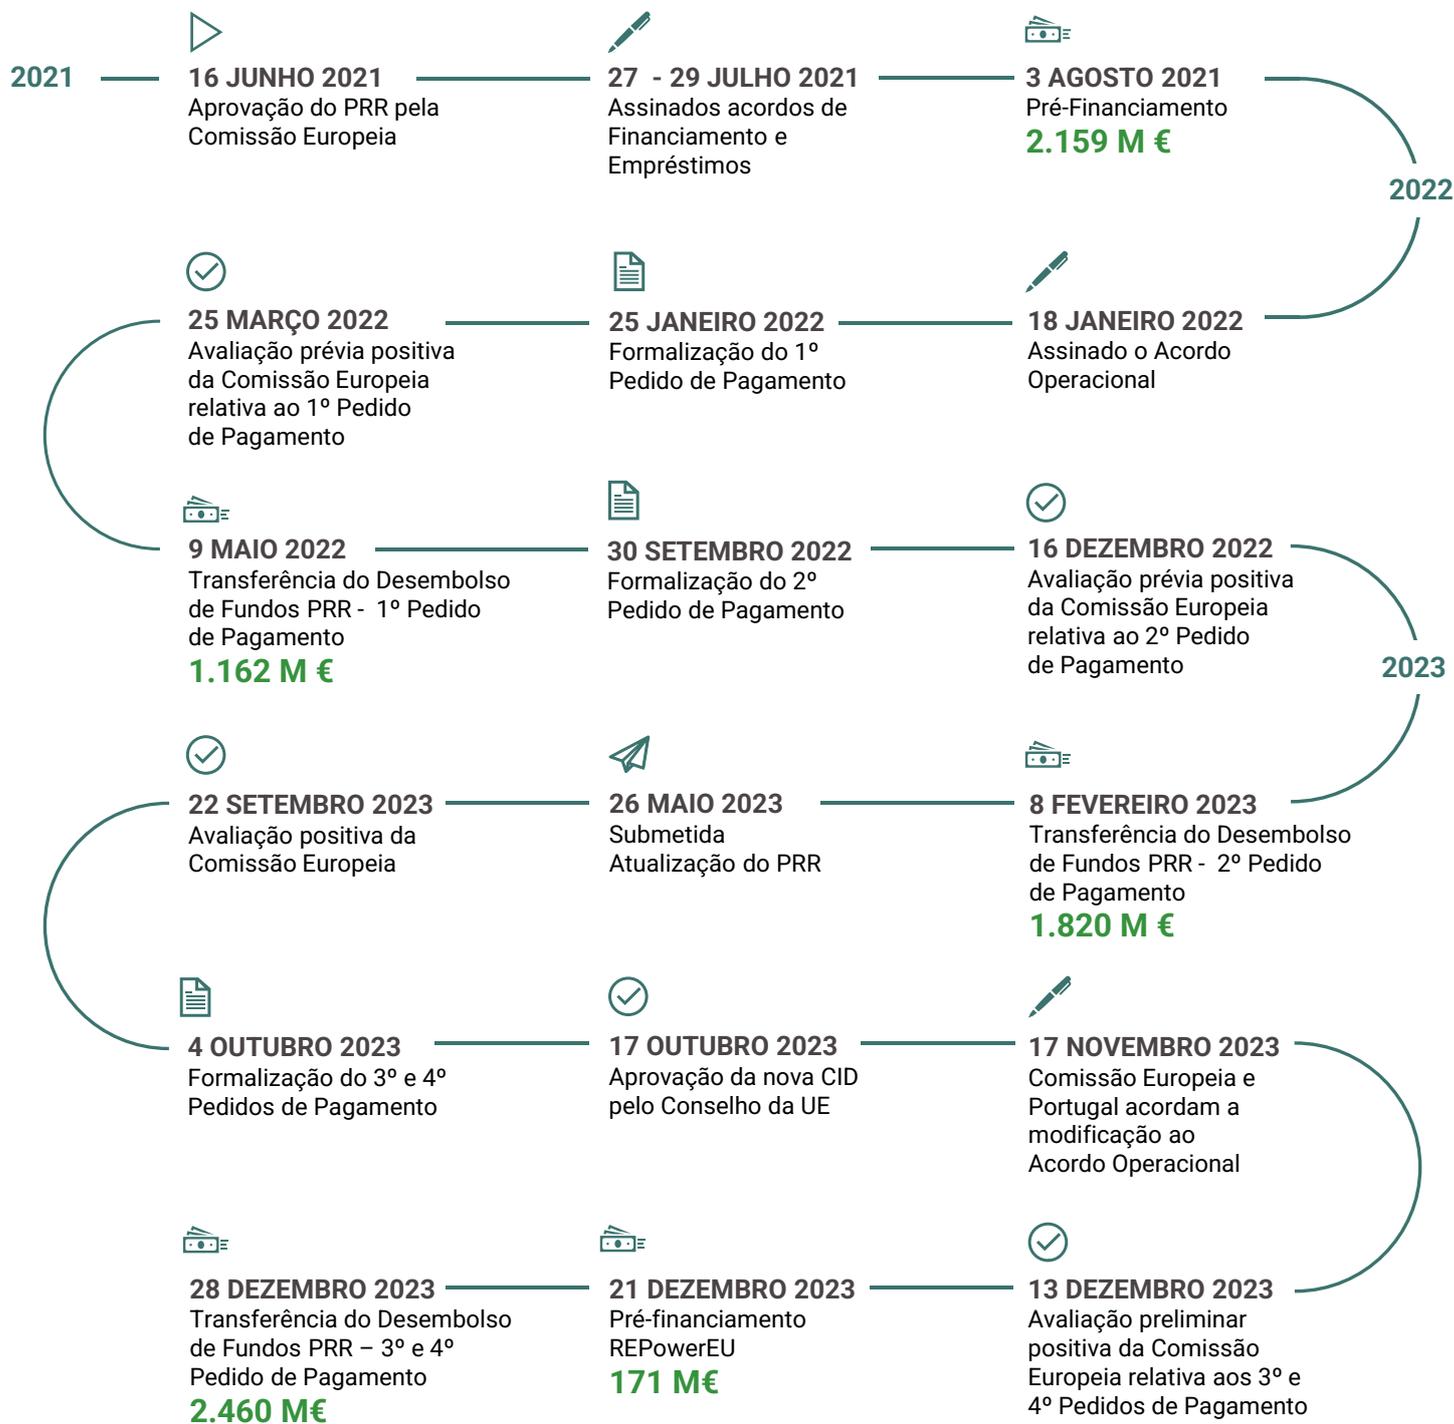

3. Síntese da implementação financeira

Figura 4: (Cont.) Cronograma de Pedidos de Pagamento e Desembolsos




3. Síntese da implementação financeira

A figura 5 representa a distribuição dos valores recebidos da Comissão Europeia pelos Beneficiários Diretos, Intermediários e Finais ao longo da execução do PRR até ao final do 4º trimestre de 2024. De acordo com o Decreto-Lei n.º 29-B/2021, de 4 de maio, a Recuperar Portugal emite ordens de pagamento e a AD&C processa os pagamentos a Beneficiários Diretos e Intermediários. Os Beneficiários Intermediários, por sua vez, fazem pagamentos aos Beneficiários Finais, após seleção e contratação com os mesmos.

A 31 de dezembro de 2024, tinham sido pagos 1.626 milhões de euros a Beneficiários Diretos. O montante total transferido a Beneficiários Intermediários ascendia a 6.498 milhões de euros, dos quais 4.648 milhões de euros foram já pagos a Beneficiários Finais e 1.851 milhões de euros encontram-se em trânsito.

Figura 5: Fluxos de Tesouraria do PRR a 31.12.2024

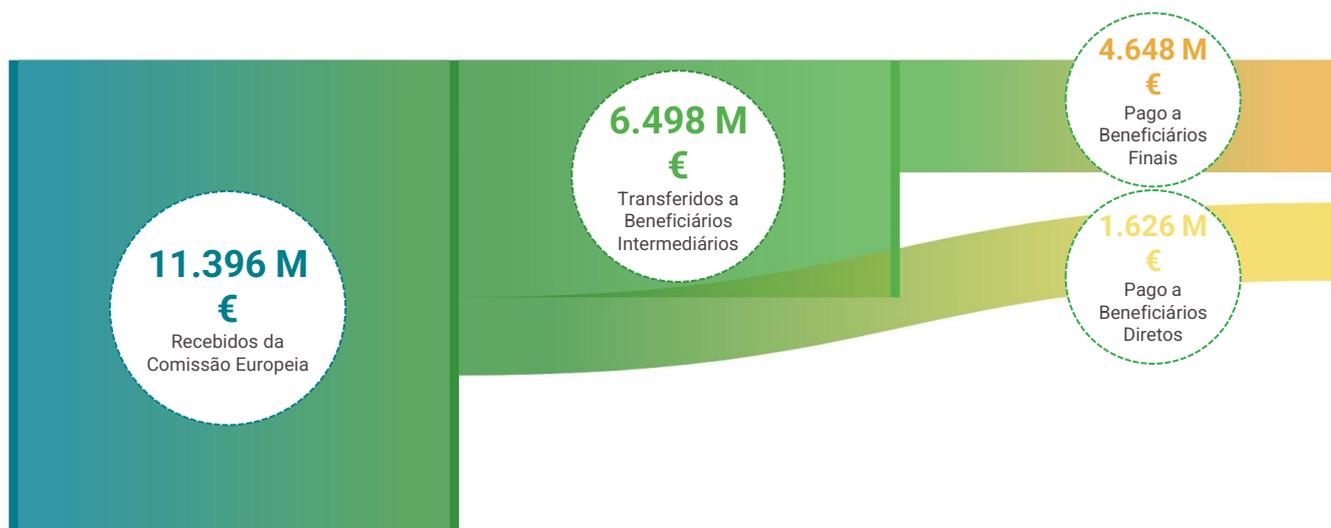

4

Síntese da Implementação por Dimensão Estruturante

4. Síntese da Implementação por Dimensão Estruturante



I - Resiliência




15.113 M €


Dotação orçamental

A dimensão da Resiliência visa reforçar a resiliência social, económica e territorial do país através de 9 componentes estratégicas, incluindo intervenções na saúde, habitação, respostas sociais, cultura, investimento empresarial, competências e qualificações, infraestruturas, florestas e gestão da água. Esta dimensão representa a maior parte do investimento total do PRR para a promoção de uma recuperação transformadora, duradoura, justa, sustentável e inclusiva.

Síntese da Implementação da Dimensão I – Resiliência a 31.12.2024

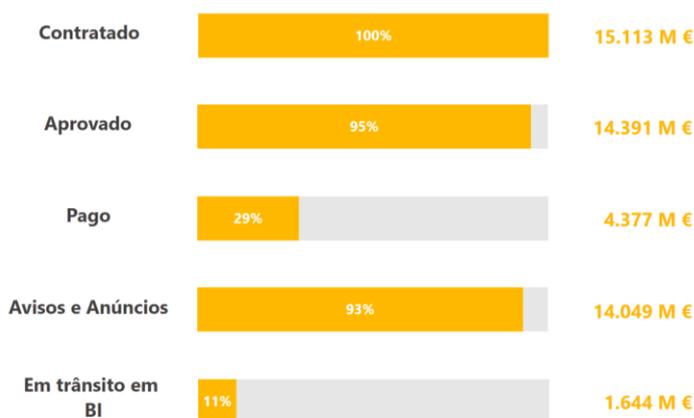

Evolução da Implementação Financeira até ao 4º trimestre de 2024

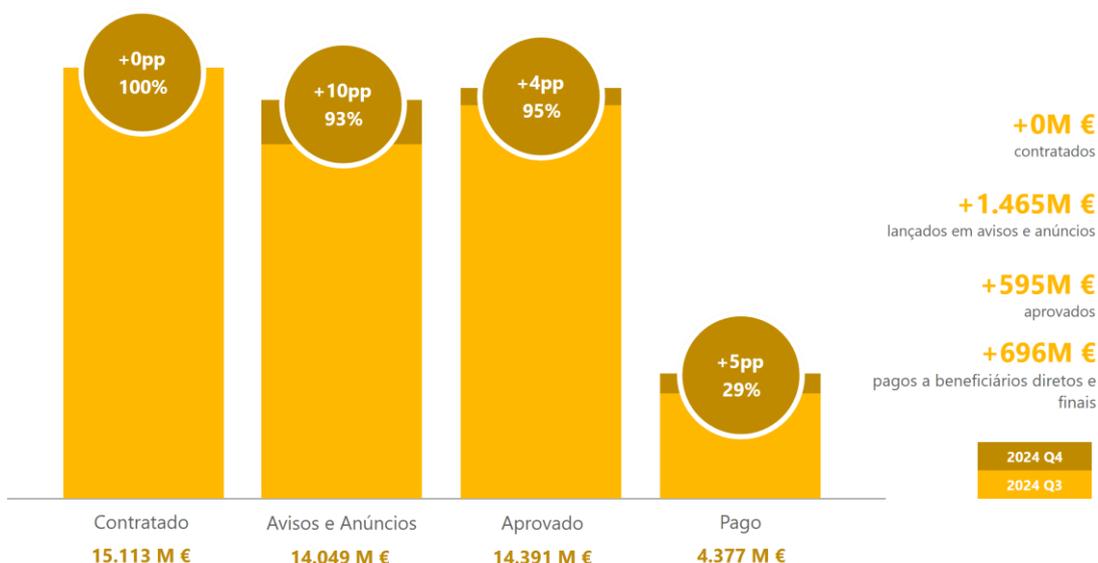

Os valores percentuais bem como as respetivas variações em pontos percentuais foram calculados tendo por base a dotação do PRR de 22.216 M €.

4. Síntese da Implementação por Dimensão Estruturante



II - Transição Climática




4.388 M €


Dotação orçamental

A Transição Climática compreende 7 componentes estratégicos, incluindo intervenções em áreas como o mar, mobilidade sustentável, descarbonização da indústria, bioeconomia, eficiência energética em edifícios, e energias renováveis. Constitui um compromisso para o cumprimento das metas climáticas que permitirá a Portugal atingir a neutralidade carbónica até 2050, apresentando ao país oportunidades significativas para os fatores competitivos do futuro.

Síntese da Implementação da Dimensão II – Transição Climática a 31.12.2024

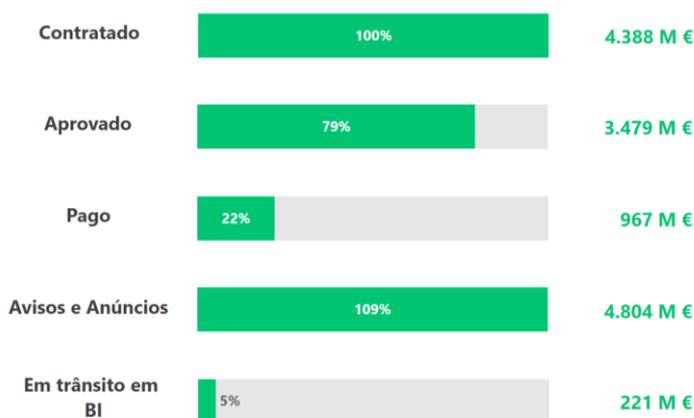

Evolução da Implementação Financeira até ao 4º trimestre de 2024

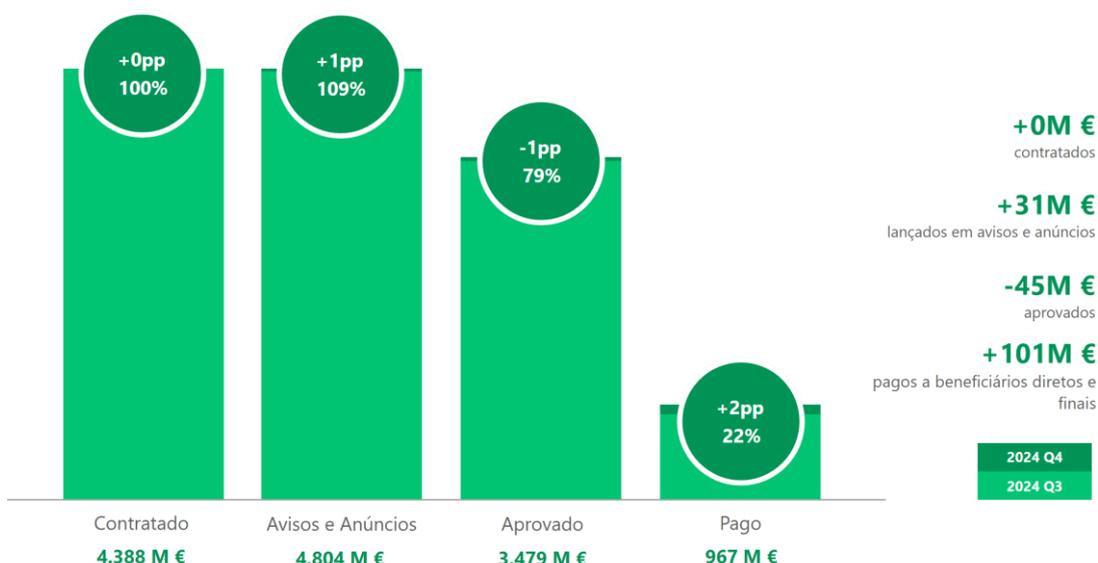

Os valores percentuais bem como as respetivas variações em pontos percentuais foram calculados tendo por base a dotação do PRR de 22.216 M €.

4. Síntese da Implementação por Dimensão Estruturante



III - Transição Digital








2.716 M €

Dotação orçamental

A Transição Digital descreve 5 componentes para acelerar a transição de Portugal para uma sociedade mais digital, incluindo a capacitação e inclusão digital das pessoas através da educação, formação em competências digitais e promoção da literacia digital, transformação digital do setor empresarial e digitalização do Estado.

Síntese da Implementação da Dimensão III – Transição Digital a 31.12.2024

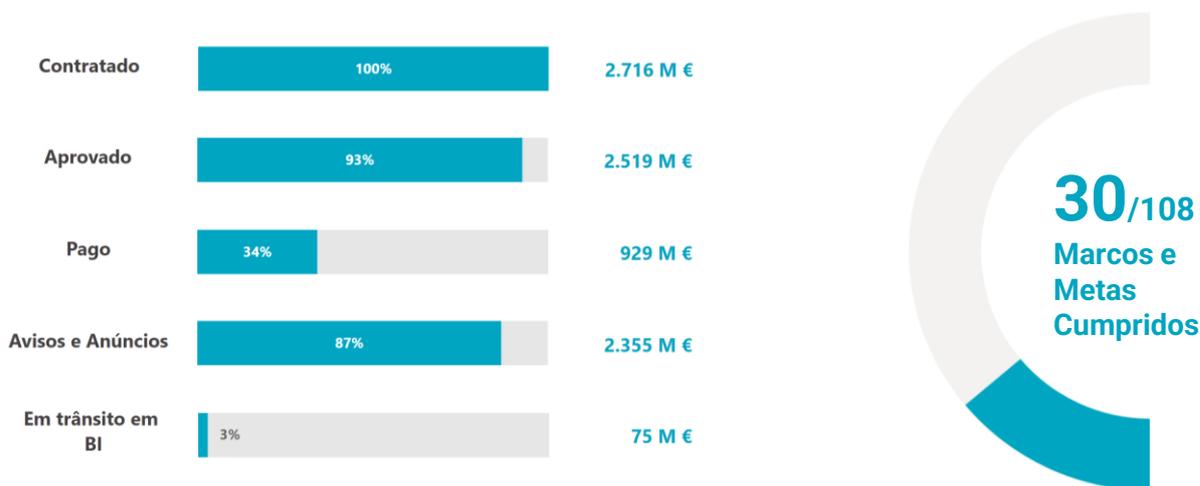

Evolução da Implementação Financeira até ao 4º trimestre de 2024



Os valores percentuais bem como as respetivas variações em pontos percentuais foram calculados tendo por base a dotação do PRR de 22.216 M €.


5

Síntese da Implementação por Componente

5. Síntese da Implementação por Componente

	COMPONENTE C01 Serviço Nacional de Saúde	1.739 M € Dotação orçamental
--	--	--

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 31.12.2024

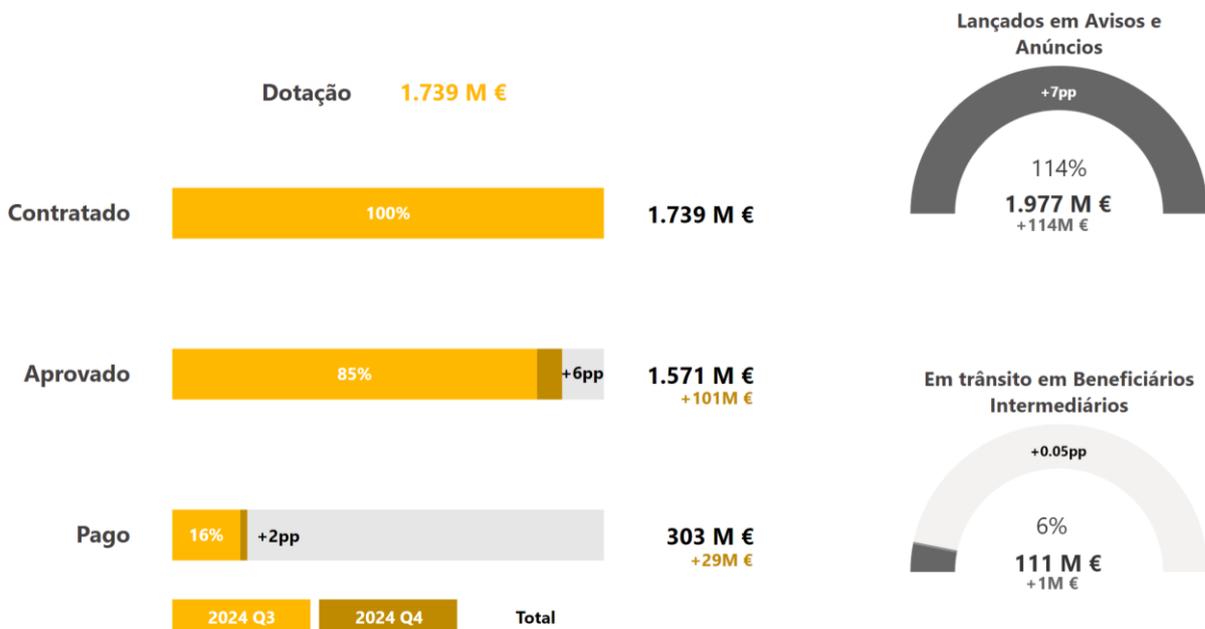

Reformas

CÓDIGO	REFORMA	ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO A 31.12.2024
C01-r01	Reforma dos cuidados de saúde primários	Concretizada
C01-r02	Reforma no domínio da saúde mental	Concretizada
C01-r03	Conclusão da reforma do modelo de governação dos hospitais públicos	Em fase de implementação

5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C01 Serviço Nacional de Saúde

1.739 M €
Dotação orçamental

Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 31.12.2024	PAGO A 31.12.2024
C01-i01	Cuidados de Saúde Primários com mais respostas Responsável: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE I.P.	683 M €	74%	12%
C01-i02	Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e Rede Nacional de Cuidados Paliativos Responsável: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE I.P.	235 M €	126%	24%
C01-i03	Conclusão da Reforma de Saúde Mental e implementação da Estratégia para as Demências Responsável: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE I.P.	88 M €	70%	20%
C01-i04	Construção do Hospital de Lisboa Oriental e Equipamento para Hospitais em Lisboa e Vale do Tejo Responsável: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE I.P.	180 M €	73%	15%
C01-i05.01-RAM	Expansão, Desenvolvimento e Melhoria da Rede de Cuidados Continuados Integrados Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM	60 M €	100%	13%
C01-i05.02-RAM	Reforço das respostas na área da saúde mental e das demências associadas ao envelhecimento Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM	39 M €	100%	17%
C01-i06	Transição Digital na Saúde Responsável: SPMS - SERVIÇOS PARTILHADOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, E.P.E.	300 M €	100%	28%
C01-i07.01-RAM	Digitalização da Saúde na RAM-IASAUDE Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM	4 M €	100%	19%
C01-i07.02-RAM	Digitalização da Saúde na RAM-SESARAM Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM	11 M €	100%	52%
C01-i07.03-RAM	Digitalização da Saúde na RAM-DRS Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM	1 M €	100%	13%
C01-i08-RAA	Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores Responsável: DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FUNDOS ESTRUTURAIIS	30 M €	100%	47%
C01-i09	Sistema Universal de Apoio à Vida Ativa Responsável: INSTITUTO PORTUGUÊS DO DESPORTO E JUVENTUDE, I.P.	10 M €	100%	36%
C01-i10	Programa de Modernização Tecnológica do SNS Responsável: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE I.P.	100 M €	120%	0%


5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C02
Habitação

3.229 M €
Dotação orçamental

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 31.12.2024

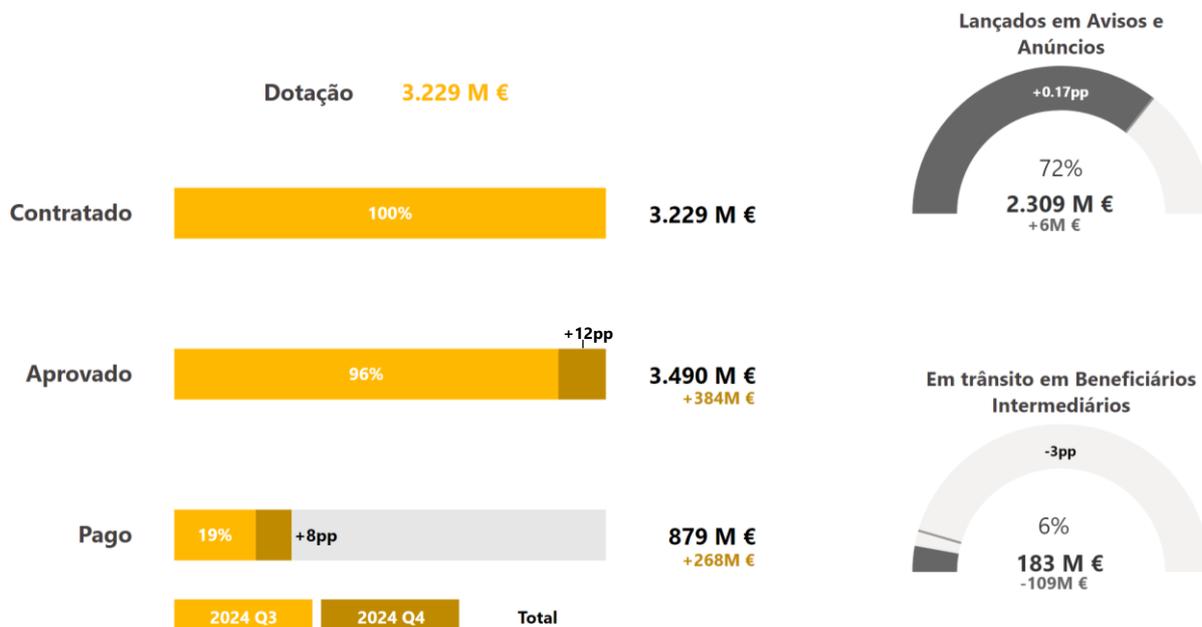

Reformas

CÓDIGO	REFORMA	ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO A 31.12.2024
C02-r04	Plano Nacional de Alojamento Urgente e Temporário	Concretizada


Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 31.12.2024	PAGO A 31.12.2024
C02-i01	Programa de apoio ao acesso à habitação Responsável: INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, I.P.	1.210 M €	143%	36%
C02-i02	Bolsa nacional de alojamento urgente e temporário Responsável: INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, I.P.	203 M €	48%	17%
C02-i03-RAM	Reforço da oferta de habitação apoiada na Região Autónoma da Madeira Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM	136 M €	100%	28%
C02-i04-RAA	Aumentar as condições habitacionais do parque habitacional da Região Autónoma dos Açores Responsável: DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FUNDOS ESTRUTURAIIS	44 M €	100%	35%
C02-i05	Parque público de habitação a custos acessíveis Responsável: INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, I.P.	900 M €	88%	18%
C02-i06	Alojamento Estudantil a custos acessíveis Responsável: AGÊNCIA NACIONAL PARA A GESTÃO DO PROGRAMA ERASMUS+ EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO	516 M €	97%	32%
C02-i07-RAA	Infraestruturas para parcelas de terreno destinadas à habitação Responsável: DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FUNDOS ESTRUTURAIIS	4 M €	100%	20%
C02-i08-RAA	Reforço do parque habitacional social Responsável: DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FUNDOS ESTRUTURAIIS	19 M €	100%	20%
C02-i09	Programa de apoio ao acesso à habitação (empréstimo) Responsável: INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, I.P.	197 M €	85%	13%

5. Síntese da Implementação por Componente

	COMPONENTE C03 Respostas Sociais	1.043 M € Dotação orçamental
--	--	--

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 31.12.2024

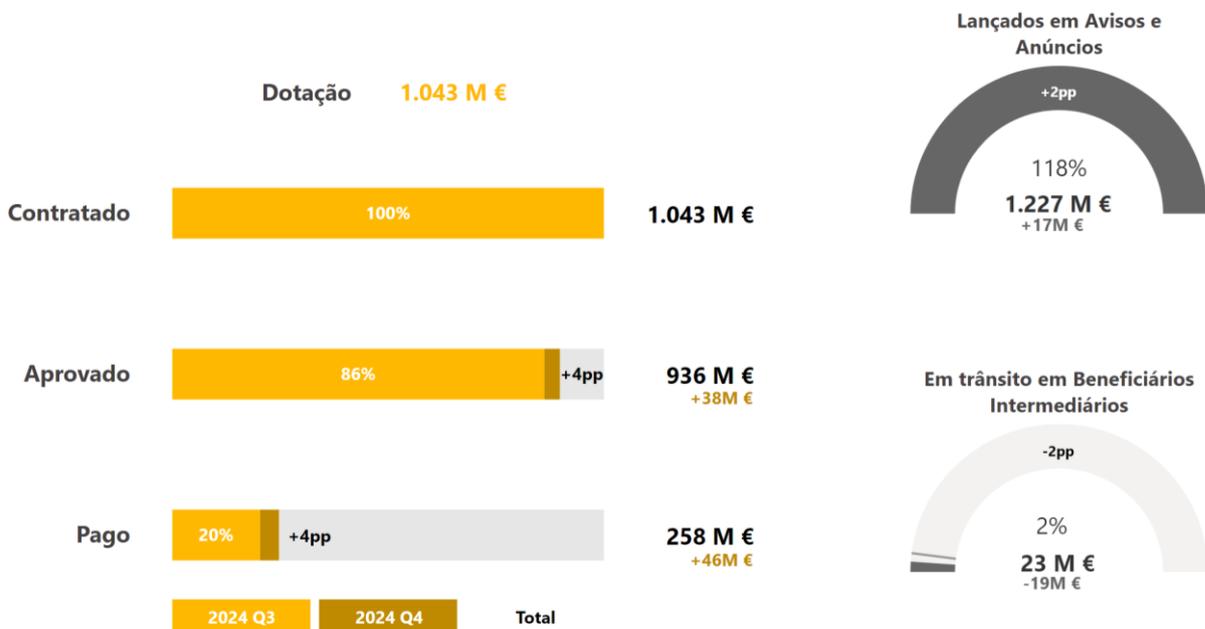

Reformas

CÓDIGO	REFORMA	ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO A 31.12.2024
C03-r05	Reforma da provisão de equipamentos e respostas sociais	Concretizada
C03-r06	Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência 2021-2025	Concretizada
C03-r07	Contratualização de programas integrados de apoio às comunidades desfavorecidas nas áreas metropolitanas	Concretizada
C03-r08	Estratégia Nacional de Combate à Pobreza	Concretizada
C03-r38	Simplificação e eficácia do sistema de segurança social	Em fase de implementação

5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C03 Respostas Sociais

1.043 M €
Dotação orçamental


Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 31.12.2024	PAGO A 31.12.2024
C03-i01	Nova Geração de Equipamentos e Respostas Sociais Responsável: INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	591 M €	87%	29%
C03-i02	Acessibilidades 360º Responsável: INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇÃO, I.P.	53 M €	54%	11%
C03-i03-RAM	Fortalecimento das respostas sociais na Região Autónoma da Madeira (RAM) Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM	95 M €	92%	21%
C03-i04-RAA	Implementar a Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social - Redes de Apoio Social (RAA) Responsável: DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FUNDOS ESTRUTURAIS	40 M €	100%	46%
C03-i05	Plataforma +Acesso Responsável: INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇÃO, I.P.	3 M €	100%	28%
C03-i06.01	Operações Integradas em Comunidades Desfavorecidas nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto – Programa Bairros Saudáveis Responsável: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE I.P.	7 M €	98%	69%
C03-i06.02	Operações Integradas em Comunidades Desfavorecidas na Área Metropolitana de Lisboa Responsável: ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA	122 M €	100%	20%
C03-i06.03	Operações Integradas em Comunidades Desfavorecidas na Área Metropolitana do Porto Responsável: ÁREA METROPOLITANA DO PORTO	122 M €	100%	9%
C03-i07-RAA	Modernização e expansão da rede de estruturas residenciais para pessoas idosas (ERPI) Responsável: DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FUNDOS ESTRUTURAIS	11 M €	100%	27%

5. Síntese da Implementação por Componente

	COMPONENTE C04 Cultura	319 M € Dotação orçamental
--	----------------------------------	--------------------------------------

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 31.12.2024

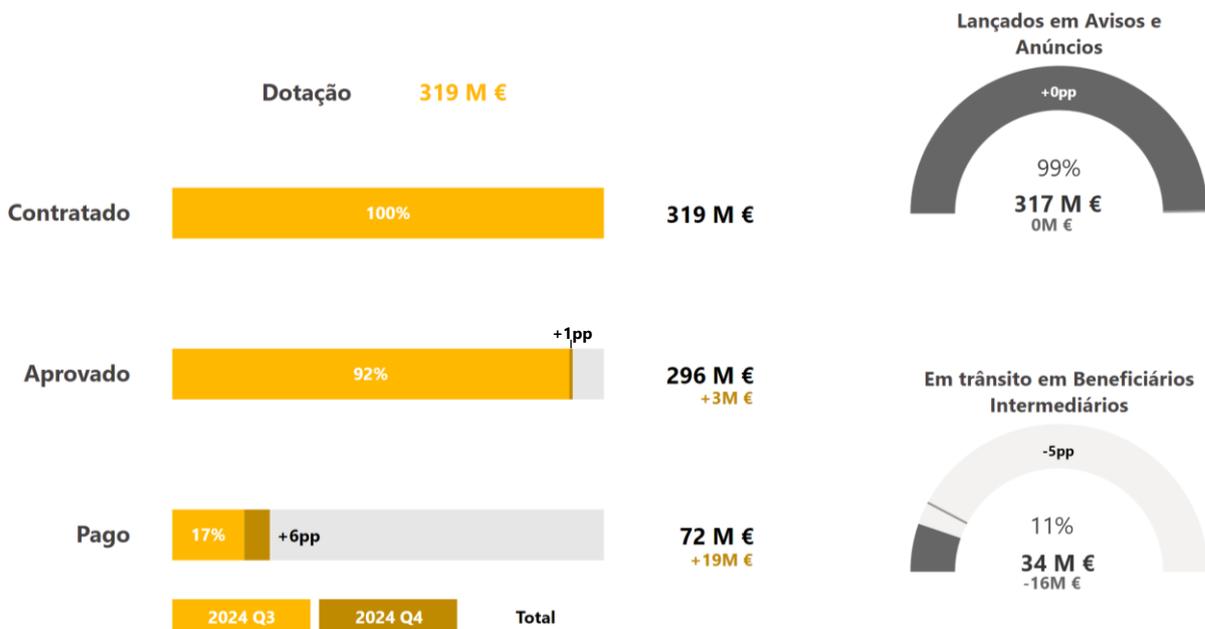

Reformas

Não existem reformas associadas a esta componente.

Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 31.12.2024	PAGO A 31.12.2024
C04-i01	Redes Culturais e Transição Digital Responsável: GABINETE DE ESTRATÉGIA, PLANEAMENTO E AVALIAÇÃO CULTURAIS	103 M €	78%	24%
C04-i02	Património Cultural Responsável: FUNDO DE SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO CULTURAL	216 M €	100%	22%

5. Síntese da Implementação por Componente




COMPONENTE C05

Capitalização e Inovação Empresarial

4.915 M €
Dotação orçamental

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 31.12.2024

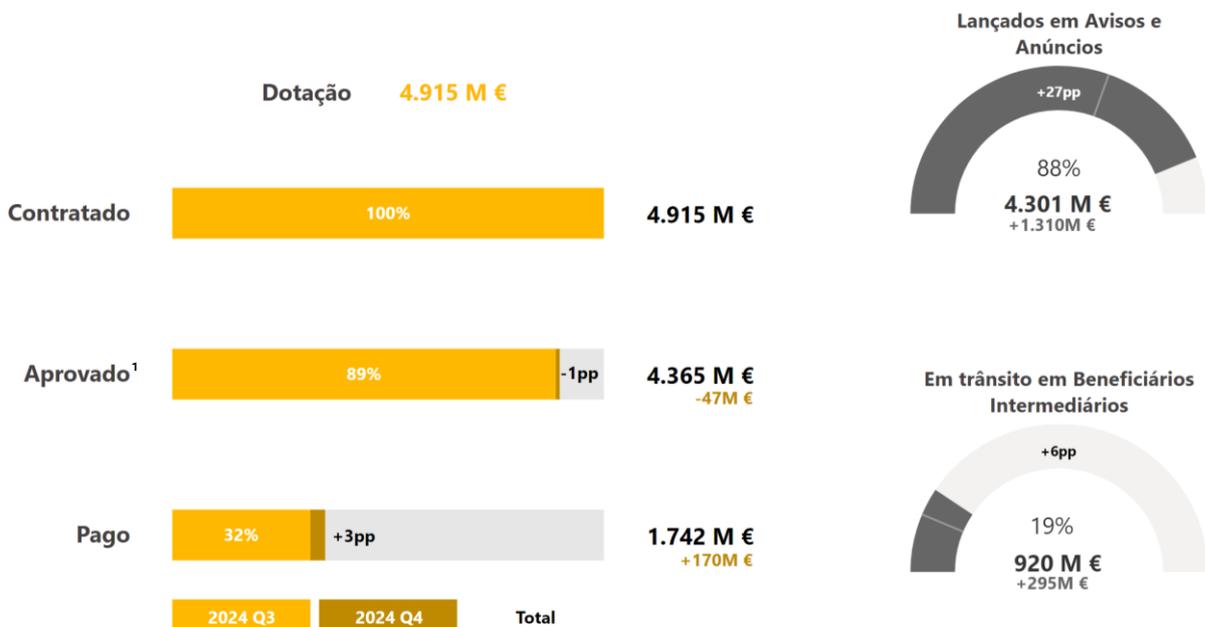

Reformas

CÓDIGO	REFORMA	ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO A 31.12.2024
C05-r09	Promoção da Investigação, Desenvolvimento e Inovação (I&D&I) e do investimento inovador nas empresas	● Concretizada
C05-r10	Criação e desenvolvimento do Banco Português de Fomento	● Concretizada
C05-r11	Alargamento e consolidação da Rede de Instituições de Interface	● Concretizada
C05-r12	Agenda de investigação e inovação para a sustentabilidade da agricultura, alimentação e agroindústria	● Concretizada
C05-r13	Desenvolvimento do mercado de capitais e promoção da capitalização das empresas não-financeiras	● Concretizada

¹Informação corrigida, pelo beneficiário, após a data de fecho deste relatório; ajuste de valor contratado com beneficiários finais.

5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C05 Capitalização e Inovação Empresarial

4.915 M €
Dotação orçamental

Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 31.12.2024	PAGO A 31.12.2024
C05-i01.01	Agendas/Alianças mobilizadoras para a Inovação Empresarial Responsável: IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P.	558 M €	84%	31%
C05-i01.02	Agendas/Alianças Verdes para a Inovação Empresarial Responsável: IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P.	372 M €	91%	31%
C05-i02	Missão Interface - renovação da rede de suporte C&T e orientação para o tecido produtivo Responsável: ANI - AGÊNCIA NACIONAL DE INOVAÇÃO, S.A.	186 M €	102%	46%
C05-i03	Agenda de investigação e inovação para a sustentabilidade da agricultura, alimentação e agroindústria Responsável: INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS (IFAP, I.P.)	93 M €	100%	31%
C05-i04-RAA	Recapitalizar Sistema Empresarial dos Açores Responsável: DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FUNDOS ESTRUTURAIIS	125 M €	103%	26%
C05-i05-RAA	Relançamento Económico da Agricultura Açoriana Responsável: DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FUNDOS ESTRUTURAIIS	34 M €	144%	30%
C05-i06.01	Capitalização de empresas e resiliência financeira Responsável: BANCO PORTUGUÊS DE FOMENTO, S.A.	1.300 M €	67%	23%
C05-i06.02	Capitalização de empresas e resiliência financeira/Banco Português de Fomento Responsável: BANCO PORTUGUÊS DE FOMENTO, S.A.	250 M €	100%	100%
C05-i07-RAM	Instrumentos de capitalização para empresas da Madeira Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM	4 M €	100%	13%
C05-i08	Ciência Mais Digital Responsável: FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA	48 M €	75%	47%
C05-i09	Reforço: Agendas/Alianças Mobilizadoras para a Inovação Empresarial Responsável: IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P.	319 M €	81%	35%
C05-i10	Reforço: Agendas/Alianças Verdes para a Inovação Empresarial Responsável: IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P.	320 M €	93%	40%
C05-i11	Reforço: Agendas/Alianças Mobilizadoras para a Inovação Empresarial (Empréstimos) Responsável: IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P.	772 M €	99%	41%
C05-i12	Reforço: Agendas/Alianças Verdes para a Inovação Empresarial (Empréstimos) Responsável: IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P.	533 M €	116%	32%


5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C06
Qualificação e Competências

1.979 M €
Dotação orçamental

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 31.12.2024

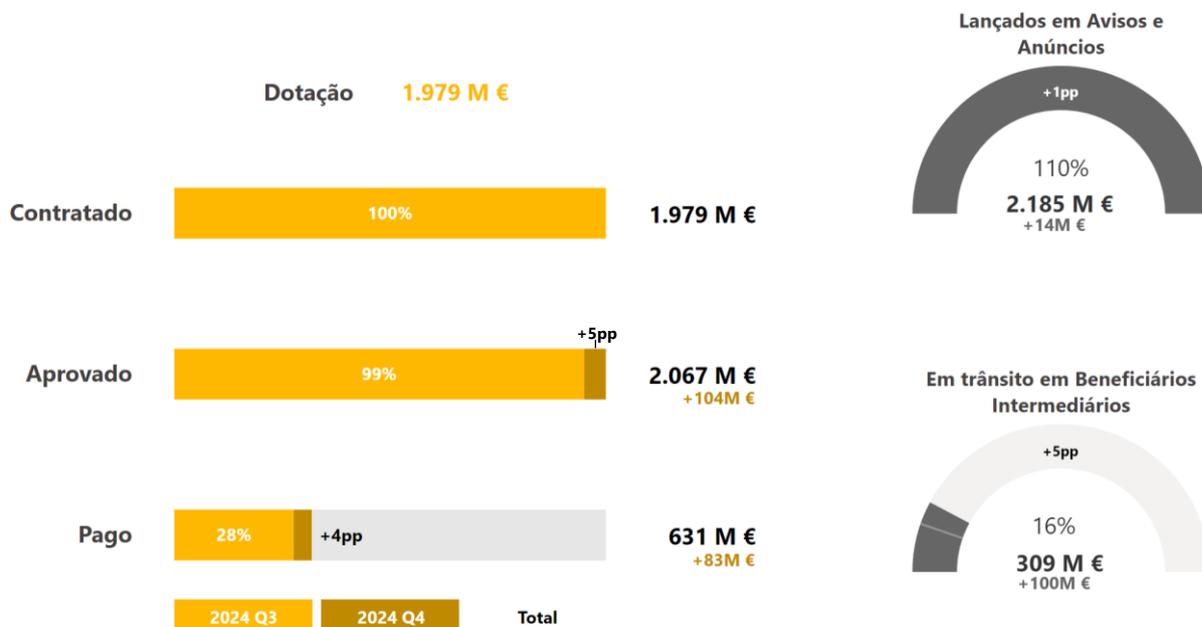

Reformas

CÓDIGO	REFORMA	ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO A 31.12.2024
C06-r14	Reforma do ensino e formação profissionais	🕒 Em fase de implementação
C06-r15	Reforma da cooperação entre ensino superior e administração pública e empresas	🟢 Concretizada
C06-r16	Redução das restrições nas profissões altamente regulamentadas	🟢 Concretizada
C06-r17	Agenda de promoção do trabalho digno	🟢 Concretizada
C06-r18	Combate às desigualdades entre mulheres e homens	🕒 Em fase de implementação

5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C06 Qualificação e Competências

1.979 M €
Dotação orçamental

Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 31.12.2024	PAGO A 31.12.2024
C06-i01.01	Instalação e/ou modernização dos Centros Tecnológicos Especializados: Responsável: INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO, I.P.	480 M €	98%	30%
C06-i01.02	Modernização da oferta e dos estabelecimentos de ensino e da formação profissional - Modernização da Formação Profissional Responsável: INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P.	230 M €	100%	21%
C06-i01.03	Modernização das instituições de ensino e formação profissionais - Instalação e/ou modernização dos Centros Tecnológicos Especializados - Turismo Responsável: TURISMO DE PORTUGAL I.P.	20 M €	100%	14%
C06-i02	Compromisso Emprego Sustentável Responsável: INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P.	230 M €	152%	84%
C06-i03.01	Incentivo Adultos - Projetos Locais Promotores de Qualificações de Nível B1/B2/B3 Responsável: AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO E O ENSINO PROFISSIONAL, I.P.	40 M €	97%	13%
C06-i03.02	Incentivo Adultos - Acelerador Qualifica Responsável: AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO E O ENSINO PROFISSIONAL, I.P.	55 M €	56%	50%
C06-i03.03	Impulso Adultos Responsável: DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR	138 M €	95%	28%
C06-i04.01	Impulso Jovens STEAM Responsável: DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR	131 M €	93%	33%
C06-i04.02	Impulso Jovens STEAM - Rede Ciência Viva Responsável: CIÊNCIA VIVA - AGÊNCIA NACIONAL PARA A CULTURA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	9 M €	93%	65%
C06-i05-RAA	Qualificação de adultos e aprendizagem ao longo da vida na RAA Responsável: DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FUNDOS ESTRUTURAIS	29 M €	103%	25%
C06-i06	Ciência Mais Capacitação Responsável: FUNDAÇÃO PARA A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA	45 M €	7%	1%
C06-i07	Impulso Mais Digital Responsável: DIRECÇÃO-GERAL DO ENSINO SUPERIOR	105 M €	100%	30%
C06-i08-RAM	Ampliação do Edifício do CITMA Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM	18 M €	100%	0%
C06-i09.01	Escolas novas ou renovadas - CCDR Norte Responsável: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE, I. P. (CCDR NORTE, I. P.)	125 M €	104%	18%
C06-i09.02	Escolas novas ou renovadas - CCDR Centro Responsável: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO (CCDR CENTRO)	150 M €	100%	0%
C06-i09.03	Escolas novas ou renovadas - CCDR LVT Responsável: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO, I.P. (CCDR LISBOA E VALE DO TEJO, I.P.)	125 M €	139%	33%
C06-i09.04	Escolas novas ou renovadas - CCDR Alentejo Responsável: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, I. P. (CCDR ALENTEJO, I. P.)	20 M €	89%	27%
C06-i09.05	Escolas novas ou renovadas - CCDR Algarve Responsável: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE, I.P. (CCDR ALGARVE, I.P.)	30 M €	140%	36%


5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C07
Infraestruturas

813 M €
Dotação orçamental

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 31.12.2024

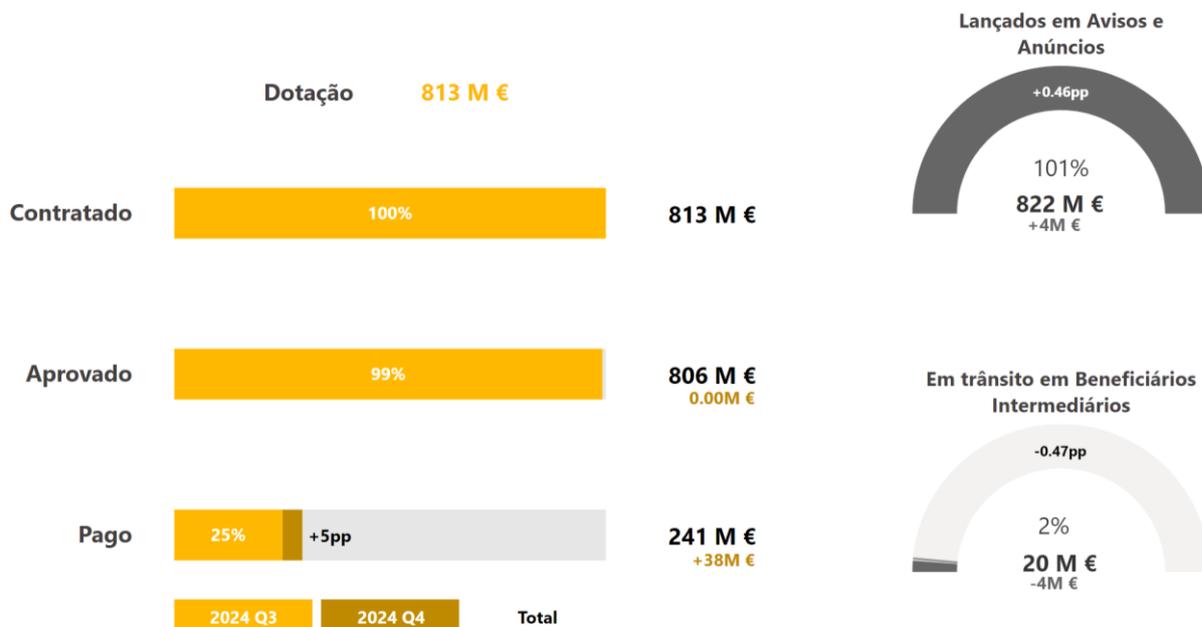

Reformas

Não existem reformas associadas a esta componente.

5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C07 Infraestruturas

813 M €
Dotação orçamental

Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 31.12.2024	PAGO A 31.12.2024
C07-i01.01	Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) Responsável: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE, I. P. (CCDR NORTE, I. P.)	31 M €	100%	7%
C07-i01.02	Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) Responsável: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO (CCDR CENTRO)	32 M €	100%	14%
C07-i01.03	Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) Responsável: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO, I.P. (CCDR LISBOA E VALE DO TEJO, I.P.)	13 M €	100%	1%
C07-i01.04	Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) Responsável: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, I. P. (CCDR ALENTEJO, I. P)	30 M €	99%	13%
C07-i01.05	Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) Responsável: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE, I.P. (CCDR ALGARVE, I.P.)	4 M €	100%	4%
C07-i02.01	Missing links e Aumento capacidade da Rede - EN14, EN4, IC35, IP2, EN125, EN211, EN344, IC2, IP8 (A26), Baião/Pone Ermida, IP8 (EN121), IP8 (EN259) Responsável: INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.	320 M €	100%	38%
C07-i02.02	Missing links e Aumento capacidade da Rede - Eixo Rodoviário Aveiro – Águeda Responsável: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO (CCDR CENTRO)	47 M €	100%	13%
C07-i03.01	Ligações transfronteiriças - Ponte internacional sobre o Rio Sever Responsável: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, I. P. (CCDR ALENTEJO, I. P)	11 M €	100%	7%
C07-i03.02	Ligações transfronteiriças - Ponte Alcoutim – Saluncar del Guadiana (ES) Responsável: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE, I.P. (CCDR ALGARVE, I.P.)	11 M €	100%	9%
C07-i03.03	Ligações transfronteiriças - EN103. Vinhais / Bragança (variantes) Responsável: INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.	37 M €	100%	17%
C07-i03.04	Ligações transfronteiriças - Ligação de Bragança a Puebla de Sanabria (ES) Responsável: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE, I. P. (CCDR NORTE, I. P.)	19 M €	100%	10%
C07-i04.01	Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) – Acessibilidades Rodoviárias Responsável: INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.	106 M €	100%	45%
C07-i04.02	Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) – Acessibilidades Rodoviárias - EN10-4. Setúbal/ Mitrena e Ligação da A8 à Área Empresarial das Palhagueiras em Torres Vedras Responsável: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO, I.P. (CCDR LISBOA E VALE DO TEJO, I.P.)	11 M €	100%	17%
C07-i04.03	Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) – Acessibilidades Rodoviárias : Ligação do Parque Empresarial do Casarão ao IC2 Responsável: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO (CCDR CENTRO)	7 M €	100%	13%
C07-i04.04	Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) – Acessibilidades Rodoviárias Responsável: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE, I. P. (CCDR NORTE, I. P.)	42 M €	85%	11%
C07-i04.05	Áreas de Acolhimento Empresarial (AAE) – Acessibilidades Rodoviárias - Rotunda na EN246 para acesso à zona industrial de Portalegre Responsável: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, I. P. (CCDR ALENTEJO, I. P)	0 M €	100%	84%
C07-i05-RAA	Circuitos Logísticos - Rede Viária Regional dos Açores Responsável: DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FUNDOS ESTRUTURAIIS	92 M €	100%	41%


5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C08
Florestas

615 M €
Dotação orçamental

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 31.12.2024

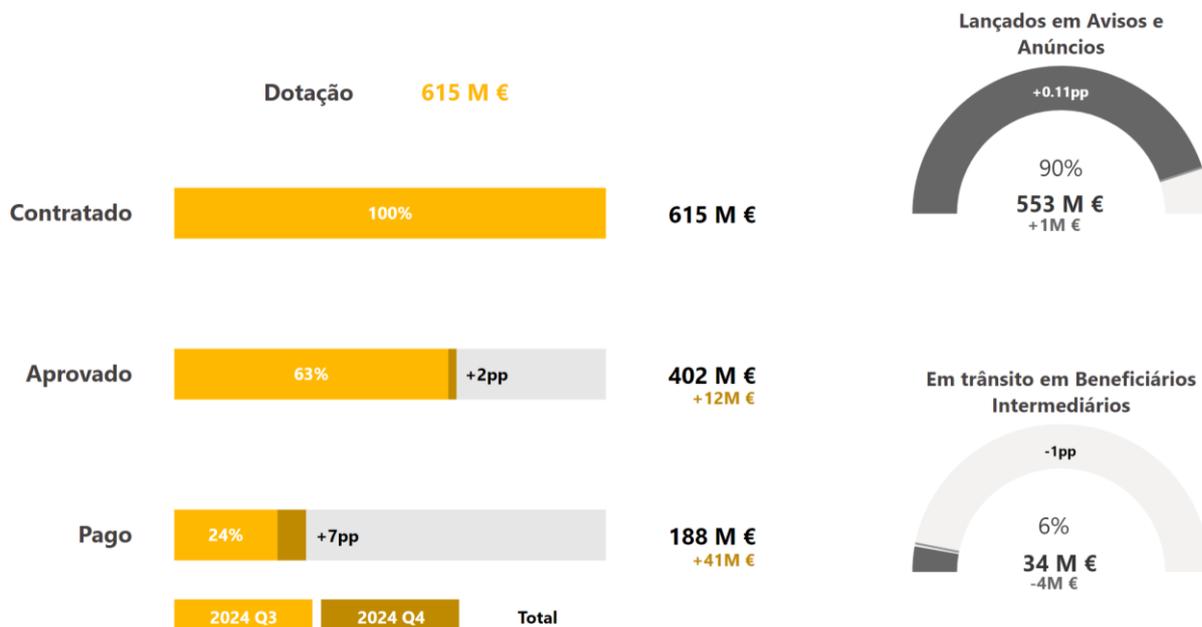

Reformas

CÓDIGO	REFORMA	ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO A 31.12.2024
C08-r19	Transformação da paisagem dos territórios de floresta vulneráveis	Concretizada
C08-r20	Reorganização do sistema de cadastro da propriedade rústica e do Sistema de Monitorização de Ocupação do Solo	Concretizada
C08-r21	Prevenção e combate de fogos rurais	Concretizada

5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C08 Florestas

615 M €
Dotação orçamental

Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 31.12.2024	PAGO A 31.12.2024
C08-i01.01	Transformação da Paisagem dos Territórios de Floresta Vulneráveis – Subinvestimento Áreas integradas de gestão da paisagem (AIGP) e Condomínios de Aldeia Responsável: FUNDO AMBIENTAL	257 M €	22%	5%
C08-i01.02	Transformação da Paisagem dos Territórios de Floresta Vulneráveis: Programas de Reordenamento e Gestão da Paisagem Responsável: DIREÇÃO-GERAL DO TERRITÓRIO	3 M €	100%	41%
C08-i01.03	Transformação da Paisagem dos Territórios de Floresta Vulneráveis - Emparcelar para Ordenar Responsável: INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS (IFAP, I.P.)	10 M €	0%	0%
C08-i02.01	Cadastro da Propriedade Rústica e Sistema de Monitorização da Ocupação do Solo: SMOS e Sistema de conservação do cadastro e de acreditação de técnicos de cadastro predial do Sistema Nacional de Cadastro Predial Responsável: DIREÇÃO-GERAL DO TERRITÓRIO	28 M €	100%	31%
C08-i02.02	Cadastro da Propriedade Rústica e Sistema de Monitorização da Ocupação do Solo: Inventário Florestal Nacional Responsável: INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.	3 M €	100%	13%
C08-i02.03	Cadastro da Propriedade Rústica e Sistema de Monitorização da Ocupação do Solo: Sistema Nacional de Cadastro Predial Responsável: SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA JUSTIÇA	45 M €	97%	63%
C08-i02.04	Cadastro da Propriedade Rústica e Sistema de Monitorização da Ocupação do Solo: Sistema Nacional de Cadastro Predial – Dimensão Local Região Norte Responsável: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE, I. P. (CCDR NORTE, I. P.)	5 M €	101%	0%
C08-i02.05	Cadastro da Propriedade Rústica e Sistema de Monitorização da Ocupação do Solo: Sistema Nacional de Cadastro Predial – Dimensão Local Região Centro Responsável: COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO (CCDR CENTRO)	5 M €	100%	0%
C08-i03	Faixas de gestão de combustível - Rede Primária Responsável: INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.	120 M €	100%	17%
C08-i04.01	Meios de prevenção e combate a incêndios rurais – Subinvestimento Meios aéreos Responsável: ESTADO MAIOR DA FORÇA AEREA	70 M €	100%	89%
C08-i04.02	Meios de prevenção e combate a incêndios rurais – Subinvestimento Meios terrestres Responsável: INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.	16 M €	100%	98%
C08-i04.03	Meios de prevenção e combate a incêndios rurais: Rede de radares Responsável: INSTITUTO PORTUGUÊS DO MAR E DA ATMOSFERA, I.P.	3 M €	100%	100%
C08-i05.01	Programa MAIS Floresta: Reforma do sistema de prevenção e combate de incêndios Responsável: SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	40 M €	103%	87%
C08-i05.02	Programa MAIS Floresta: Reforço de atuação das organizações de produtores florestais (OPF) e dos Centros de Competências no setor florestal Responsável: FUNDO AMBIENTAL	10 M €	67%	7%


5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C09 Gestão Hídrica

461 M €
Dotação orçamental

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 31.12.2024

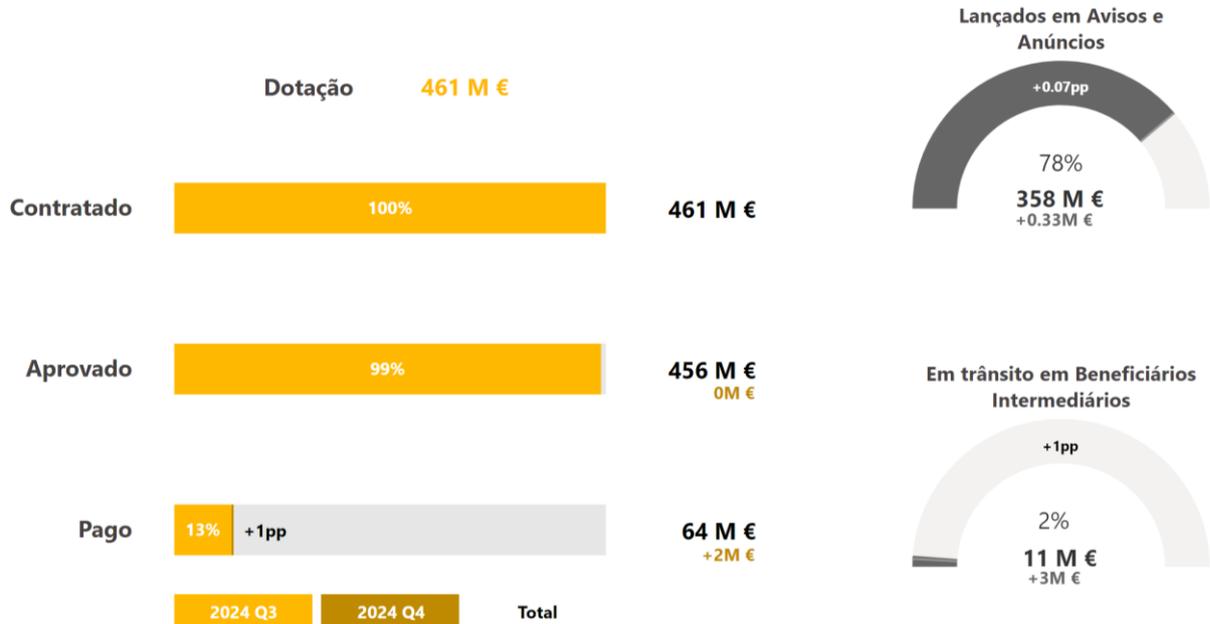

Reformas

Não existem reformas associadas a esta componente.

Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 31.12.2024	PAGO A 31.12.2024
C09-i01.01	Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve: SM1 – Reduzir perdas de água no setor urbano Responsável: CI - AMAL - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE	44 M €	99%	16%
C09-i01.02	Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve: SM2 – Reduzir perdas de água e aumentar a eficiência no setor agrícola Responsável: FUNDO AMBIENTAL	19 M €	73%	7%
C09-i01.03	Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve: SM3 – Reforçar a governança dos recursos hídricos Responsável: AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I.P.	6 M €	100%	13%
C09-i01.04	Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve: SM4 – Promover a utilização de Água Residual Tratada, SM5 – Aumentar a capacidade disponível e resiliência das albufeiras/sistemas de adução em alta existentes e reforçar com novas origens de água e SM Responsável: ÁGUAS DO ALGARVE S.A.	169 M €	100%	12%
C09-i02	Aproveitamento hidráulico de fins múltiplos do Crato-Planeamento Responsável: COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO ALENTEJO	0 M €	0%	0%
C09-i03-RAM	Plano de eficiência e reforço hídrico dos sistemas de abastecimento e regadio da RAM Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM	82 M €	100%	22%
C09-i04	Aproveitamento hidráulico de fins múltiplos do Crato - fase de construção Responsável: COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO ALENTEJO	141 M €	100%	12%

A dotação do investimento C09.i02 é de 0€ uma vez que esta verba foi transferida para o investimento C09.i04

5. Síntese da Implementação por Componente


COMPONENTE C10

Mar

393 M €

Dotação orçamental

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 31.12.2024

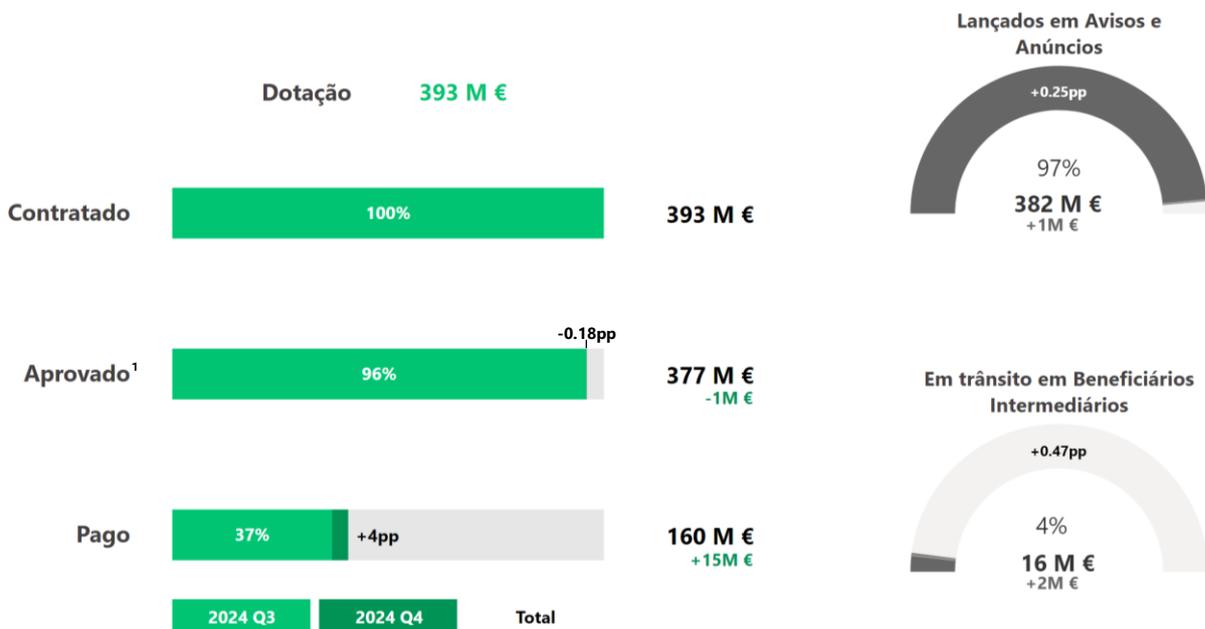

Reformas

CÓDIGO	REFORMA	ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO A 31.12.2024
C10-r23	Reforma do Ecossistema de Infraestruturas de Suporte à Economia Azul	● Concretizada

Investimentos


CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 31.12.2024	PAGO A 31.12.2024
C10-i01	Hub Azul, Rede de Infraestruturas para a Economia Azul Responsável: Fundo Azul	99 M €	97%	28%
C10-i02	Transição Verde e Digital e Segurança nas Pescas Responsável: INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS (IFAP, I.P.)	21 M €	97%	46%
C10-i03.01	Centro de Operações de Defesa do Atlântico e Plataforma Naval - Pilar I - Plataforma Naval Multifuncional e Pilar II - Centro de Operações Responsável: MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL-MARINHA	148 M €	100%	61%
C10-i03.02	Centro de Operações de Defesa do Atlântico e Plataforma Naval - Pilar III - Academia do Arsenal do Alfeite (Academia 4.0) Responsável: ARSENAL DO ALFEITE, S.A.	2 M €	100%	82%
C10-i04-RAA	Desenvolvimento do "Cluster do Mar dos Açores" Responsável: DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FUNDOS ESTRUTURAIIS	48 M €	100%	52%
C10-i05-RAA	Transição energética, digitalização e redução do impacto ambiental no setor da Pesca e da Aquicultura Responsável: DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FUNDOS ESTRUTURAIIS	5 M €	100%	13%
C10-i06-RAM	Tecnologias Oceánicas Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM	20 M €	100%	13%
C10-i07	Green Shipping Responsável: IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P.	50 M €	74%	6%

¹Anulação de projetos

5. Síntese da Implementação por Componente

	COMPONENTE C11 Descarbonização da Indústria	737 M € Dotação orçamental
---	---	--------------------------------------

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 31.12.2024

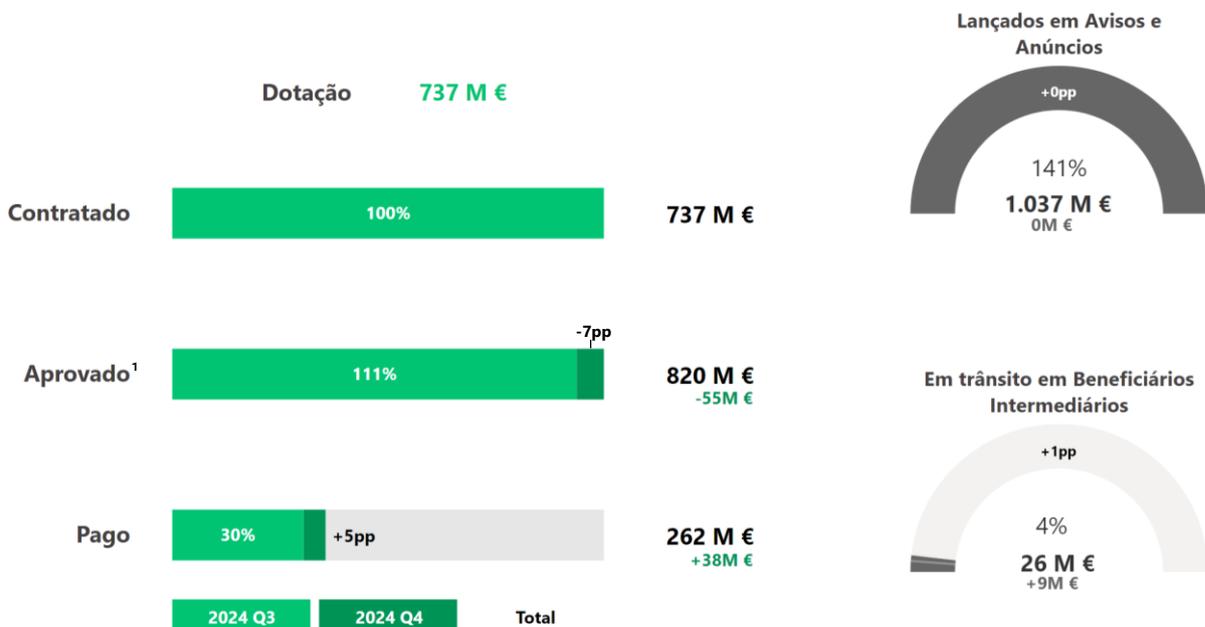

Reformas

Não existem reformas associadas a esta componente.

Investimentos


CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 31.12.2024	PAGO A 31.12.2024
C11-i01	Descarbonização da Indústria Responsável: IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P.	737 M €	111%	36%

¹Desistência e/ou caducidade de projetos

5. Síntese da Implementação por Componente

	COMPONENTE C12 Bioeconomia Sustentável	145 M € Dotação orçamental
---	--	--------------------------------------

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 31.12.2024

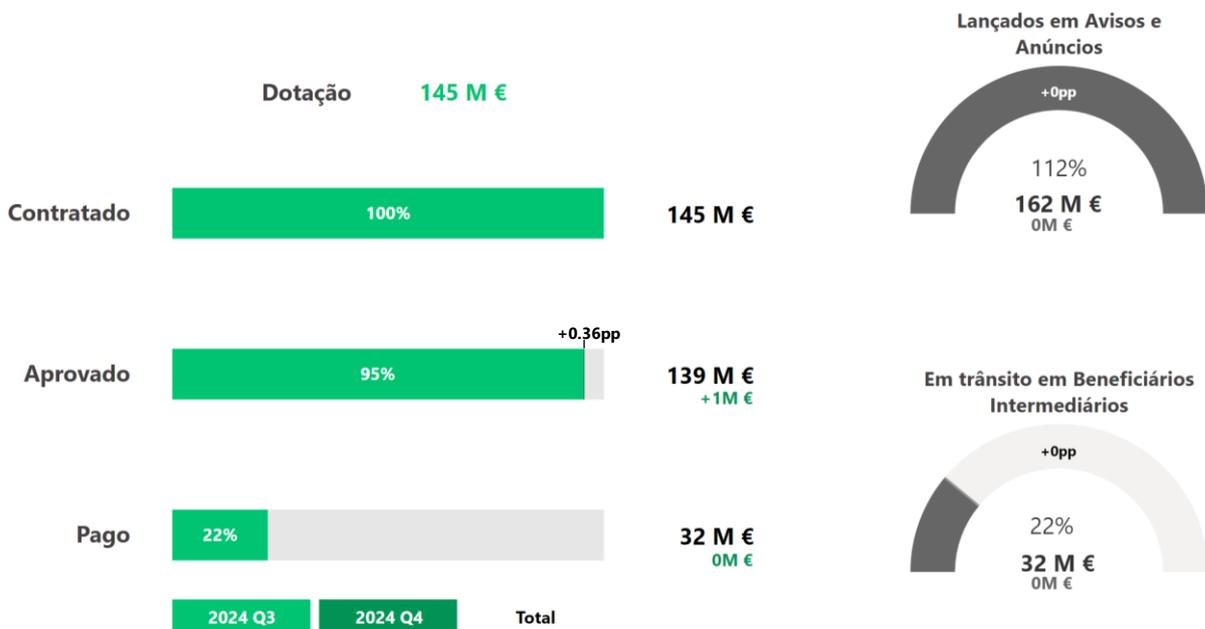

Reformas

CÓDIGO	REFORMA	ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO A 31.12.2024
C12-r25	Bioeconomia sustentável	● Concretizada
C12-r39	Promover a economia circular e uma gestão mais eficiente dos resíduos	● Em fase avançada de implementação

Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 31.12.2024	PAGO A 31.12.2024
C12-i01.01	Bioeconomia: Projetos Integrados (Têxtil e Vestuário, Calçado e Resina Natural) e Beneficiação de Povoamentos de Pinheiro Bravo com Potencial para a Resinagem Responsável: FUNDO AMBIENTAL	140 M €	96%	20%
C12-i01.02	Bioeconomia - Gestão Florestal e Apoio à Resinagem Responsável: INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P.	5 M €	92%	91%


5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C13
Eficiência Energética em Edifícios

610 M €
Dotação orçamental

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 31.12.2024

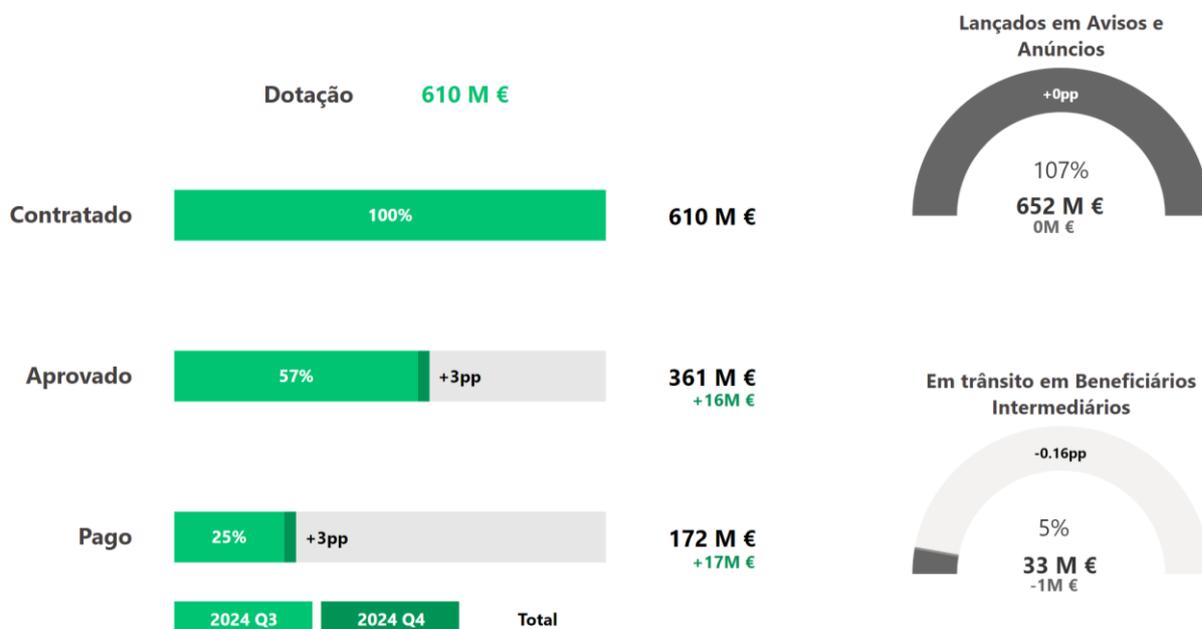

Reformas

Não existem reformas associadas a esta componente.

Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 31.12.2024	PAGO A 31.12.2024
C13-i01	Eficiência energética em edifícios residenciais Responsável: FUNDO AMBIENTAL	300 M €	51%	50%
C13-i02	Eficiência energética em edifícios da administração pública central Responsável: FUNDO AMBIENTAL	240 M €	77%	9%
C13-i03	Eficiência energética em edifícios de serviços Responsável: FUNDO AMBIENTAL	70 M €	31%	3%


5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C14
Hidrogénio e Renováveis

385 M €
Dotação orçamental

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 31.12.2024

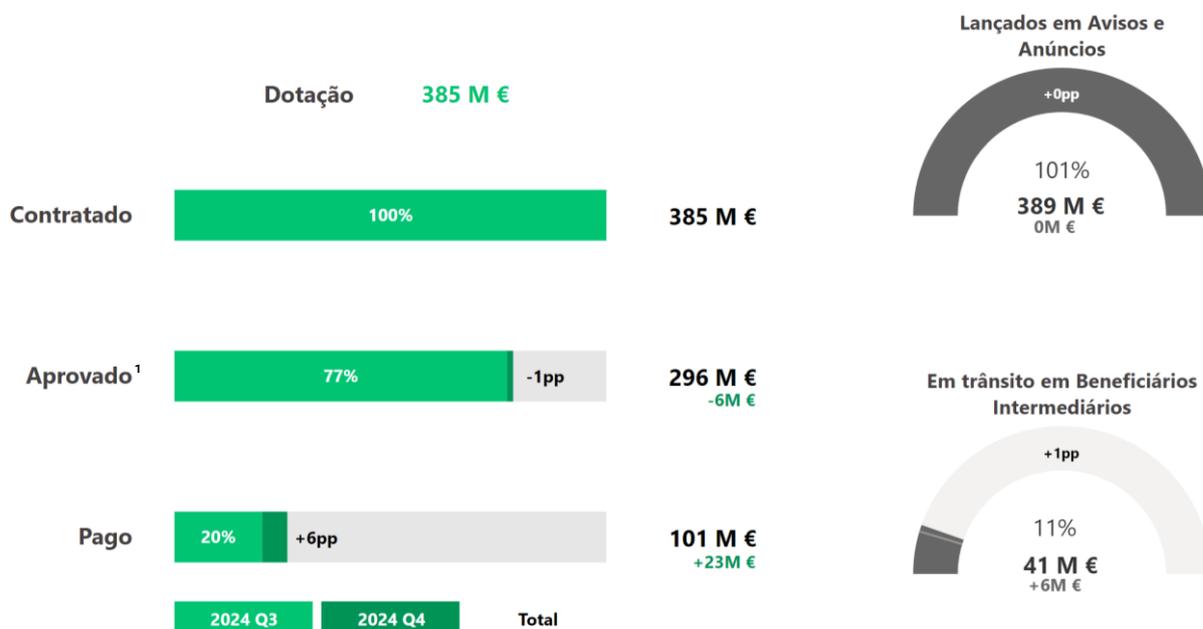

Reformas

CÓDIGO	REFORMA	ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO A 31.12.2024
C14-r29	Estratégia Nacional para o Hidrogénio (EN-H2)	● Concretizada

Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 31.12.2024	PAGO A 31.12.2024
C14-i01	Hidrogénio e gases renováveis Responsável: FUNDO AMBIENTAL	185 M €	52%	3%
C14-i02-RAM	Potenciação da eletricidade renovável no Arquipélago da Madeira Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM	84 M €	100%	50%
C14-i03-RAA	Transição Energética nos Açores Responsável: DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FUNDOS ESTRUTURAIIS	116 M €	100%	46%

¹Informação corrigida, pelo beneficiário, após a data de fecho deste relatório


5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C15
Mobilidade Sustentável

1.262 M €
Dotação orçamental

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 31.12.2024

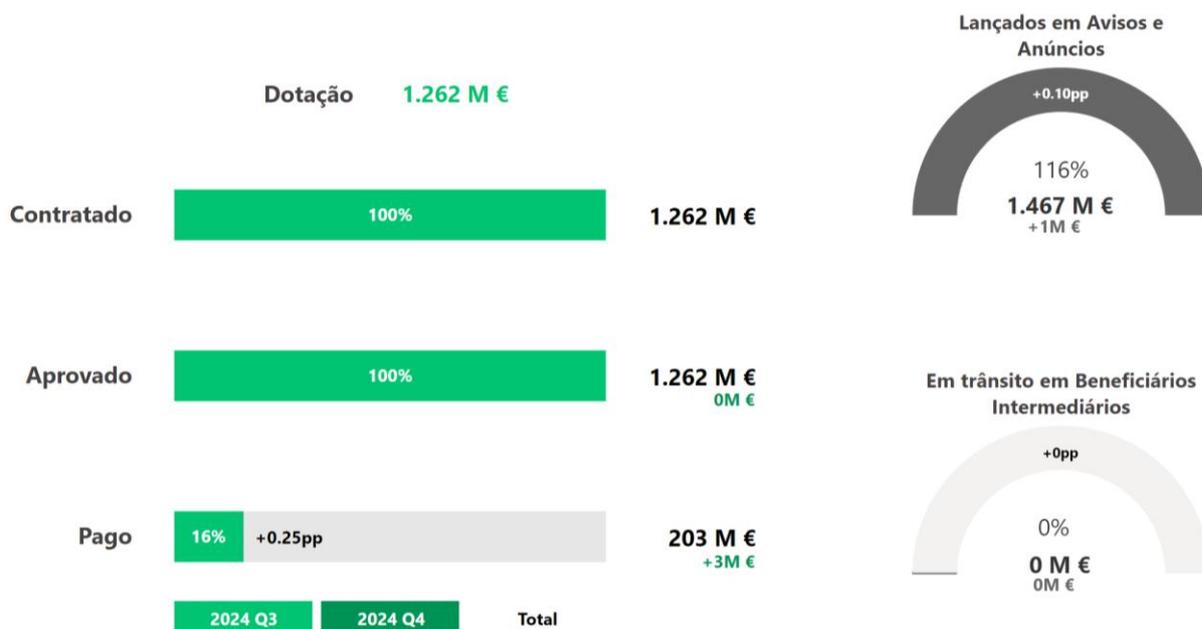

Reformas

CÓDIGO	REFORMA	ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO A 31.12.2024
C15-r30	Reforma do ecossistema de transportes	● Concretizada

Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 31.12.2024	PAGO A 31.12.2024
C15-i01	Expansão da Rede de Metro de Lisboa - Linha Vermelha até Alcântara Responsável: METROPOLITANO DE LISBOA, E.P.E.	358 M €	100%	12%
C15-i02	Expansão da Rede de Metro do Porto - Casa da Música-Santo Ovídio Responsável: METRO DO PORTO S.A.	352 M €	100%	18%
C15-i03	Metro Ligeiro de Superfície Odivelas-Loures Responsável: METROPOLITANO DE LISBOA, E.P.E.	390 M €	100%	8%
C15-i04	Linha BRT Boavista - Império Responsável: METRO DO PORTO S.A.	66 M €	100%	42%
C15-i05	Descarbonização dos Transportes Públicos Responsável: FUNDO AMBIENTAL	48 M €	100%	60%
C15-i06	Digitalização do Transporte Ferroviário Responsável: INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.	49 M €	100%	13%


5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C21
REPower EU

855 M €
Dotação orçamental

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 31.12.2024

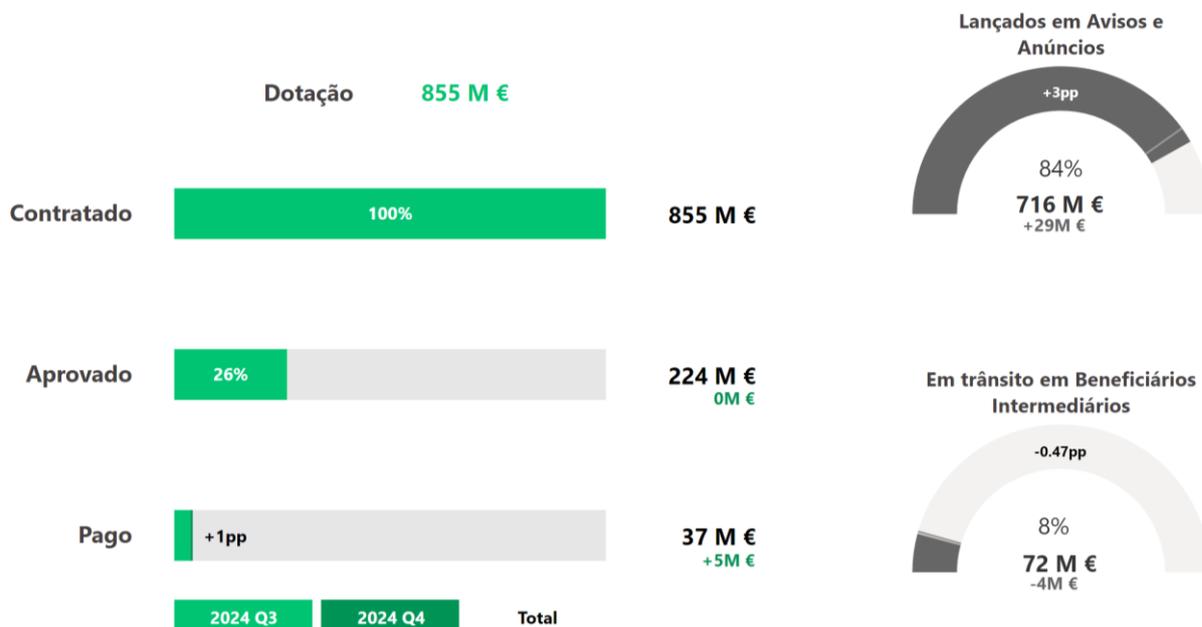

Reformas

CÓDIGO	REFORMA	ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO A 31.12.2024
C21-r43	Observatório Nacional da Pobreza Energética	🕒 Em fase de implementação
C21-r44	Criação de balcões únicos para os cidadãos em matéria de eficiência energética (Espaços Cidadão Energia)	🕒 Em fase de implementação
C21-r45	Competências verdes	🕒 Em fase de implementação
C21-r46	Quadro regulamentar para o hidrogénio renovável	🕒 Em fase de implementação
C21-r47	Primeiro leilão para a compra de biometano sustentável e plano de ação para o biometano	🕒 Em fase de implementação
C21-r48	Simplificação do quadro jurídico e regulamentar aplicável aos projetos de energias renováveis	🕒 Em fase de implementação

5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C21 REPower EU

855 M €
Dotação orçamental

Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 31.12.2024	PAGO A 31.12.2024
C21-i01	Medida reforçada: Descarbonização da Indústria Responsável: IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P.	100 M €	0%	0%
C21-i02	Medida reforçada: Eficiência energética em edifícios residenciais Responsável: FUNDO AMBIENTAL	120 M €	1%	0%
C21-i03	Medida reforçada: Eficiência energética em edifícios de serviços Responsável: FUNDO AMBIENTAL	80 M €	1%	0%
C21-i04-RAM	Eficiência energética em edifícios públicos da Madeira Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM	14 M €	100%	0%
C21-i05	Apoio ao desenvolvimento de uma indústria ecológica Responsável: IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P.	50 M €	35%	8%
C21-i06	Medida reforçada: Hidrogénio e Gases Renováveis Responsável: FUNDO AMBIENTAL	70 M €		
C21-i07.01	Estudos técnicos para potencial energético offshore: Estudos geofísicos, geotécnicos e de parâmetros ambientais Responsável: INSTITUTO PORTUGUÊS DO MAR E DA ATMOSFERA, I.P.	42 M €	100%	25%
C21-i07.02	Estudos técnicos para potencial energético offshore: Estudos de recurso eólico, ondulação e correntes Responsável: LNEG - LABORATÓRIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA I.P.	8 M €	100%	50%
C21-i08	Flexibilidade da Rede e Armazenamento Responsável: FUNDO AMBIENTAL	100 M €	0%	0%
C21-i09	One-Stop-Shop para o Licenciamento e Acompanhamento de Projetos de Energias Renováveis Responsável: DIRECÇÃO-GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA	10 M €	100%	13%
C21-i10-RAA	Sistema de Incentivos à aquisição e instalação de sistemas de armazenamento de energias renováveis nos Açores Responsável: DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FUNDOS ESTRUTURAIIS	6 M €	100%	33%
C21-i11.01-RAM	Sistema de Incentivos à produção e Armazenamento de Energia Proveniente de Fontes Renováveis Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM	6 M €		
C21-i11.02-RAM	Reforço da produção de eletricidade renovável na Ilha do Porto Santo Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM	13 M €	100%	13%
C21-i12	Medida reforçada: Descarbonização dos Transportes Públicos Responsável: FUNDO AMBIENTAL	90 M €		
C21-i13-RAM	Descarbonização dos Transportes Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM	12 M €		
C21-i14	Sistema de BRT Braga Responsável: TUB -TRANSPORTES URBANOS DE BRAGA, E.M.	100 M €	100%	13%
C21-i15-RAA	Aquisição de 2 ferries elétricos Responsável: DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FUNDOS ESTRUTURAIIS	25 M €		
C21-i16	Funicular da Nazaré Responsável: MUNICIPIO DA NAZARE	10 M €	100%	0%

5. Síntese da Implementação por Componente


COMPONENTE C16

Empresas 4.0

763 M €

Dotação orçamental

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 31.12.2024

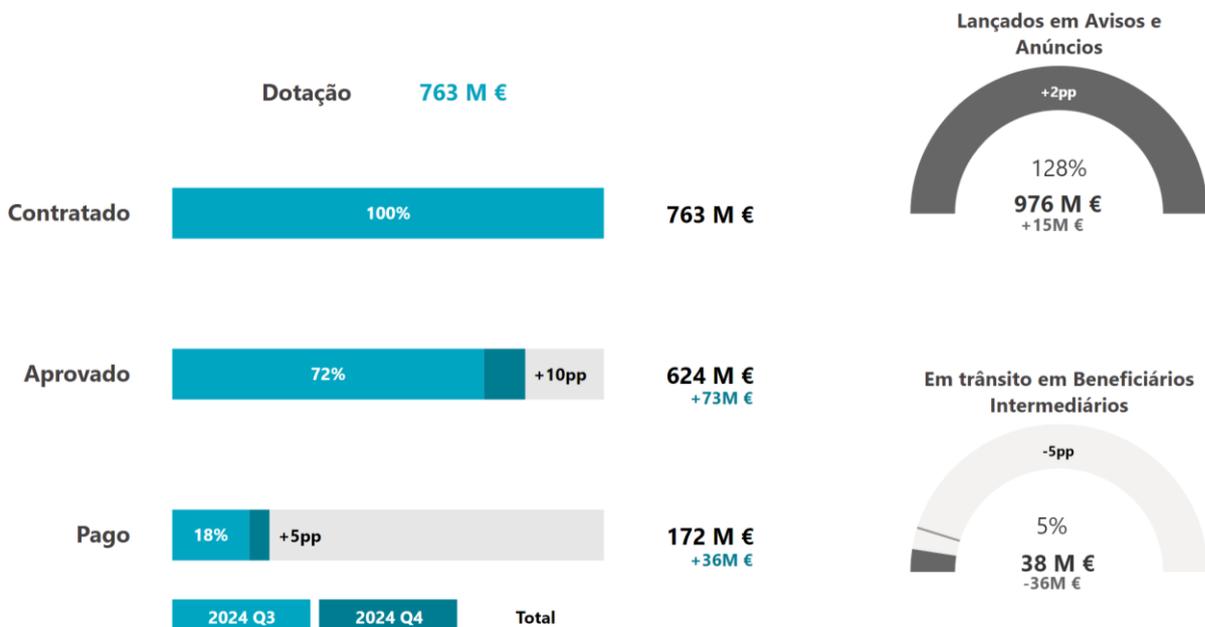

Reformas

CÓDIGO	REFORMA	ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO A 31.12.2024
C16-r31	Transição digital do ambiente empresarial	● Concretizada

Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 31.12.2024	PAGO A 31.12.2024
C16-i01	Capacitação Digital das Empresas Responsável: IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P.	100 M €	154%	47%
C16-i02	Transição Digital das Empresas Responsável: IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P.	475 M €	66%	18%
C16-i03	Catalisação da Transição Digital das Empresas Responsável: IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P.	100 M €	71%	16%
C16-i04	Indústria 4.0 Responsável: IAPMEI - AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO, I.P.	60 M €	100%	29%
C16-i05-RAA	Capacitação e Transformação Digital das Empresas dos Açores Responsável: DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FUNDOS ESTRUTURAIS	22 M €	100%	40%
C16-i06-RAM	Empresas 4.0 Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM	6 M €	100%	0%

5. Síntese da Implementação por Componente




COMPONENTE C17

Qualidade e Sustentab. das Finanças Públicas

406 M €

Dotação orçamental

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 31.12.2024

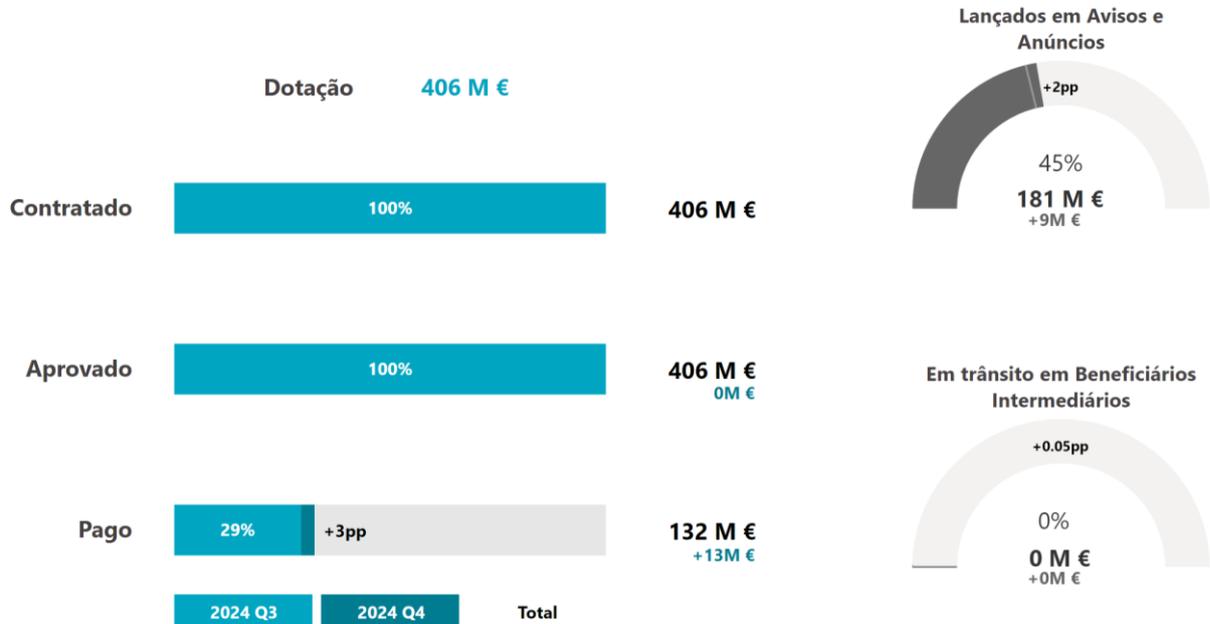

Reformas

CÓDIGO	REFORMA	ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO A 31.12.2024
C17-r32	Modernização e simplificação da gestão financeira pública	Em fase avançada de implementação
C17-r40	Simplificação do sistema fiscal	Em fase de implementação

Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 31.12.2024	PAGO A 31.12.2024
C17-i01.01	Sistemas de informação de Gestão Financeira Pública Responsável: ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, I.P.	161 M €	100%	19%
C17-i01.02	Sistemas de informação de Gestão Financeira Pública/ SIGPIP Responsável: ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, I.P.	2 M €	100%	0%
C17-i02	Modernização da infraestrutura do sistema de informação patrimonial da Autoridade Tributária Responsável: AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	43 M €	100%	23%
C17-i03.01	Transição digital da Segurança Social (ISS) Responsável: INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	19 M €	100%	51%
C17-i03.02	Transição digital da Segurança Social (II) Responsável: INSTITUTO DE INFORMÁTICA, I.P.	182 M €	100%	45%


5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C18
Justiça Económica e Ambiente de Negócios

267 M €
Dotação orçamental

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 31.12.2024

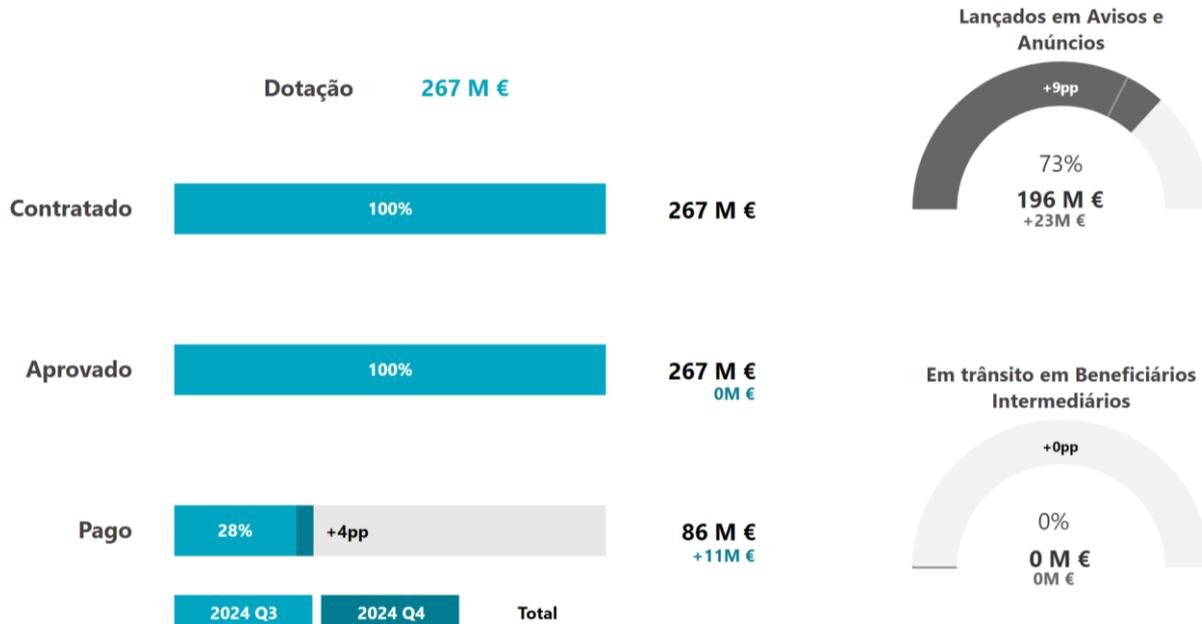

Reformas

CÓDIGO	REFORMA	ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO A 31.12.2024
C18-r33	Justiça económica e ambiente empresarial	Em fase avançada de implementação

5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C18 Justiça Económica e Ambiente de Negócios

267 M €
Dotação orçamental

Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 31.12.2024	PAGO A 31.12.2024
C18-i01.01	TD C18-i01.01: Justiça económica e ambiente de negócios/IGFEJ Responsável: INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA E EQUIPAMENTOS DA JUSTIÇA, I.P.	139 M €	100%	30%
C18-i01.02	TD C18-i01.02: Justiça económica e ambiente de negócios/IRN Responsável: INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO, I.P.	43 M €	100%	34%
C18-i01.03	TD C18-i01.03: Justiça económica e ambiente de negócios/DGPJ Responsável: DIRECÇÃO-GERAL DA POLÍTICA DE JUSTIÇA	24 M €	100%	22%
C18-i01.04	TD C18-i01.04: Justiça económica e ambiente de negócios/DGAJ Responsável: DIRECÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA	16 M €	100%	21%
C18-i01.05	TD C18-i01.05: Justiça económica e ambiente de negócios/PJ Responsável: POLÍCIA JUDICIÁRIA	19 M €	100%	54%
C18-i01.06	TD C18-i01.06: Justiça económica e ambiente de negócios/SGMJ Responsável: SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	9 M €	100%	28%
C18-i01.07	TD C18-i01.07: Justiça económica e ambiente de negócios/INMLCF Responsável: INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL E CIÊNCIAS FORENSES, I.P.	8 M €	100%	59%
C18-i01.08	TD C18-i01.08: Justiça económica e ambiente de negócios/INPI Responsável: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	2 M €	100%	54%
C18-i01.09	TD C18-i01.09: Justiça económica e ambiente de negócios/CAAJ Responsável: COMISSÃO PARA O ACOMPANHAMENTO DOS AUXILIARES DA JUSTIÇA	1 M €	100%	91%
C18-i01.10	TD C18-i01.10: Justiça económica e ambiente de negócios/PGR Responsável: PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA	3 M €	100%	27%
C18-i01.11	TD C18-i01.11: Justiça económica e ambiente de negócios/CSM Responsável: CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA	2 M €	100%	28%
C18-i01.12	TD C18-i01.12: Justiça económica e ambiente de negócios/CSTAF Responsável: CONSELHO SUPERIOR DOS TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS E FISCAIS	0 M €	100%	46%
C18-i01.13	Justiça Económica e Ambiente de Negócios / MENAC Responsável: MECANISMO NACIONAL ANTICORRUPÇÃO (MENAC)	1 M €	100%	13%


5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C19
Administração Pública mais Eficiente

675 M €
Dotação orçamental

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 31.12.2024

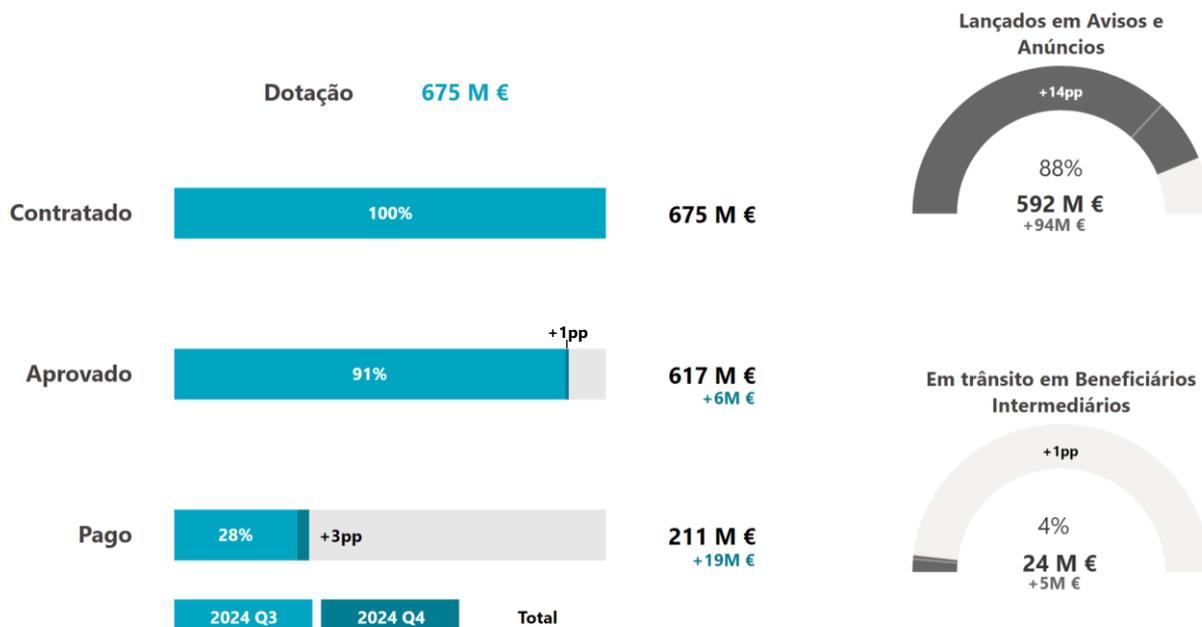

Reformas

CÓDIGO	REFORMA	ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO A 31.12.2024
C19-r34	Serviços públicos digitais, simples, inclusivos e seguros para os cidadãos e para as empresas	● Concretizada
C19-r35	Reforma funcional e orgânica da administração pública	● Concretizada
C19-r36	Administração pública capacitada para a criação de valor público	● Concretizada
C19-r41	Acesso aos serviços públicos: harmonizar e consolidar o acesso presencial e em linha	⦿ Em fase de implementação
C19-r42	Novo sistema de avaliação para capacitar e rejuvenescer o pessoal da administração pública	⦿ Em fase de implementação

5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C19 Administração Pública mais Eficiente

675 M €
Dotação orçamental

Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 31.12.2024	PAGO A 31.12.2024
C19-i01.01	Reformulação do atendimento dos serviços público e consulares Responsável: AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.	165 M €	92%	32%
C19-i01.02	Reformulação do atendimento dos serviços público e consulares/SGMNE Responsável: SECRETARIA GERAL DO MINISTERIO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS	51 M €	100%	48%
C19-i02.01	Serviços Eletrónicos sustentáveis, baseados na interoperabilidade e utilização dos dados para um aumento de transparência e eficiência Responsável: AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.	65 M €	95%	38%
C19-i02.02	Serviços Eletrónicos sustentáveis/INE Responsável: INSTITUTO NACIONAL DE ESTATISTICA	5 M €	100%	51%
C19-i03	Reforço do quadro geral de cibersegurança Responsável: GABINETE NACIONAL DE SEGURANÇA (GNS)	52 M €	100%	20%
C19-i04.01	Transição Digital na Rede Informática do Governo (RING)/CEGER Responsável: CENTRO DE GESTÃO DA REDE INFORMÁTICA DO GOVERNO - CEGER	13 M €	100%	62%
C19-i04.02	Infraestruturas críticas digitais eficientes, seguras e partilhadas/SGMAI Responsável: SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	62 M €	100%	54%
C19-i04.03	Infraestruturas críticas digitais eficientes, seguras e partilhadas Responsável: AGÊNCIA PARA A INTEGRAÇÃO, MIGRAÇÕES E ASILO, I.P.	4 M €	100%	13%
C19-i04.04	Infraestruturas críticas digitais eficientes, seguras e partilhadas Responsável: SECRETARIA GERAL DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS	4 M €	100%	98%
C19-i05.01-RAM	Transição Digital da Administração Pública da RAM- DRI Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM	77 M €	100%	14%
C19-i05.02-RAM	Transição Digital da Administração Pública da RAM-DRAPMA Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM	4 M €	100%	14%
C19-i06-RAA	Modernização e digitalização da Administração Pública- RAA Responsável: DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FUNDOS ESTRUTURAIIS	31 M €	100%	42%
C19-i07.01	Capacitação da Administração Pública - INA Responsável: INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, I.P. (INA, I.P.)	30 M €	98%	23%
C19-i07.02	C19 – i07.02 – Capacitação da Administração Pública – Entidade responsável pela implementação da reforma TD-r35 Responsável: SECRETARIA GERAL DA PRESIDENCIA DO CONSELHO DE MINISTROS	2 M €	100%	13%
C19-i07.03	Capacitação da Administração Pública - Formação Lojas do Cidadão/ Espaços Cidadão Responsável: AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.	1 M €	100%	41%
C19-i07.04	Capacitação da Administração Pública - PlanAPP Responsável: CENTRO DE COMPETÊNCIAS DE PLANEAMENTO, DE POLÍTICAS E DE PROSPETIVA DA ADMINISTRAÇÃO (PLANAPP)	12 M €	100%	27%
C19-i07.05	TD C19-i07.05 - Capacitação da Administração Pública - Programa de Estágios e Promoção do Teletrabalho Responsável: DIRECÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E DO EMPREGO PÚBLICO	38 M €	92%	34%
C19-i08	Territórios Inteligentes - AMA Responsável: AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P.	60 M €	37%	5%


5. Síntese da Implementação por Componente



COMPONENTE C20
Escola Digital

605 M €
Dotação orçamental

Síntese da Implementação Financeira da Componente a 31.12.2024

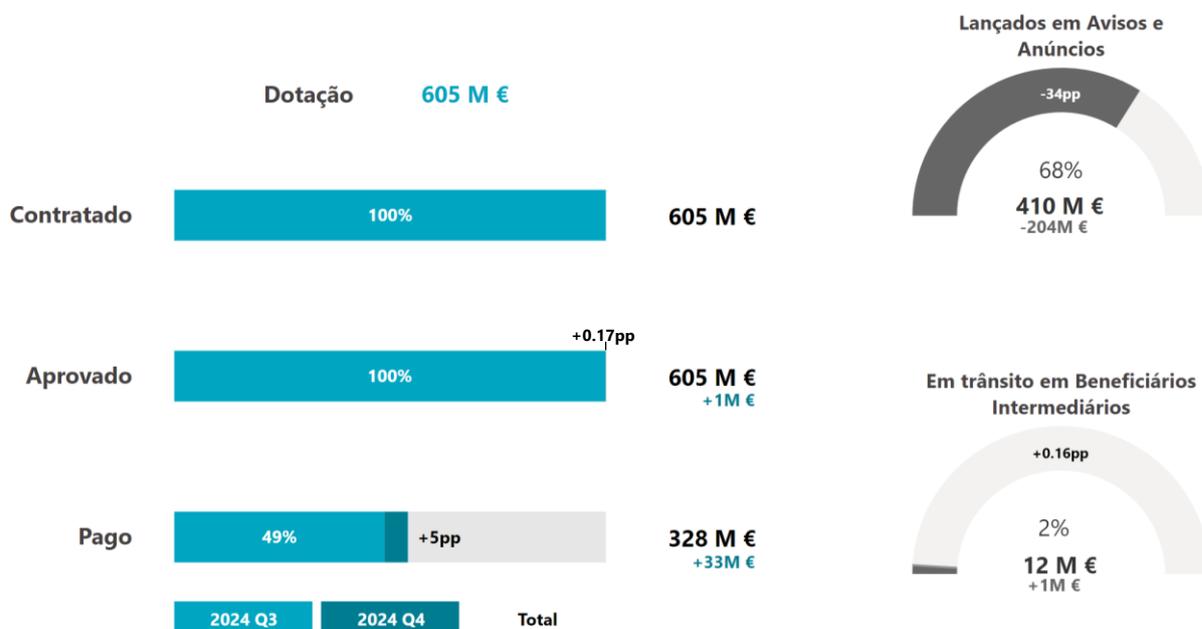

Reformas

CÓDIGO	REFORMA	ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO A 31.12.2024
C20-r37	Reforma para a educação digital	Em fase de implementação

Investimentos

CÓDIGO	SUBINVESTIMENTO	DOTAÇÃO	APROVADO A 31.12.2024	PAGO A 31.12.2024
C20-i01.01	Transição digital na Educação Responsável: SECRETARIA-GERAL DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA	312 M €	2%	1%
C20-i01.02	Transição digital na Educação Responsável: SECRETARIA-GERAL DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA	228 M €	100%	100%
C20-i01.03	Transição digital na Educação Responsável: DIRECÇÃO-GERAL DA EDUCAÇÃO		0%	0%
C20-i01.04	Transição digital na Educação Responsável: INSTITUTO DE AVALIAÇÃO EDUCATIVA, I.P.		0%	0%
C20-i01.05	Transição digital na Educação Responsável: INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA EDUCAÇÃO, I.P.		0%	0%
C20-i02-RAA	Educação digital (Açores) Responsável: DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FUNDOS ESTRUTURAIIS	43 M €	100%	49%
C20-i03-RAM	Programa de aceleração da digitalização da Educação na RAM Responsável: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL IP-RAM	22 M €	100%	30%



PRR
Plano de Recuperação
e Resiliência

Anexos

ANEXOS

ANEXO I

Listagem de Projetos Aprovados a Beneficiários Diretos

ANEXO I - Listagem de Projetos Aprovados a Beneficiários Diretos

A listagem dos projetos aprovados a 31 de dezembro de 2024 consta de documento autónomo.

ANEXOS

ANEXO II

Listagem de Projetos Aprovados a Beneficiários Finais

ANEXO II - Listagem de Projetos Aprovados a Beneficiários Finais

A listagem dos projetos aprovados a 31 de dezembro de 2024 consta de documento autónomo.

